VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA

REPORT RICOSTRUZIONE

SISMA UMBRIA 2016 – 2022

Si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla redazione del presente report

Report ricostruzione sisma Umbria 2016 – 2022

Vice Commissario
Presidente Regione

Avv.to Donatella Tesei

Direttore Regione Umbria
Direttore USR Umbria

Ing. Stefano Nodessi Proietti

USR - UMBRIA

Direttore - Ing. Stefano Nodessi Proietti

Dirigente Servizio Ricostruzione Privata - Ing. Gianluca Fagotti

Dirigente Servizio Ricostruzione Pubblica - Arch. Filippo Battoni

Responsabili Sezione

- ***Erogazione Contributi e Sismica***
  Ing. Federica Modesti
- ***Amministrativo Contabilità***
  Rag. Francesca Leboroni
- ***Gare e Contratti***
  Dott.ssa Silvia Sensi

Supporto giuridico-amministrativo e redazione

- Dott.ssa Rita Chiaverini

****

USR - UMBRIA

Via Romana Vecchia, snc – 06034 Foligno (Perugia)
Sede decentrata:
Viale della stazione, snc - 06046 Norcia (Perugia)

Telefono: +39 0742 630709
Email: usr@regione.umbria.it
PEC:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it
Sito internet: sismaumbria2016.it

INDICE

1. LA RICOSTRUZIONE IN UMBRIA

1.1. L'USR Umbria p. 10
1.2. Il personale p. 17
1.3. Il Comitato Istituzionale p. 20
1.4. Le Conferenze Regionali p. 21

2. LA RICOSTRUZIONE PRIVATA

2.1. Il Testo Unico - Gedisi p. 25
2.2. La ricostruzione privata in sintesi p. 28
2.3. Misure per immobili con danni lievi p. 31
2.4. Misure per immobili con danni gravi p. 36
2.5. I numeri complessivi della ricostruzione privata nel 2022 p.40
2.6. Attività istruttoria pratiche sismiche p. 45
2.7. Autorizzazioni miglioramento sismico e livelli operativi p. 46
2.8. Le attività produttive p. 47
2.9. Contributi per le attività produttive p. 50
2.10. Traslochi e depositi temporanei di mobili p. 58

3. CONTROLLI

3.1. Legalità e trasparenza p. 60
3.2. I controlli dell'USR Umbria p. 63

4. CENTRI URBANI E FRAZIONI

4.1. Perimetrazine dei centri e nuclei gravemente danneggiati p. 67
4.2. Programmi Straordinari di Ricostruzione p. 70
4.3. Microzonazioni sismiche p. 72

5. LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

5.1. La ricostruzione pubblica in sintesi p. 77
5.2. Stato di attuazione delle opere pubbliche p. 84
5.3. Monitoraggio delle opere pubbliche p. 87
5.4. Le ordinanze speciali p. 92
5.5. Donazioni solidali p. 110
5.6. PNRR – Fondo complementare aree sisma Centro Italia 2009-2016 p. 116
5.7. Le procedure di gara espleate dall'USR Umbria p. 121
5.8. Gestione delle macerie p. 124

6. LE RISORSE ECONOMICHE

6.1. La contabilità speciale N. 6040 **p. 129**

7. APPENDICE

7.1. Elenco ordinanze del commissario **p. 146**

7.2. Elenco ordinanze speciali per l'Umbria **p. 162**

Il **2022** si è chiuso con il raggiungimento di **traguardi importanti** nonostante il permanere di un difficile contesto congiunturale dovuto non solo agli effetti della pandemia da Covid 19, alla crisi economica, all'aumento delle materie prime, alle dinamiche del mercato dell'edilizia innescate dal 110% sulle ristrutturazioni ma anche alle ripercussioni dovute al perdurare del conflitto tra Ucraina e Russia.

Nell'ambito della **ricostruzione privata** il **primo traguardo**, atteso da tempo, è stato l'**approvazione,** con l'ordinanza commissariale n. 130/2022**,** del **testo unico della ricostruzione privata** che semplifica, aggiorna, chiarisce la complessa stratificazione normativa varata a partire dal 2016.

L'**altro traguardo** raggiunto, è che **l'attività dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria**, nonostante il permanere difficoltà oggettive, **ha consolidato i buoni risultati raggiunti nel passato**: i cantieri avviati sono stati 2546 e su 1317 di questi si sono già conclusi i lavori permettendo così alle famiglie di poter rientrare a casa e alle imprese di fare ritorno nei luoghi d lavoro.

Gli effetti della **semplificazione**, ottenuti soprattutto con l'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 100/2020, hanno portato ad accorciare notevolmente i tempi medi di approvazione dei progetti e delle richieste di contributo: **dalla presentazione alla concessione del decreto si è passati da una media di 583 giorni nel 2019 a 130 giorni nel 2022**.

Un risultato importante che dimostra il grande lavoro svolto dall'USR Umbria e anche **il netto incremento che si è registrato a partire dal 2020,** frutto della **grande attenzione che la Regione Umbria ha sempre avuto in tema di ricostruzione** e dell'efficacia della **semplificazione** e della fattiva **collaborazione** tra tutti gli attori coinvolti.

Se si fa il **confronto tra il report del 2019 e quello del 2022** vediamo che, a fronte di un raddoppio delle istanze presentate, **il valore di quelle accolte è addirittura triplicato** nonostante nel 2022, **con l'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 126/2022, si sia registrato un considerevole aggravio degli adempimenti** con conseguente **incremento del numero delle rideterminazioni dei contributi** e un rallentamento nell'evasione delle concessioni contributive**.**

Il 2022 segna anche un ulteriore **traguardo nella pianificazione** strategica con l'approvazione dei **Programmi Straordinari Ricostruzione** (P.S.R.) **di Cascia e di Preci**, strumenti che consentiranno di semplificare le procedure di ricostruzione indirizzando l'attenzione verso attività di adeguamento e miglioramento dei contesti urbanizzati, della viabilità, dei sottoservizi a rete e di fruibilità degli spazi pubblici.
Il 2022 si è caratterizzato, oltre che per i positivi risultati nella ricostruzione privata, anche per un **cambio di passo nella ricostruzione pubblica**.
Per raggiungere questo considerevole traguardo ed imprimere una accelerazione nella ricostruzione pubblica sono state emanate **ordinanze speciali** che riguardano, in particolare, i comuni di **Cascia**, **Norcia** e **Preci** ma anche interventi in **53 edifici scolastici di tutta la Regione Umbria**.
Da segnalare che per la frazione nursina di Castelluccio tutto procede secondo quanto previsto dall'ordinanza speciale n. 18/2021. Tutto il centro storico della frazione è stato demolito nell'autunno del 2022 dai Vigili del fuoco del comando di Perugia e l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria ha espletato le procedure di gara affidando i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie per la ricostruzione del **centro storico di Castelluccio**.
Come è noto **si sta sperimentando un importante intervento di ricostruzione integrata (pubblico e privato insieme) che prevede la realizzazione di grandi piastre di fondazione dotate di isolatori sismici** al di sopra dei quali ricostruire gli immobili privati e gli spazi pubblici, utilizzando in parte le pietre derivanti dalle demolizioni degli edifici preesistenti al fine di porre in essere un intervento di qualità anche dal punto di vista paesaggistico. Nel corso del 2022, inoltre, sono stati affidati anche i servizi di progettazione per il ripristino della viabilità di accesso al nucleo abitato sul versante Nord di Castelluccio.
Le procedure di **gara espletate dall'USR Umbria** hanno riguardato gli ospedali di Cascia e di Norcia che, hanno come **soggetto attuatore la Regione Umbria**.
Per ciò che concerne i lavori di ricostruzione dell'**ospedale di Cascia** saranno effettuati dalla ditta VI.AM. Infrastrutture srl che avrà a disposizione 550 giorni come da capitolato. Di fatto, però, i lavori sono già iniziati nell'estate del 2022 con la demolizione della struttura da parte dei Vigili del fuoco del Comando di Perugia.
Per l'**ospedale di Norcia**, invece, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Taddei Spa che inizierà ad operare nei primi mesi del 2023 e avrà a disposizione 450 giorni.
Risultati importanti si sono ottenuti anche con il **Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** destinato alle aree del sisma 2016 e

2009 che ha visto l'USR Umbria impegnato ad approvare, entro il 15 ottobre 2022, progetti per un importo di € 111.788.000 (misure A2, A3, A4) relativi alla Regione Umbria e ad individuare 54 interventi nei Comuni del cratere per un importo complessivo di € 70.001.214.

Altro significativo traguardo raggiunto nel 2022 è stato ottenuto con l'ordinanza commissariale n. 128/2022 che prevede l'approvazione del **programma stralcio degli interventi sugli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi**, Patrono d'Italia.

Questi risultati sono frutto di un notevole impegno, portato avanti anche sui tavoli istituzionali e spronano ad andare avanti con maggiore determinazione per accelerare ulteriormente i lavori della ricostruzione pubblica e privata, garantendo nuovo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto a beneficio di tutta la comunità regionale.

Il lavoro della ricostruzione non è finito. Il percorso da fare è ancora lungo ma la condivisione e la partecipazione consentiranno di proseguire questo complesso e articolato processo che vede l'USR Umbria lavorare insieme alla struttura del Commissario, agli enti locali, ai comitati, ai cittadini, ai tecnici, alle imprese per fare in fretta ma soprattutto per fare bene.

Il nostro impegno è volto a far sì che il 2023 costituisca un nuovo capitolo nel processo di ricostruzione e segni l'effettivo passaggio dall' 'era della carta all'era del mattone'.

Vice Commissario Presidente Regione Avv.to Donatella Tesei	Direttore Regione Umbria Direttore USR Umbria Ing. Stefano Nodessi Proietti

1. La ricostruzione in Umbria

1.1. L'USR Umbria

Un ruolo centrale nel processo di ricostruzione è svolto dagli **Uffici Speciali per la Ricostruzione** (USR) che costituiscono una innovazione amministrativa-gestionale introdotta dal decreto legge n. 189/2016.
Per la costituzione degli USR è stata stipulata una convenzione che disciplina proprio questo nuovo ed innovativo assetto organizzativo tra la Regione e gli Enti Locali. In Umbria la **sede** dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è ubicata **a Foligno**, in via Romana Vecchia snc presso il Centro regionale di Protezione civile e si articola in due servizi, uno deputato alla **ricostruzione privata** e l'altro alla **ricostruzione pubblica**. Dal gennaio 2018, al fine di assicurare il contatto con i territori maggiormente colpiti e per favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti nella ricostruzione secondo il criterio di prossimità, è attiva una **sede distaccata a Norcia**. Dal 1° settembre 2022 tale sede, sempre a Norcia, è stata trasferita in viale della Stazione presso l'AFOR (Agenzia Forestale Regionale) razionalizzando in questo modo le spese di gestione.
Hanno sottoscritto la convenzione per l'istituzione dell'USR – Umbria i comuni di Acquasparta, Alviano, Amelia, **Arrone**, Assisi, Avigliano Umbro, Baschi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Calvi dell'Umbria, Campello sul Clitunno, Cannara, **Cascia**, Castel Ritaldi, **Cerreto di Spoleto**, Collazzone, Costacciaro, Deruta, **Ferentillo**, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Giove, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Guardea, Gubbio, Lugnano in Teverina, Marsciano, Massa Martana, Monte Santa Maria Tiberina, Montecastello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montefalco, **Montefranco**, **Monteleone di Spoleto**, Montone, Narni, Nocera Umbra, **Norcia**, Otricoli, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, **Poggiodomo**, **Polino**, **Preci**, **Sant'Anatolia di Narco**, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, **Scheggino**, **Sellano**, Sigillo, Spello, **Spoleto**, Stroncone, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Valfabbrica, **Vallo di Nera**, Valtopina.[1]
In tale convenzione, all'articolo 2, comma 2, è stabilito che: «*La Regione Umbria assume la qualità di Ente responsabile della gestione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione*» mentre, all'articolo 6, sono specificate le «*regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale*» e, in particolare, al comma 3, è previsto che «*Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione,*

[1] Sono evidenziati i Comuni che rientrano nel cratere.

all'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento della Regione Umbria».
L'USR Umbria svolge pertanto le proprie funzioni su numerosi comuni umbri dislocati nel territorio delle due province con un conseguente **impatto socio-economico della propria attività estremamente rilevante** sia per quanto riguarda la ricostruzione privata, sia per quanto riguarda la ricostruzione pubblica.

Le **specificità istituzionali dell'USR Umbria presentano caratteristiche difficilmente comparabili con quelle di altre amministrazioni** in quanto si tratta di un **ufficio creato ad hoc** con il decreto legge n. 189/2016 al fine di gestire la ricostruzione successiva agli eventi sismici del 2016.
La creazione di un Ente dal "nulla" ha comportato la necessità di adeguarne struttura ed organizzazione alla normativa vigente in maniera immediata e senza la necessaria gradualità di interventi e competenze che si accumulano nel tempo nella normalità delle amministrazioni.
L'**USR Umbria è legato allo stato di emergenza e alla gestione dell'emergenza post sisma 2016** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante 'Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio

delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria'.
Con successivi provvedimenti lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020 (articolo 1, commi 988, lett. b) e 990, della legge di bilancio 2019). Successivamente, l'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd decreto agosto) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e la gestione straordinaria dell'emergenza mentre con l'articolo 1, comma 449 e 450 della legge di bilancio n. 234/2021 si è avuta una ulteriore proroga al 31 dicembre 2022. In ultimo lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 738 e 739 della legge n. 197/2022.
Il **modello organizzativo degli Uffici Speciali per la Ricostruzione vede personale proveniente da diverse esperienze e soprattutto con contratti e retribuzioni completamenti differenti**. In particolare l'USR-Umbria è costituito da personale comandato da altri enti, da personale a tempo determinato; da personale proveniente dalla Struttura del Commissario, da Invitalia o Fintecna.
Il nuovo assetto operativo dell'USR Umbria, determinato con l'ordinanza del Vice Commissario n. 12/2020 è stato rivisto con l'ordinanza del Vice Commissario n. 3/2022 che ha portato ad una parziale ridefinizione delle declaratorie dei servizi e dell'organigramma per adeguarlo all'ampliamento delle competenze che le ordinanze del commissario hanno attribuito all'USR Umbria.
In particolare, con questa riorganizzazione si è voluto:

- garantire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'USR Umbria in relazione ai progetti individuati dal PNRR – PNC Area Sisma e Ordinanze Speciali, senza pregiudicare il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- assicurare il corretto espletamento dei controlli a campione in virtù delle specifiche competenze e qualità di ufficio di riferimento sul territorio per le attività di ricostruzione;
- realizzare un assetto delle risorse umane maggiormente funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi legati alla ricostruzione pubblica e privata, maggiormente idoneo a valorizzarne le potenzialità;
- assicurare maggiore economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell'organizzazione anche al fine di favorire l'interazione con le altre Pubbliche Amministrazioni.

L'**organigramma** e la **nuova organizzazione dell'USR-Umbria**, operativa a partire dal 1° gennaio 2023, è la seguente:

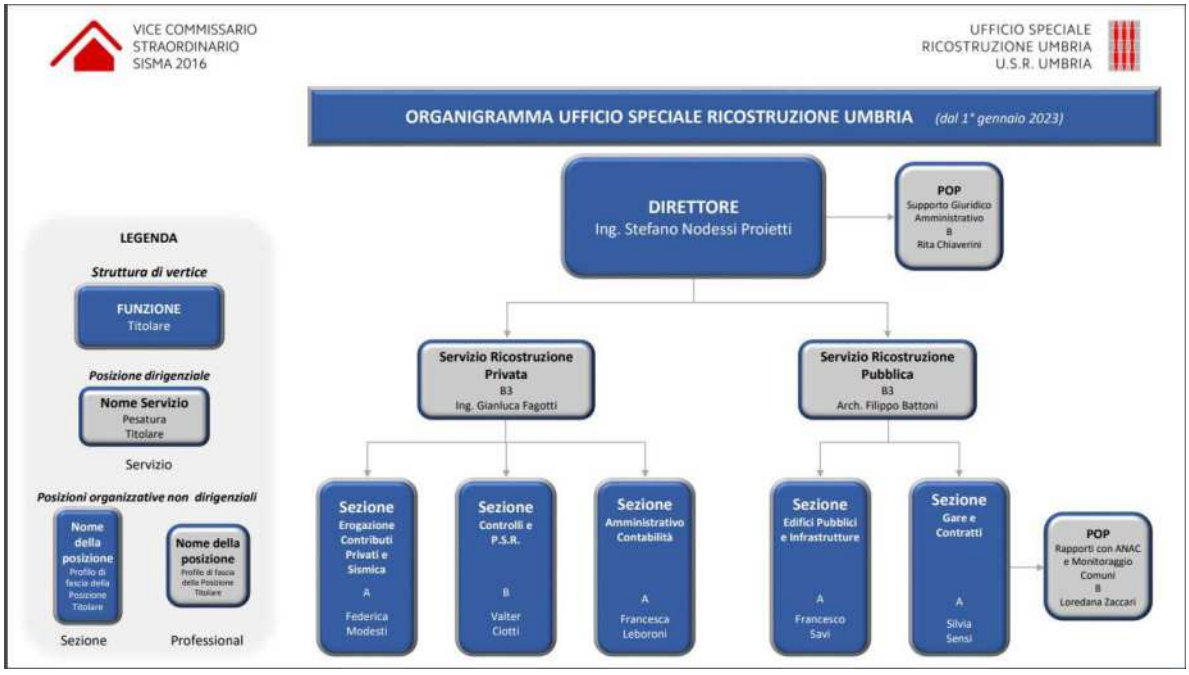

Dal 2018 è attivo il sito web dell'USR Umbria ***sismaumbria2016.it*** che svolge un servizio di comunicazione pubblica verso tutti i soggetti interessati e di assolvimento degli obblighi normativi sulla trasparenza amministrativa.
Nel corso del 2022, inoltre, diverse sono state le **iniziative organizzate dall'USR Umbria** nell'ambito della comunicazione istituzionale per informare i cittadini, i tecnici, le imprese e gli enti sulle principali novità normative, per monitorare le attività di ricostruzione sia pubblica che privata nonché per informare e rendere conto della propria attività e del proprio sforzo organizzativo.
Di seguito l'**elenco delle principali iniziative** di comunicazione e formazione istituzionale dell'USR Umbria:

28 gennaio 2022 – Incontro USR Umbria con le Casse Edili di Perugia e Terni presso la sede di Foligno per fare il punto sull'applicazione dell'ordinanza commissariale n. 78/2019 e per individuare possibili semplifiazioni nelle modalità di trasmissione dei dati per il controllo del DURC nella ricostruzione post-sisma 2016, sempre nel rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

31 gennaio 2022 – Predisposizione da parte del dirigente del Servizio Ricostruzione Privata di slide esplicative delle ordinanze commissariali n. 121/2021 e n. 123/2021 e del decreto attuativo n. 627/2021. Le slide sono state

pubblicate sul sito *sismaumbria2016.it*.

14 febbraio 2022 – Video conferenza stampa con il Vice Commissario – Presidente della Regione Umbria e il direttore dell'USR Umbria per la presentazione del Report 2021 sulla ricostruzione post sisma in Umbria.

13 maggio 2022 – Avvio della ricostruzione a Castelluccio con la consegna, alla presenza del Vice Commissiario Presidente della Regione Umbria avv.to Donatella Tesei, del primo decreto privato all'interno del piano attuativo. Con l'occasione è stato presentato alla popolazione il progetto per la ricostruzione della frazione nursina che verrà isolata sismicamente per metterla al riparo dal rischio di futuri terremoti.

24 agosto 2022 – Partecipazione a Norcia all'incontro promosso dal comune per il sesto anniversario del sisma sisma alla presenza del Commissario per la ricostruzione.

6 settembre 2022 – Seminario tenuto dall'USR Umbria presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Villa Umbria dal titolo '*Prezzario unico del cratere 2022 e contributo per la ricostruzione: le novità apportate dall'O.C. n. 126/2022 ai cantieri di ricostruzione privata*'.

11-15 settembre 2022 – Presentazione del progetto per la ricostruzione post sisma 2016 di Castelluccio di Norcia nel corso del XIX convegno ANIDIS "L'ingegneria sismica in Italia" e del XVII convegno ASSISi "Isolamento sismico, dissipazione energetica e controllo attivo delle vibrazioni delle strutture" che si è svolto a Torino, presso il Politecnico, una delle istituzioni pubbliche più prestigiose a livello italiano ed internazionale nella formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e servizi in tutti i settori dell'ingegneria e dell'architettura. Il progetto è stato illustrato dal direttore dell'USR Umbria ing. Nodessi e dal dirigente ing. Fagotti.

14 ottobre 2022 – Iniziativa per l'avvio della ricostruzione ad Ancarano di Norcia con la consegna del primo decreto di ricostruzione pesante all'interno del piano attuativo della frazione nursina.

19 ottobre 2022 – Predisposizione da parte del dirigente del Servizio Ricostruzione Privata di slide esplicative dell' ordinanza commissariale n. 126/2022. Le slide sono state pubblicate sul sito *sismaumbria2016.it*.

28 ottobre 2022 – Predisposizione da parte dei dirigenti del Servizio Ricostruzione Privata e del Servizio Ricostuzione Pubblica dell'USR Umbria di slide esplicative per rendere conto del lavoro svolto nel sesto anniversario del sisma del 30 ottobre 2016. Nelle slide viene sintetizzato lo stato di avanzamento della ricostruzione privata e della ricostruzione pubblica oltre allo stato di attuazione dei progetti del PNRR Fondo Complementare Aree Sisma Centro Italia 2009-2016 e

delle Ordinanze Speciali emanate dal Commissario proprio con l'intento di accelerare l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica. Le slide sono state pubblicate sul sito *sismaumbria2016.it*.

30 ottobre 2022 - Partecipazione a Norcia all'incontro promosso dal comune per il VI anniversario del sisma sisma alla presenza del Vice Commisario - Presidente della Regione Umbria.

12 dicembre 2022 - Convegno dibattito "Ricostruire in sicurezza il patrimonio storico culturale" organizzato dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR Umbria), con il patrocinio del Comune di Foligno e la collaborazione della Rete delle Professioni Tecniche alla presenza, tra gli altri, del Vice Commissario per la Ricostruzione - Presidente della Regione Umbria avv.to Donatella Tesei. L'iniziativa si è svolta presso l'auditorium san Domenico di Foligno.

20 Dicembre 2022 - Presentazione del Testo Unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza del commissario n. 130 del 15 dicembre 2022. L'iniziativa si è svolta a Norcia, presso il Digipass, con la possibilità di collegarsi in streaming.

21 dicembre 2022 - Visita della delegazione del Governo della Croazia a Norcia, accompagnata dai funzionari del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, nell'ambito del progetto europeo 'Taiex'. La Croazia, infatti, ha ottenuto contributi a valere sul Fondo di Solidarietà UE in seguito agli eventi sismici che l'hanno colpita tra marzo e dicembre del 2020: l'incontro è servito per confrontare le diverse esperienze legate all'emergenza e alla ricostruzione successiva agli eventi sismici.

31 dicembre 2022 - Predisposizione da parte del dirigente del Servizio Ricostruzione Privata di slide esplicative dell' ordinanza commissariale n. 131/2022. Le slide sono state pubblicate sul sito *sismaumbria2016.it*.

1.2. Il personale

Il Commissario Straordinario, con le ordinanze n. 6/2016 e n. 22/2017, ha emanato le linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Con l'ordinanza del Vice Commissario n. 1 del 18 gennaio 2022 è stata approvata la **nuova pianta organica dell'USR Umbria per complessive 101 unità di personale**, resa necessaria per adempiere alle nuove funzioni che le varie ordinanze commissariali hanno attribuito agli Uffici Speciali.
Sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 1266 del 16 dicembre 2021 'Fabbisogni copertura organico USR Umbria – Determinazioni', l'Ufficio Speciale ha espletato una procedura per coprire i posti vacanti in pianta organica attraverso il comando di personale proveniente da altri enti locali della Regione Umbria che si è e conclusa nel mese di marzo 2022 con la pubblicazione delle graduatorie finali.
Pertanto, **alla data del 31 dicembre 2022, l'USR Umbria presenta la seguente dotazione organica** che, rispetto alla pianta organica in vigore, è carente di 14 unità di personale a causa di pensionamenti, turnover, cessazioni volontarie e nonostante il tentativo fatto di acquisire in comando nuovo personale proveniente dagli enti locali:

PERSONALE ASSEGNATO ALL'USR UMBRIA	NUMERO UNITÀ	NOTE
Personale distaccato dalla Regione Umbria e comandato da Enti locali	26	12 comandati dalla Regione (tra cui 2 dirigenti a T.D.) e 14 comandati da enti locali
Personale Presidenza Consiglio dei Ministri	7	
Personale da Invitalia	15	
Personale da Fintecna	16	
Personale a tempo determinato art. 50 bis 1 ter	23	
TOTALE	**87**	

Fonte: USR Umbria

Per quanto riguarda invece i Comuni e le Province del cratere, alla data del 31 dicembre 2022, presentano complessivamente la seguente dotazione organica:

PERSONALE ASSUNTO DA COMUNI E PROVINCE	NUMERO UNITÀ	NOTE
Personale assegnato a Comuni e Province	100	Numero unità indicativo, rapportato alle risorse assegnate

Con l'ordinanza del Vice Commissario n. 4 del 21 dicembre 2022, la ripartizione delle risorse destinate ai Comuni e Province è la seguente:

ENTE	IMPORTO ART.50-BIS 2022 IN €	IMPORTO INTEGRAZIONE DECRETO 376/2022 E DECRETO 493/2022 IN €	IMPORTO TOTALE ANNO 2022 IN €
Comune di Arrone	-	36.176,00	36.176,00
Comune di Cascia	333.333,33	144.704,00	478.037,33
Comune di Cerreto di Spoleto	33.333,33	72.352,00	105.685,33
Comune di Ferentillo	66.666,67	72.352,00	139.018,67
Comune di Montefranco	33.333,33	36.176,00	69.509,33
Comune di Monteleone di Spoleto	33.333,33	36.176,00	69.509,33
Comune di Norcia	500.000,00	289.408,00	789.408,00
Comune di Poggiodomo	-	36.176,00	36.176,00
Comune di Polino	-	36.176,00	36.176,00
Comune di Preci	266.666,67	108.528,00	375.194,67
Comune di Sant'Anatolia di Narco	-	36.176,00	36.176,00
Comune di Scheggino	-	36.176,00	36.176,00
Comune di Sellano	33.333,33	72.352,00	105.685,33
Comune di Spoleto	300.000,00	108.528,00	408.528,00
Comune di Vallo di Nera	-	72.352,00	72.352,00
Provincia di Perugia	233.333,33	72.352,00	305.685,33
Provincia di Terni	-	36.176,00	36.176,00
USR Umbria	-	72.352,00	72.352,00
Fondo di riserva	66.666,68	20.672,00	87.338,68
TOTALE	**1.900.000,00**	**1.395.360,00**	**3.295.360,00**

Fonte: USR Umbria - OVC n. 4/2022

In particolare, € 1.900.000,00 rappresentano l'assegnazione totale ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1, per l'annualità 2022 ed € 1.395.360,00 l'assegnazione delle risorse aggiuntive di cui ai decreti commissariali n. 376/2022 e n. 493/2022 (PNC).
Per la **gestione della ricostruzione** ci si avvale, pertanto, di una **organizzazione complessa** in quanto, come detto, il personale dell'USR-Umbria è composto da

soggetti con diverse provenienze, **contratti** e **compensi** (personale comandato dagli enti locali, selezionato in mobilità dal Commissario Straordinario; a tempo determinato ai sensi dell'ordinanza n.96/2020, con contratti con Fintecna ed Invitalia). Ovviamente queste disparità di trattamento economico non aiutano una gestione della ricostruzione già di per sé complessa e sottoposta a frequenti turnover.

In ogni caso **il personale dell'USR-Umbria costituisce ormai una risorsa strategica nel processo di ricostruzione** non solo per la professionalità acquisita ma anche per il senso di responsabilità che ne contraddistingue l'impegno quotidiano tant'è che il personale sia tecnico che amministrativo, si è sempre messo a disposizione per informare, supportare ed accompagnare il lavoro dei tecnici pubblici e privati sulle questioni più complesse e sulle novità introdotte dalle varie ordinanze commissariali, dalle ordinanze speciali, dalle ordinanze legate al PNRR e, da ultimo, dal testo unico della ricostruzione privata approvato con l'ordinanza commissariale n. 130/2022, entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

L'**incertezza lavorativa dei 23 precari dell'USR Umbria è uno dei problemi su cui la Regione Umbria ha posto la propria attenzione** al fine di non disperdere figure professionali specializzate che hanno maturato grande esperienza e costituirebbero senza alcun dubbio un accrescimento dell'ente regionale. La strada che si sta tendando di perseguire è quella segnata dal decreto legge n.104/2020 che offre alle amministrazioni richiedenti la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale attualmente a tempo determinato in forza presso gli Uffici speciali per la ricostruzione. Tale normativa, infatti, non prevede alcun aggravio di spese sul bilancio regionale in quanto le risorse necessarie rimarrebbero a carico del fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Insomma, uno sforzo enorme, quello dell'USR-Umbria, per dare riscontro alle tempistiche dettate dalle nuove ordinanze e alle attese di committenti, professionisti ed imprese: è difficile trovare nella pubblica amministrazione personale con un così alto **spirito di appartenenza**, disposto ad assumere ritmi e **carichi di lavoro altissimi** ma **orgoglioso di impegnarsi per dare risposte** più immediate possibili nell'interesse delle **famiglie terremotate** e dei **territori colpiti dagli eventi sismici del 2016**.

Nel corso del 2022, come detto, non è stato possibile colmare la carenza di organico dell'USR-Umbria con le procedure messe in atto, su proposta del direttore dell'USR-Umbria, con deliberazione della giunta regionale n. 1266 del 16/12/2021. La procedura non ha dato i risultati sperati e l'organico dell'USR Umbria risulta carente di diverse figure professionali

In ogni caso, i dati legati alla ricostruzione che si evincono dal presente report, dimostrano **il grande lavoro fatto dall'USR Umbria nel corso del 2022 nonostante la carenza di organico**.

1.3. Il Comitato istituzionale

In ogni Regione colpita dagli eventi sismici del 2016 è operativo un Comitato Istituzionale all'interno del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche di competenza dei Presidenti delle Regioni.

Il Comitato, pertanto, è **presieduto dal Vice Commissario - Presidente della Regione Umbria** ed è formato dai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni nonchè dai sindaci dei comuni del cratere. Prendono parte al comitato istituzionale anche il direttore e i due dirigenti dell'USR-Umbria.

Nel corso del 2022 il Vice Commissario – Presidente della Regione Umbria ha convocato i seguenti comitati istituzionali per esaminare specifici aspetti della ricostruzione post-sisma 2016:

- **26 maggio 2022:** si è fatto il punto sullo stato di attuazione della **ricostruzione privata** e sono state illustrate le principali novità introdotte dall'ordinanza commissariale n. 126/2022. Si è parlato anche dello stato di attuazione della **ricostruzione pubblica**, delle **ordinanze speciali** e degli interventi del **Fondo complementare PNRR** aree sisma 2009 e 2016 nonché di questioni legate al personale previsto dall'art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016.
- **31 maggio 2022:** alla presenza dell'assesore regionale Enrico Melasecche Germini e del sub commissario Fulvio Soccodato, è stato approfondito l'intervento previsto dal PNRR – Fondo complementare aree sisma centro Italia 2016 – Misura A4, sulla rete stradale S.S. 685 'Tre Valli Umbre' km 41+500 e km 51+500.
- **31 agosto 2022:** è stato monitorato lo stato di attuazione della ricostruzione privata e della ricostruzione pubblica post sisma 2016; l'esito del censimento danni effettuato dal SOSE e le percentuali di riparto dei finanziamenti per i nuovi piani delle opere pubbliche e rigenerazione urbana. Si sono definiti gli interventi del fondo complementare PNRR aree sisma 2009 e 2016 con particolare riferimento ai lavori di adeguamento del S.S. n. 685 'Tre Valli Umbre' nonché dell'attribuzione delle risorse legate al personale ai sensi del decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 376 del 3 agosto 2022.
- **5 ottobre 2022:** il comitato, aperto anche ai sindaci dei comuni fuori cratere di Acquasparta, Alviano, Assisi, Attigliano, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Collazzone, Deruta, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lugnano in Teverina, Marsciano, Montecastrilli, Montecchio, Montefalco, Montone, Nocera Umbra, Orvieto, Otricoli, Paciano, Penna in Teverina, Perugia, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Terni, Todi e Valfabbrica, ha approvato la proposta del nuovo programma degli interventi di ricostruzione pubblica. Per i soli comuni del cratere è stato poi approvato anche il programma unitario di rigenerazione urbana per le aree del terremoto 2009 e 2016.

1.4. Le Conferenze regionali

Nella Conferenza regionale, prevista dall'Ordinanza commissariale n. 16/2017, ciascun ente o amministrazione convocata alla riunione (ad esempio, Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP dell'Umbria, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, USR Umbria, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Comuni interessati….) è stato rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. In questo modo, attraverso la Conferenza regionale, è stata garantita l'unitarietà e l'omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione post sisma 2016. A partire dal 1° gennaio 2023 le Conferenze regionali sono disciplinate dagli articoli 85, 86, 87 e 88 del Testo Unico approvato con ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022.

Nel corso del 2022 l'attività della Conferenza regionale **è stata costante ed intensa** con una o più riunioni con cadenza settimanale e in modalità telematica. Delle **194 richieste di indizione e convocazione** della Conferenza regionale ne risultano **concluse 100** in prima o seconda seduta mentre 25, alla data del 31 dicembre 2022, risultano in corso. Risultano rinviate alla prima data utile 44 richieste di indizione e convocazione mentre 10 sono sospese per richiesta di integrazioni documentali. Oltre a ciò, 13 richieste di indizione e convocazione della Conferenza regionale, essendo pervenute alla fine del 2022, sono state calendarizzate in prima seduta nei mesi di gennaio e febbraio del 2023. Nei grafici che seguono l'andamento delle Conferenze regionali dell'USR Umbria nel corso del 2022:

ANNO	Conferenze Regionali indette*
2020	56
2021	235
2022	194
2023**	13
Totale complessivo	498

**trattasi del numero di Conferenze regionali complessivamente indette in prima convocazione, quindi includono quelle sospese e rinviate e quelle concluse in seconda seduta*

***Richieste di Conferenza regionale pervenute nel 2022 ma calendarizzate in prima seduta nel 2023*

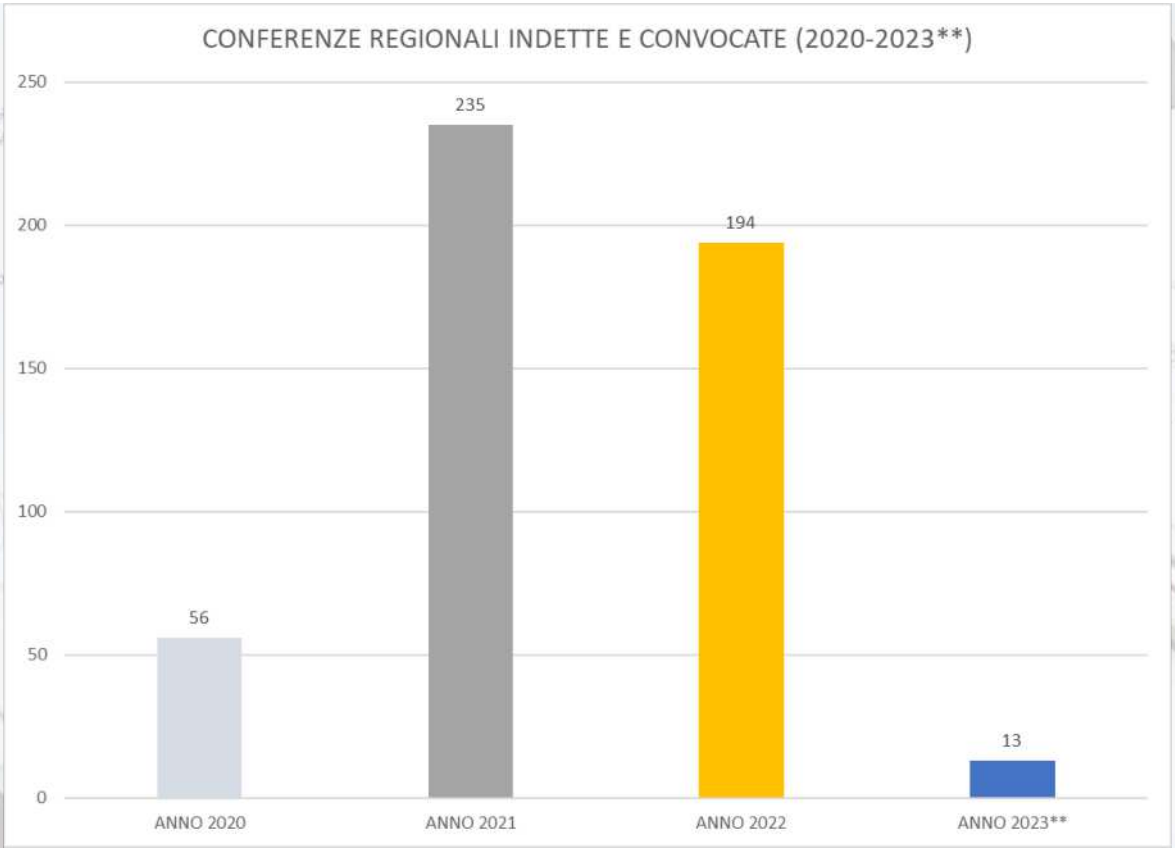

Nel grafico successivo vengono rappresentate le Conferenze regionali indette dal 2020 al 2022 per ogni singolo comune. Le conferenze regionali del 2023 si riferiscono a quelle pervenute nel 2022 ma calendarizzate in prima seduta nel 2022. Da evidenziare che lo strumento delle Conferenze regionali è stato utilizzato in modo particolare a partire dalla seconda metà del 2020, dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 100/2020, al fine di semplificare ed accelerare l'iter istruttorio delle pratiche.

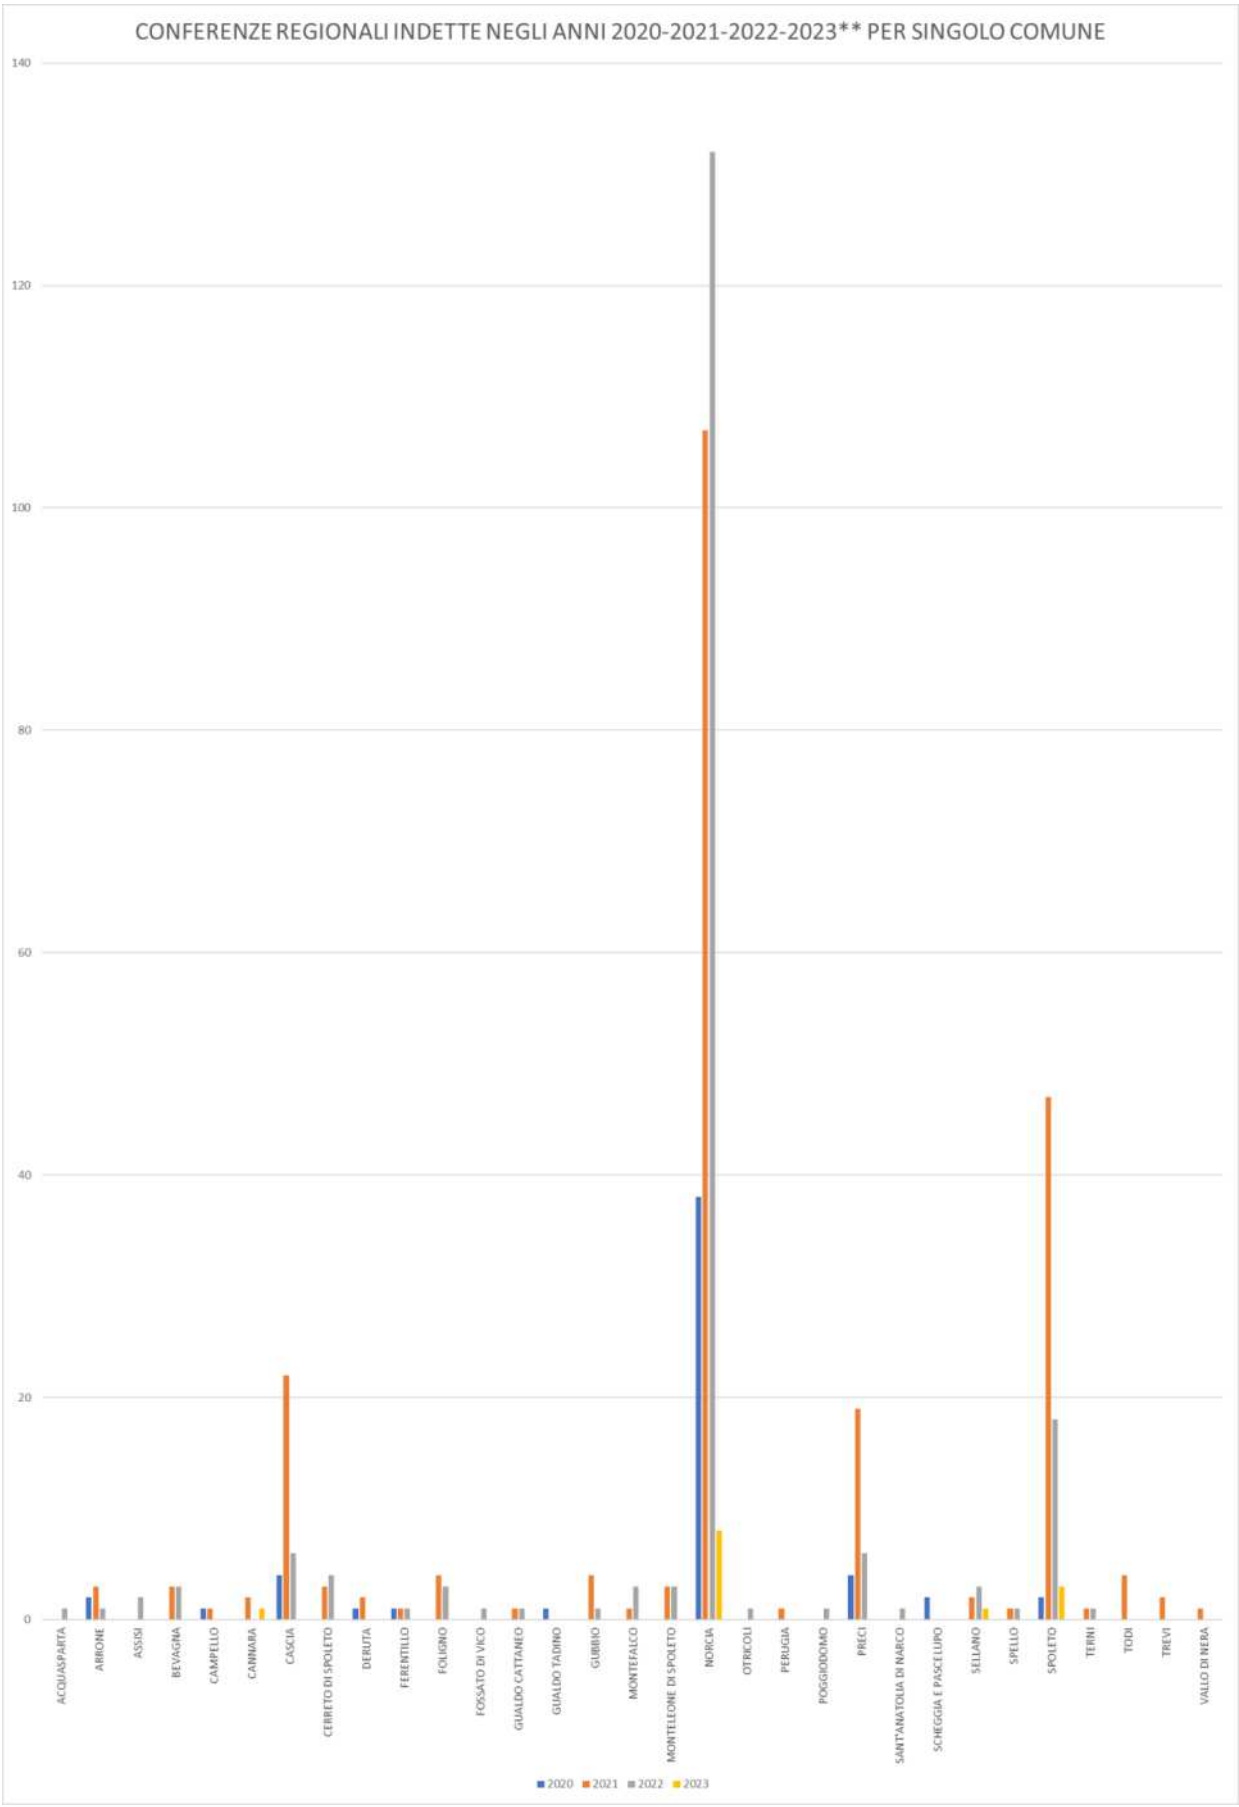
CONFERENZE REGIONALI INDETTE NEGLI ANNI 2020-2021-2022-2023** PER SINGOLO COMUNE
140
120
100
80
60
40
20
0
ACQUASPARTA
ARRONE
ASSISI
BEVAGNA
CAMPELLO
CANNARA
CASCIA
CERRETO DI SPOLETO
DERUTA
FERENTILLO
FOLIGNO
FOSSATO DI VICO
GUALDO CATTANEO
GUALDO TADINO
GUBBIO
MONTEFALCO
MONTELEONE DI SPOLETO
NORCIA
OTRICOLI
PERUGIA
POGGIODOMO
PRECI
SANT'ANATOLIA DI NARCO
SCHEGGIA E PASCELUPO
SELLANO
SPELLO
SPOLETO
TERNI
TODI
TREVI
VALLO DI NERA
2020
2021
2022
2023

2. La ricostruzione privata

2.1. Il Testo Unico

Con l'**ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022** si è raggiunto un traguardo importante atteso da tempo: l'**approvazione del Testo Unico della ricostruzione privata**, frutto di un complesso lavoro di squadra che la Struttura commissariale ha attuato con il pieno coinvolgimento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR) del cratere sisma 2016 e, in particolare dell'**USR Umbria** che ha svolto un lavoro minuzioso non solo per chiarire e semplificare ma anche per aggiornare la stratificazione normativa presente nell'ambito della ricostruzione privata.

Il testo unico, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2023. È la prima volta che in una ricostruzione post sisma viene varato un Testo Unico della normativa, che rimarrà "unico" anche in futuro, con l'integrazione diretta nel testo di eventuali successive modifiche.

Il Testo raccoglie in **130 articoli e 15 allegati** oltre 550 disposizioni (con 65 allegati) che sono state adottate a partire dal 2016, superando un quadro di regole stratificato, a volte sovrapposte, di difficile comprensione.

Al di là della **semplificazione e del riordino delle norme**, il Testo apporta **innovazioni anche sostanziali**, che danno alla ricostruzione dopo il terremoto in Centro Italia una configurazione più semplice, attenta alle caratteristiche del territorio e alle esigenze dei cittadini.

Vengono introdotte nuove norme, in

Gedisi

Dal 16 gennaio 2023 è operativa la nuova piattaforma denominata Gedisi (Gestione Digitale Sisma Centro Italia 2016) che sostituisce il "Modello Unico Digitale dell'Edilizia" (MUDE). sinora utilizzato per le pratiche di ricostruzione private.

Gedisi raccoglie e razionalizza, secondo i principi di celerità, efficacia ed efficienza, tutte le componenti di carattere informatico a supporto dell'attività della Struttura del Commissario, degli Uffici Speciali Ricostruzione e di ogni altro soggetto, istituzionale o privato, coinvolto nel processo di ricostruzione post-sisma, al fine della gestione delle pratiche di ricostruzione e di un efficiente monitoraggio dell'intero processo.

Con **Gedisi** tutti i dati relativi alla ricostruzione privata potranno essere ricavati in tempo reale.

particolare, per favorire il completamento della ricostruzione, ampliando ad esempio le tipologie di edifici ammessi al contributo o consentendo ai comuni di subentrare, in taluni casi, ai proprietari privati. E si delineano per la prima volta i principi che orientano la ricostruzione, cioè speditezza e semplificazione amministrativa, legalità, imparzialità, trasparenza, partecipazione nonchè le sue finalità: sicurezza degli edifici e del territorio, sostenibilità ambientale, efficienza energetica, qualità architettonica, tutela e valorizzazione del patrimonio, lo sviluppo sostenibile.
Vengono poi introdotte alcune norme per favorire il completamento della ricostruzione, ampliando gli strumenti a disposizione dei cittadini e consentendo ai Comuni di subentrare, in taluni casi, ai proprietari privati inerti.
Nel testo unico non sono ricomprese le ordinanze relative alla ricostruzione di opere pubbliche nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto in passato e di recente di una sistemazione e aggiornamento coerente con le norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità.
L'**USR Umbria**, subito dopo l'approvazione del Testo Unico, **ha avviato** una serie di **iniziative** – che proseguiranno anche nel 2023 – **per favorire la conoscenza e la diffusione del Testo Unico** e della **nuova piattaforma telematica Gedisi** per la gestione delle richieste di contributo sisma da parte dei professionisti.

VALLE
TEZZE

2.2. La ricostruzione privata in sintesi

L'incessante attività dell'USR Umbria, nell'ambito della **ricostruzione privata**, ha permesso di **consolidare i risultati positivi avviati nel passato**, nonostante l'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 126/2022 abbia reso necessario una revisione.

I numeri testimoniano il grande lavoro svolto e anche **il netto incremento che si è registrato a partire dal 2020,** frutto della **grande attenzione che la Regione Umbria ha sempre rivolto alla ricostruzione e dell'efficacia della semplificazione e della fattiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti**.

In Umbria alla data del 31 dicembre 2022, **a fronte di un totale di 4.411 istanze presentate all'USR Umbria, delle quali 3.980 complete, ben 2631 risultano concesse** e 690 sono in istruttoria.

È importante precisare che delle 4.411 istanze, **431 non sono istruibili in quanto presentate in forma semplificata**, secondo quanto previsto dalle ordinanze commissariali n. 128 del 2022 e n. 131 del 2022, con la possibilità di integrazione e perfezionamento da concludere entro il 15 marzo 2023.

È d'obbligo, inoltre, rammentare che nei dati sopra forniti, **661 istanze di danno lieve sono di competenza dei comuni di Spoleto, Cascia e Norcia**, in forza delle disposizioni dell'ordinanza commissariale n. 99/2020.

Per monitorare lo stato di attuazione della ricostruzione umbra post sisma è necessario analizzare **il dato delle istanze concesse in confronto con quello delle istanze respinte,** in quanto è significativamente **maggiore il valore della concessione contributiva: ad ogni concessione contributiva corrisponde un cantiere di ricostruzione.**

Di contro, il dato delle **659 istanze respinte**, se da un lato rappresenta comunque **parte dell'attività istruttoria dell'USR Umbria**, certamente non può ritenersi un dato positivo ai fini della ripresa sociale ed economica dei territori colpiti dagli eventi sismici.

In Umbria, inoltre, **sono stati avviati 2.546 cantieri** di cui **1.317 sono stati conclusi** positivamente con l'emissione dell'atto di erogazione del saldo, permettendo così alle famiglie di poter tornare nelle proprie case e alle attività produttive del territorio nei propri luoghi di lavoro.

Quanto agli **importi richiesti con le istanze di contributo**, in Umbria, al 31 dicembre 2022, sono pari ad **€ 1.278.720.275,65** di cui **€ 655.866.448 concessi** e **€ 296.704.022** liquidati.

Si ritiene significativo porre a **confronto** i **risultati dell'USR Umbria con l'attività degli altri Uffici Speciali**:

RICOSTRUZIONE PRIVATA – DANNI COMPLESSIVI

REGIONI	RICHIESTE CONTRIBUTI RICOSTRUZIONE				IMPORTI			CANTIERI	
	Totale presentate	Concesse	Respinte	In lavorazione	Importo richiesto	Importo concesso	Importo liquidato	Totale Cantieri	di cui conclusi
Abruzzo	4.891	2.021	1.059	1.811	1.044.478.780,69	381.805.108,24.	151.944.733.50	2.021	1.034
Lazio	2.942	1.614	591	737	898.894.795,08	639.818.574	262.534.142.65	1.614	738
Marche	15.679	9.470	845	5.364	6.802.823.356,36	3.62203.397	1.785.923.462,94	9.470	5.229
Umbria	4.411	2.631	659	1.121	1.278.720.275,65	655.866.448	296.704.022,04	2.546	1.317
TOTALE	27.923	15.736	3.154	9.033	10.024.917.207,78	5.301.693.527	2.497.106.361,13	15.651	8.318

FONTE: Struttura Commissario Ricostruzione 31 dicembre 2022

Dai dati della Struttura commissariale, risulta che l'**USR Umbria** parimenti all'**USR Lazio** ha evaso il **75%** delle istanze presentate, mentre l'**USR Marche** ne ha evase il **66%** e l'**USR Abruzzo** il **63%**. Non è peregrino osservare che sui dati attuali influisce inevitabilmente l'attività prolifica iniziata a partire dal 2020, grazie ad un rinnovato impulso e all'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio 2020, che ha semplificato le procedure e attribuito ai professionisti il compito di certificare i progetti e la conformità degli interventi, riducendo drasticamente i tempi necessari per l'ottenimento del contributo di ricostruzione. Emerge, infatti, chiaramente dal confronto tra il report del 2019 e quello del 2022 che, a fronte di un **raddoppio delle istanze presentate**, **il numero di quelle accolte è addirittura triplicato**.

Nel dettaglio si osserva inoltre che delle **4.411** istanze presentate in Umbria, in considerazione del fatto che 661 sono di competenza dei comuni di Spoleto, Cascia e Norcia, ne risultano in capo all'USR **3.750**; di queste 2.332 sono concluse positivamente con la concessione contributiva, 477 sono rigettate, improcedibili o archiviate su istanza di parte e 431 non sono istruibili in quanto presentate in forma semplificata. Pertanto lo stato di attuazione della ricostruzione privata che strettamente compete all'USR è soddisfacentemente rappresentata da una percentuale pari all'85%.

Sul piano della semplificazione delle procedure, dopo il **Programma Straordinario Ricostruzione** (P.S.R.) di Norcia approvato nel 2021, nel mese di dicembre 2022, con decreti del Vice Commissario – Presidente della Regione Umbria sono stati approvati i **P.S.R. di Cascia e di Preci,** che costituiscono

strumenti di pianificazione strategica con forte incidenza sulle scelte di progettazione del territorio.

I P.S.R., infatti, sono rivolti all'adeguamento e al miglioramento dei contesti urbanizzati, della viabilità, dei sottoservizi a rete e della fruibilità degli spazi pubblici e, inoltre, consentiranno la migliore programmazione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico congiuntamente agli interventi per la ricostruzione degli edifici privati.

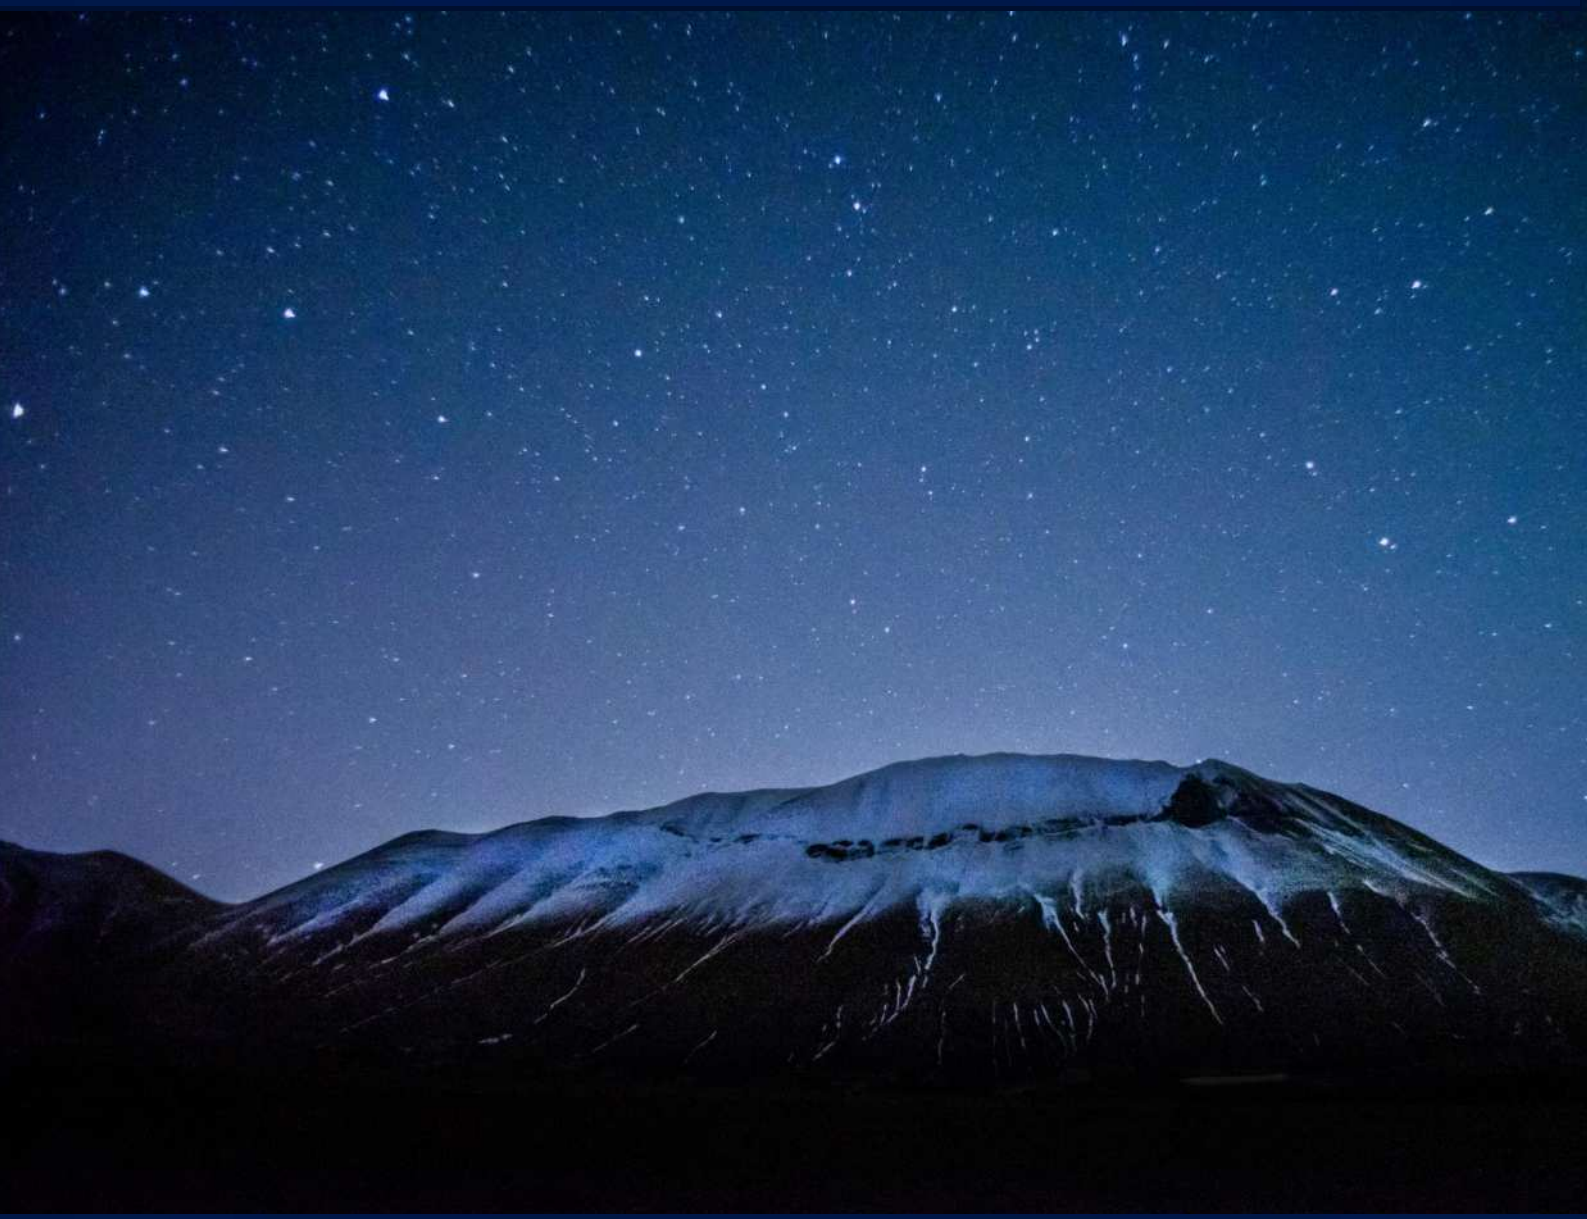

2.3. Misure per immobili con danni lievi

Il decreto legge n. 189/2016 e le ordinanze del commissario straordinario n. 4/2016 e n. 8/2016 regolano l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione di edifici abitativi e/o produttivi con **danni lievi** e dichiarati inagibili (esito "B" o "C" della scheda AeDES). **Il termine per la presentazione delle istanze di contributo** per i danni lievi, più volte prorogato, **è scaduto il 30 novembre 2020**.

Tuttavia, con l'ordinanza commissariale n. 121/2021, come successivamente modificata dalle ordinanze n. 123/2022, n. 126/2022, n. 128/2022 e n. 131/2022, per le domande di danni lievi presentate entro i termini previsti, ma successivamente rigettate o archiviate, è prevista un'ulteriore possibilità di **integrazione dell'istanza originaria** entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento di cui sopra.

Scaduti i termini restano ammissibili a finanziamento solo:

a. gli interventi su edifici compresi all'interno di un aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario;

b. gli interventi su edifici situati in zone direttamente interessate, o potenzialmente coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta che ne impediscono l'immediata esecuzione, qualora in tali aree non siano già finanziati e approvati interventi di mitigazione del rischio;

c. gli interventi su edifici ricadenti nelle cosiddette "zone rosse" istituite mediante apposita ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibilità con rischio esterno, qualora non rimossi;

d. gli interventi di riparazione di danni lievi degli edifici situati in aree ad oggi perimetrate ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle quali nel periodo precedente all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza 15 settembre 2020, n. 107, non era attuabile la facoltà di procedere all'intervento di ricostruzione o riparazione dell'edificio.

Dall'inizio della ricostruzione al 31 dicembre 2022, **sono pervenute all'USR Umbria 2.904 istanze di contributo per i danni lievi**, di cui **661 sono in carico ai comuni di Cascia, Norcia e Spoleto** che, secondo le previsioni dell'Ordinanza commissariale n. 99/2020, a partire dalla fine di ottobre del 2020 gestiscono l'istruttoria dei danni lievi. Delle predette 2.904 istanze, **1.988 sono state accolte** e ad esse ha fatto seguito il decreto di concessione contributiva, mentre **532 sono state respinte** o archiviate su istanza di parte, con una **percentuale di evasione pari a circa il 87% del totale**.

Nei grafici che seguono viene sintetizzata l'attività svolta nel 2022 per quanto concerne i danni lievi:

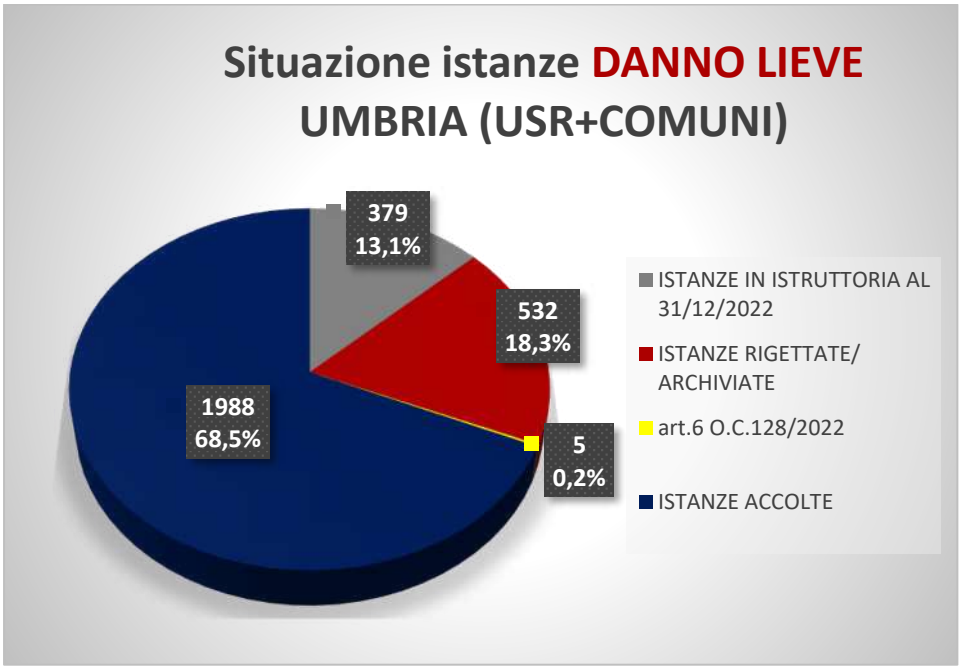

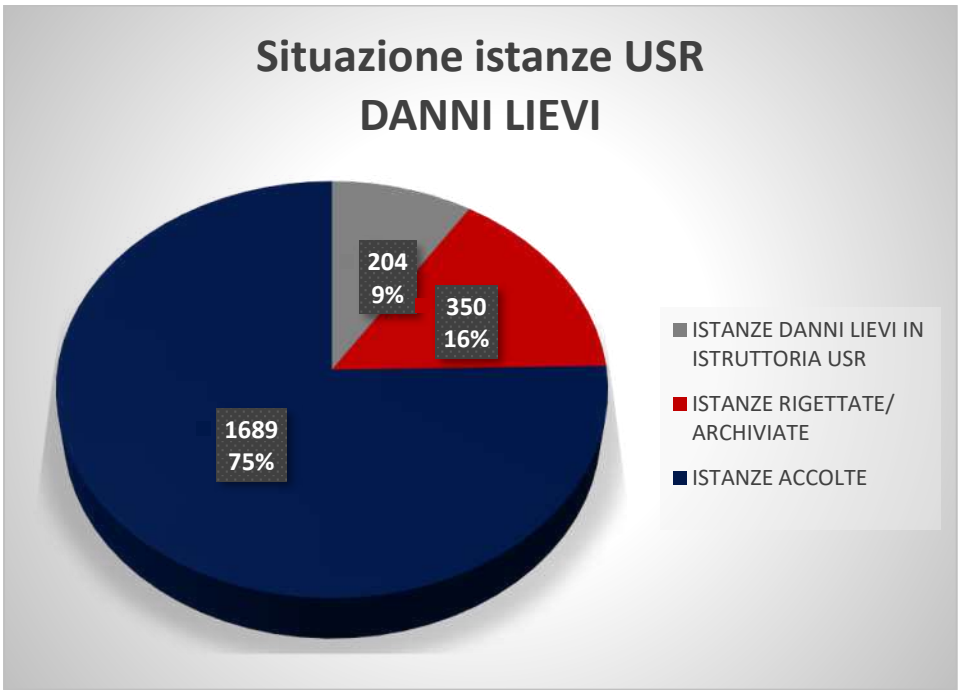

Nelle tabelle che seguono viene riportata la **situazione dettagliata nei comuni del cratere e fuori cratere**:

RIEPILOGO DANNI LIEVI

DOMANDE									
Comuni	Presentate	Accolte	Respinte	In lavorazione	di cui	In capo al Comune	In capo al professionista	Istruttoria contr. e sismica	Contributi concessi in €
Cratere	2.145	1533	318	294		190	42	62	168.258.676,04
Fuori cratere	759	455	214	90		21	7	62	63.131.683,65
Totale	2.904*	1.988	532	384*		211	49	124	231.390.359,69

di cui (*)= 5 art.6 O.C.128/2022
Fonte dati: *Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2022*

Comuni cratere	Domande presentate	Domande accolte	Domande respinte	Domande in lavorazione	di cui	In capo al comune	In capo al professionista	Istruttoria contributiva e sismica	Contributi concessi in €
Arrone	22	16	3	3		-	-	3	1.084.489,48
Cascia	244	225	16	3		-	2	1	20.254.657,03
Cascia *O.C. n. 99/2020 dal 20/11/2020*	69	43	8	18		5	13	-	3.183.566,50
Cerreto di Spoleto	52	38	6	8		-	1	7	3.527.526,82
Ferentillo	40	19	9	12		5	2	5	1.591.133,36
Montefranco	13	12	1	-		-	-	-	674.979,98
Monteleone di Spoleto	52	47	3	2		2	-	-	3.967.813,37
Norcia	597	518	37	42		10	11	21	42.990.356,63
Norcia O.C. n. 99/2020 *dal 20/11/2020*	159	69	52	38		38	-	-	5.372.177,31
Poggiodomo	17	13	3	1		-	1	-	1.431.877,74
Polino	1	-	1	-		-	-	-	-
Preci	95	82	8	5		1	1	3	6.386.594,13
Sant'Anatolia di Narco	28	16	7	5		-	-	5	1.437.994,72
Scheggino	18	11	6	1		-	-	1	1.562.657,67
Sellano	67	47	12	8		1	3	4	2.772.236,55
Spoleto	226	183	21	22		3	8	11	30.726.994,26
Spoleto *O.C. n. 99/2020 dal 20/11/2020*	433	187	122	124		124	-	-	40.691.696,45
Vallo di Nera	12	7	3	2		1	-	1	601.924,04
Totale	2.145	1.533	318	294		190	42	62	168.258.676,04

Fonte dati: *Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2022*

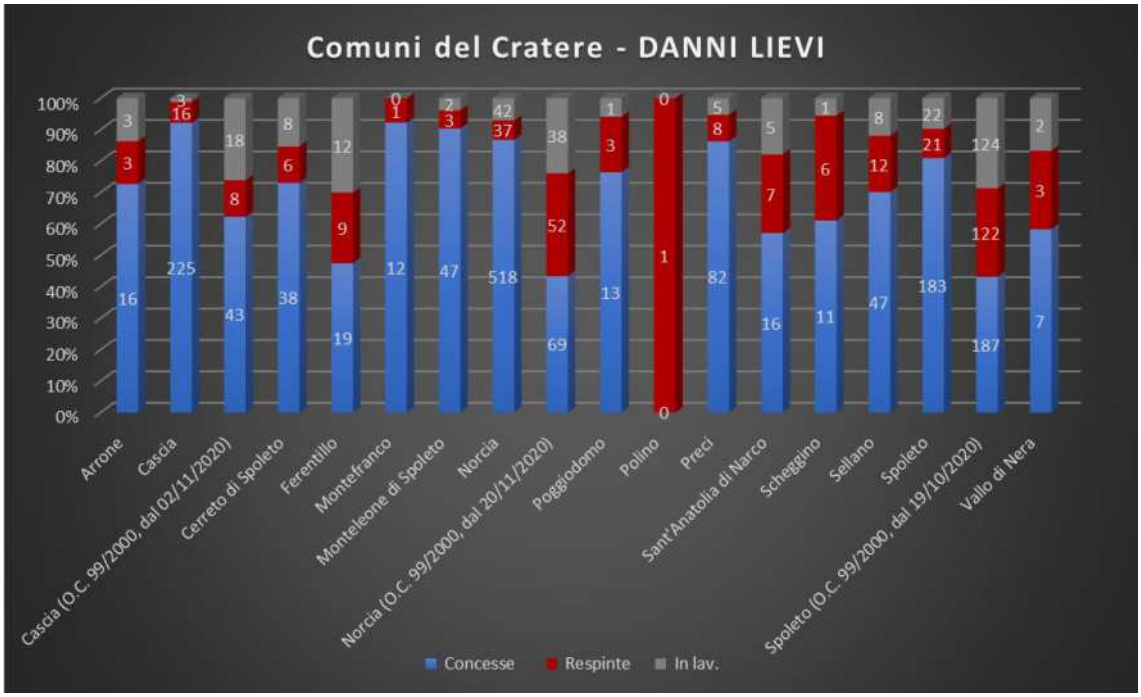
Comuni del Cratere - DANNI LIEVI
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Arrone
Cascia
Cascia (O.C. 99/2000, dal 02/11/2020)
Cerreto di Spoleto
Ferentillo
Montefranco
Monteleone di Spoleto
Norcia
Norcia (O.C. 99/2000, dal 20/11/2020)
Poggiodomo
Polino
Preci
Sant'Anatolia di Narco
Scheggino
Sellano
Spoleto
Spoleto (O.C. 99/2000, dal 19/10/2020)
Vallo di Nera
Concesse
Respinte
In lav.

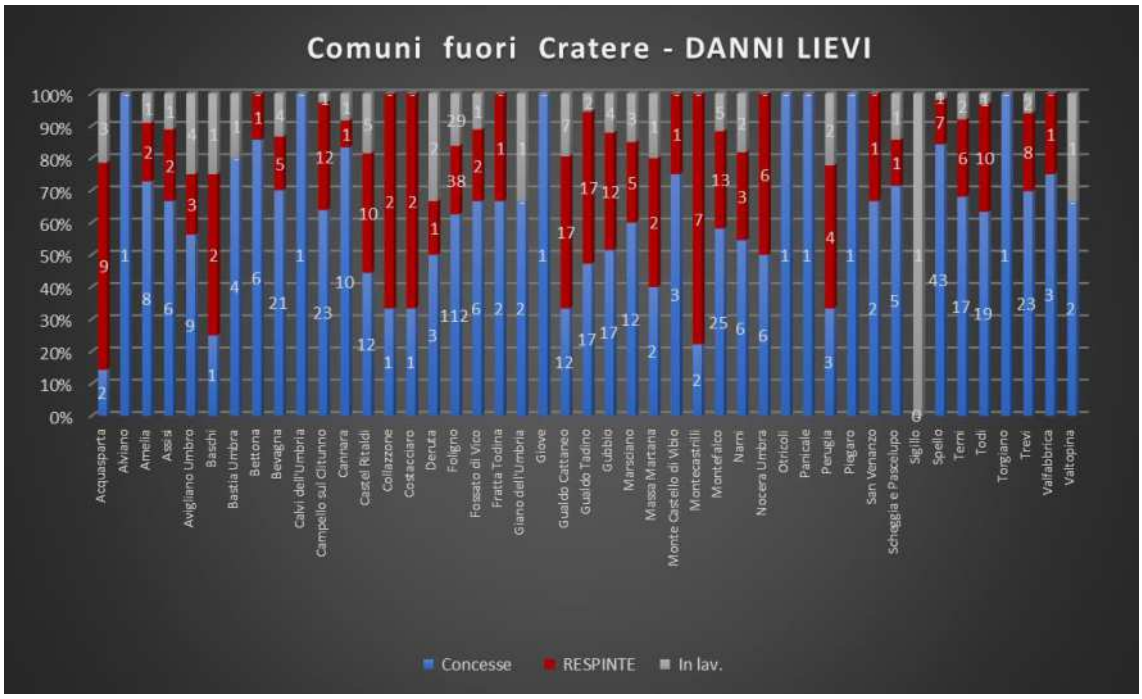
Comuni fuori Cratere - DANNI LIEVI
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Acquasparta
Alviano
Amelia
Assisi
Avigliano Umbro
Baschi
Bastia Umbra
Bettona
Bevagna
Calvi dell'Umbria
Campello sul Clitunno
Cannara
Castel Ritaldi
Collazzone
Costacciaro
Deruta
Foligno
Fossato di Vico
Fratta Todina
Giano dell'Umbria
Giove
Gualdo Cattaneo
Gualdo Tadino
Gubbio
Marsciano
Massa Martana
Monte Castello di Vibio
Montecastrilli
Montefalco
Narni
Nocera Umbra
Otricoli
Panicale
Perugia
Piegaro
San Venanzo
Scheggia e Pascelupo
Sigillo
Spello
Terni
Todi
Torgiano
Trevi
Valfabbrica
Valtopina
Concesse
RESPINTE
In lav.

Comuni fuori cratere	Domande presentate	Domande accolte	Domande respinte	Domande in lavorazione	DI CUI	In capo al comune	In capo al professionista	Istruttoria contributiva e sismica	Contributi concessi in €
Acquasparta	14	2	9	3		-	-	3	170.715,16
Amelia	11	8	2	1		-	-	1	1.252.612,09
Assisi	9	6	2	1		1	-	-	2.375.331,82
Avigliano Umbro	16	9	3	4		1	-	3	1.113.210,93
Bastia Umbra	5	4	-	1		-	-	1	316.614,23
Bettona	7	6	1	-		-	-	-	1.015.445,85
Bevagna	30	21	5	4		-	-	4	2.600.076,17
Calvi dell'Umbria	1	1	-	-		-	-	-	82.355,69
Campello sul Clitunno	36	23	12	1		-	1	-	2.512.842,63
Cannara	12	10	1	1		-	1	-	767.507,92
Castel Ritaldi	27	12	10	5		2	-	3	1.537.404,33
Collazzone	3	1	2	-		-	-	-	96.478,04
Deruta	6	3	1	2		-	-	2	343.581,44
Foligno	179	112	38	29		11	2	16	17.988.850,51
Fossato di Vico	9	6	2	1		-	-	1	889.416,13
Fratta Todina	3	2	1	-		-	-	-	114.170,96
Giano dell'Umbria	3	2	-	1		-	-	1	230.370,22
Giove	1	1	-	-		-	-	-	271.188,77
Gualdo Cattaneo	36	12	17	7		-	-	7	1.439.092,22
Gualdo Tadino	36	17	17	2		1	-	1	2.533.050,76
Gubbio	33	17	12	4		1	-	3	2.384.454,09
Marsciano	20	12	5	3		1	-	2	1.452.030,71
Massa Martana	5	2	2	1		-	-	1	201.717,34
Monte Castello di Vibio	4	3	1	-		-	-	-	273.364,54
Montecastrilli	9	2	7	-		-	-	-	155.488,56
Montefalco	43	25	13	5		-	-	5	3.460.976,35
Narni	11	6	3	2		1	1	-	1.495.819,63
Nocera Umbra	12	6	6	-		-	-	-	401.160,78
Otricoli	1	1	-	-		-	-	-	218.837,07
Perugia	9	3	4	2		-	-	2	429.777,83
Piegaro	1	1	-	-		-	-	-	55.747,00
San Venanzo	3	2	1	-		-	-	-	462.600,21
Scheggia e Pascelupo	7	5	1	1		1	-	-	427.639,67
Sigillo	1	-	-	1		-	1	-	-
Spello	51	43	7	1		-	-	1	3.833.884,43
Terni	25	17	6	2		-	1	1	2.776.527,00
Todi	30	19	10	1		-	-	1	4.324.415,51
Torgiano	1	1	-	-		-	-	-	58.732,11
Trevi	33	23	8	2		1	-	1	2.285.207,79
Valfabbrica	4	3	1	-		-	-	-	180.927,75
Totale	759	455	214	90		21	7	62	63.131.683,65

2.4. Misure per immobili con danni gravi

Le disposizioni dell'ordinanza commissariale n. 19/2017 sono finalizzate a disciplinare gli **interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti** dagli eventi sismici verificatisi nel 2016-2107 mentre con l'ordinanza commissariale n. 13/2017 sono stati disciplinati gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli **edifici ad uso prevalentemente produttivo** gravemente danneggiati o distrutti.
Al fine di predisporre un **quadro preciso e compiuto del fabbisogno finanziario della ricostruzione privata relativa ai danni gravi** è stato chiesto, in base all'ordinanza commissariale n. 111/2020 e n. 117/2021, di **manifestare la volontà alla presenzazione dell'istanza di concessione per il tramite di una comunicazione telematica** alla Struttura del Commissario, a pena della decadenza del contributo stesso. **Il termine**, prorogato più volte, **si è definitivamente chiuso il 31 dicembre 2022** con l'ordinanza commissariale n. 131/2022. Parimenti, alla fine del 2022, è stata chiusa la piattaforma per la presentazione della manifestazione di volontà.
Al 31 dicembre 2022 è stato prorogato anche il termine di presentazione della domanda di contributo a ricostruire da parte dei cittadini beneficiari del contributo di autonoma sistemazione (CAS) o delle soluzioni abitative di emergenza (SAE). In queste fattispecie, i richiedenti hanno avuto la **possibilità di presentare il progetto in forma semplificata**, da integrare poi entro il 15 marzo 2023, a pena della decadenza dal contributo.
Alla data del 31 dicembre 2022, rispetto al censimento danni che quantifica in 5.654 gli edifici inagibili, risulta che le pratiche presentate in Umbria relative ai danni gravi sono 1.507 delle quali 426 presentate in forma semplificata ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 128/2022. Tra le pratiche complete, invece, **643 sono state accolte**, **127 rigettate** e **311 risultano in istruttoria**. Nel solo 2022 sono state evase il 34% delle istanze di ricostruzione pesante dall'inizio dell'attività dell'USR nel 2017.

Nelle tabelle che seguono la situazione dettagliata nei **comuni del cratere** e **fuori cratere**:

RIEPILOGO DANNI GRAVI									
DOMANDE									
Comuni	**Presentate**	**Accolte**	**Respinte**	**In lavorazione**	**DI CUI**	**In capo al comune**	**In capo al professionista**	**Istruttoria contr e sismica**	**Contributi concessi in €**
Cratere	1095	460	76	559		23	8	528	**317.010.711,70**
Fuori Cratere	412	184	51	177		12	5	160	**107.465.376,32**
Totale	**1507**	**644**	**127**	**736**		**35**	**13**	**688**	**424.476.088,02**

Fonte dati: *Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2022*

Comuni cratere	Domande presentate	Domande accolte	Domande respinte	Domande in lavorazione	di cui	In capo al comune	In capo al professionista	Istruttoria contributiva e sismica	Contributi concessi in €
ARRONE	10	4	2	4		-	-	4	934.418
CASCIA	100	54	4	42		1	3	38	52.546.761
CERRETO DI SPOLETO	15	6	3	6		-	-	6	1.081.565
FERENTILLO	9	5	-	4		-	-	4	1.421.175
MONTEFRANCO	2	1	-	1		-	-	1	40.666
MONTELEONE DI SPOLETO	15	7	2	6		-	-	6	1.644.192
NORCIA	667	275	41	351		11	3	337	192.860.144
POGGIODOMO	3	1	-	2		-	-	2	266.681
POLINO	-	-	-	-		-	-	-	-
PRECI	75	40	10	25		3	1	21	19.153.749
S. ANATOLIA DI NARCO	11	4	5	2		-	-	2	827.640
SCHEGGINO	-	-	-	-		-	-	-	-
SELLANO	23	14	-	9		1	-	8	2.807.145
SPOLETO	160	46	9	105		7	1	97	42.039.708
VALLO DI NERA	5	3	-	2		-	-	2	1.386.870
TOTALE	1.095	460	76	559		23	8	528	**317.010.712**

Fonte dati: *Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2022*

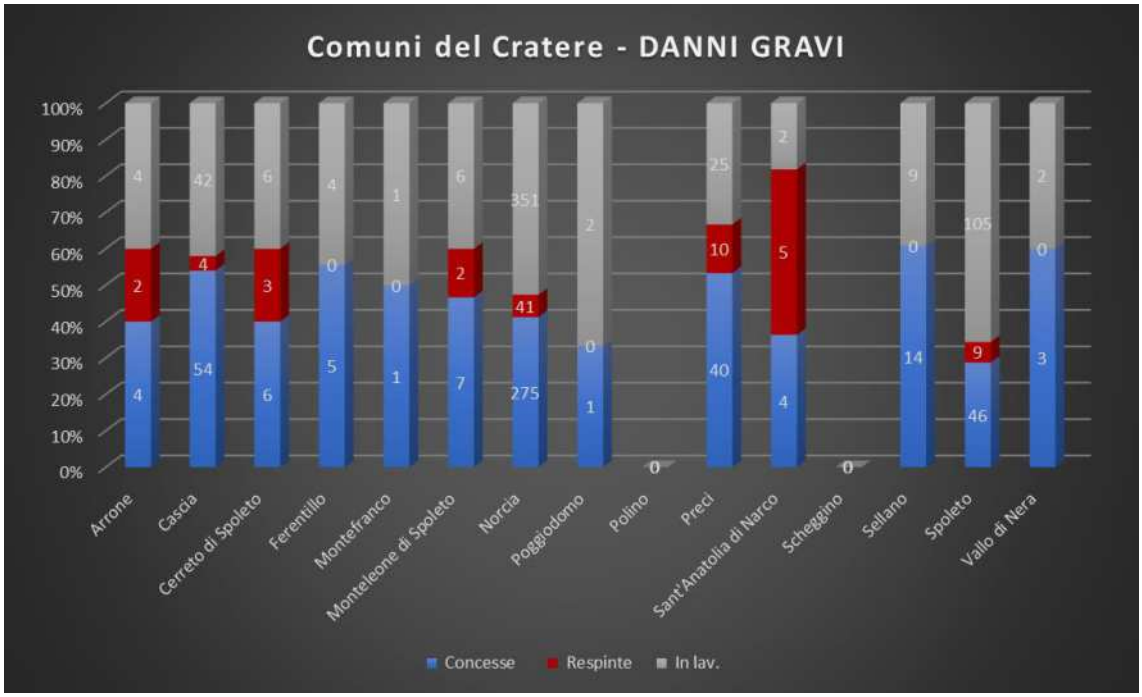
Comuni del Cratere - DANNI GRAVI
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Arrone
Cascia
Cerreto di Spoleto
Ferentillo
Montefranco
Monteleone di Spoleto
Norcia
Poggiodomo
Polino
Preci
Sant'Anatolia di Narco
Scheggino
Sellano
Spoleto
Vallo di Nera
Concesse
Respinte
In lav.

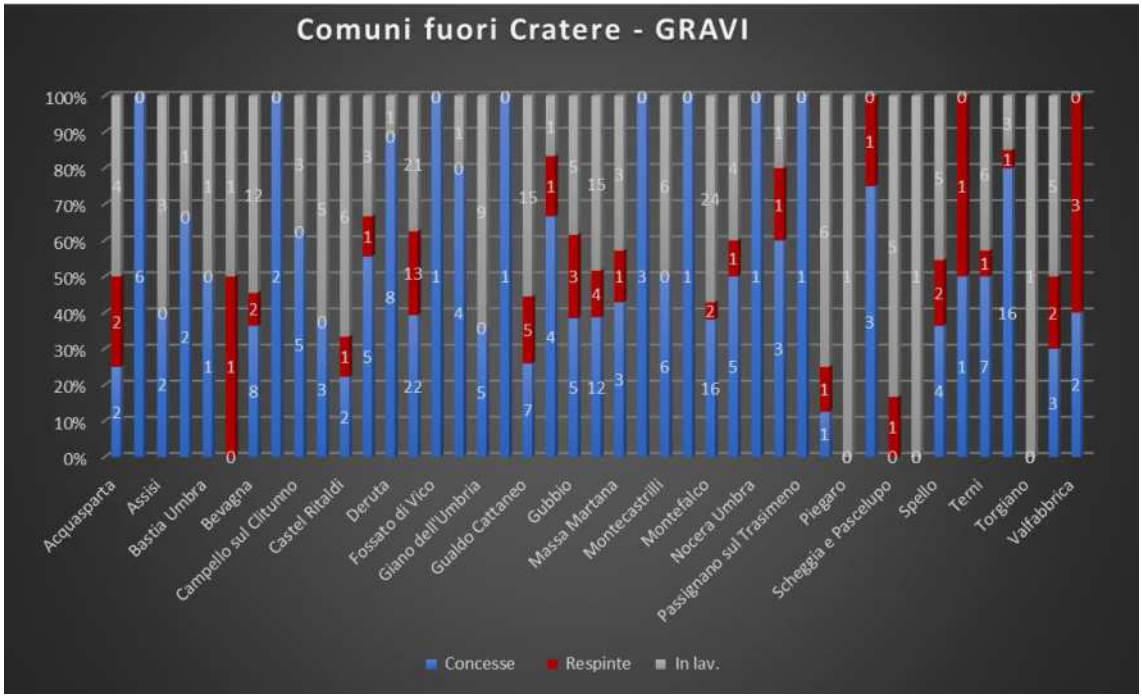
Comuni fuori Cratere - GRAVI
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Acquasparta
Assisi
Bastia Umbra
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Deruta
Fossato di Vico
Giano dell'Umbria
Gualdo Cattaneo
Gubbio
Massa Martana
Montecastrilli
Montefalco
Nocera Umbra
Passignano sul Trasimeno
Piegaro
Scheggia e Pascelupo
Spello
Terni
Torgiano
Valfabbrica
Concesse
Respinte
In lav.

Comuni fuori cratere	Domande presentate	Domande accolte	Domande respinte	Domande in lavorazione	di cui	In capo al comune	In capo al professionista	Istruttoria contributiva e sismica	Contributi concessi in €
ACQUASPARTA	8	2	2	4		-	-	4	792.112,21
AMELIA	6	6	-	-		-	-	-	7.852.045,82
ASSISI	5	2	-	3		1	-	2	3.497.682,57
AVIGLIANO UMBRO	3	2	-	1		-	-	1	1.063.168,03
BASTIA UMBRA	2	1	-	1		-	-	1	888.431,06
BETTONA	2	-	1	1		-	-	1	-
BEVAGNA	22	8	2	12		1	-	11	4.483.597,88
CALVI DELL'UMBRIA	2	2	-	-		-	-	-	831.448,15
CAMPELLO SUL CLITUNNO	8	5	-	3		1	-	2	4.734.601,19
CANNARA	8	3	-	5		1	-	4	1.109.021,51
CASTEL RITALDI	9	2	1	6		-	-	6	592.930,76
COLLAZZONE	9	5	1	3		-	1	2	1.835.357,69
DERUTA	9	8	-	1		-	-	1	3.898.531,02
FOLIGNO	56	22	13	21		-	-	21	9.064.405,80
FOSSATO DI VICO	1	1	-	-		-	-	-	258.141,23
FRATTA TODINA	5	4	-	1		-	-	1	878.045,71
GIANO DELL'UMBRIA	14	5	-	9		-	-	9	2.984.109,46
GIOVE	1	1	-	-		-	-	-	10.818.860,55
GUALDO CATTANEO	27	7	5	15		1	-	14	2.527.189,27
GUALDO TADINO	6	4	1	1		-	-	1	1.094.720,18
GUBBIO	13	5	3	5		-	-	5	3.540.282,35 €
MARSCIANO	31	12	4	15		4	1	10	7.393.771,84
MASSA MARTANA	7	3	1	3		-	-	3	870.630,95
MONTE CASTELLO DI VIBIO	3	3	-	-		-	-	-	1.069.293,42
MONTECASTRILLI	12	6	-	6		-	1	5	2.568.110,76
MONTECCHIO	1	1	-	-		-	-	-	250.253,90
MONTEFALCO	42	16	2	24		-	1	23	7.327.358,76
NARNI	10	5	1	4		-	-	4	1.717.386,97
NOCERA UMBRA	1	1	-	-		-	-	-	1.547.231,42
OTRICOLI	5	3	1	1		-	1	-	2.677.477,74
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1	1	-	-		-	-	-	217.440,95
PERUGIA	8	1	1	6		2	-	4	624.840,82
PIEGARO	1	-	-	1		-	-	1	-
SAN VENANZO	4	3	1	-		-	-	-	944.444,40
SCHEGGIA E PASCELUPO	6	-	1	5		-	-	5	-
SIGILLO	1	-	-	1		-	-	1	-
SPELLO	11	4	2	5		-	-	5	1.519.446,64
STRONCONE	2	1	1	-		-	-	-	1.343.575,68
TERNI	14	7	1	6		-	-	6	2.446.988,02
TODI	20	16	1	3		-	-	3	10.473.499,26
TORGIANO	1	-	-	1		-	-	1	-
TREVI	10	3	2	5		1	-	4	1.335.332,79
VALFABBRICA	5	2	3	-		-	-	-	393.609,56
TOTALE	412	183	51	178		12	5	161	107.465.376,32

Fonte dati: *Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2022*

2.5. I numeri complessivi della ricostruzione privata nel 2022

Il 2022 è stato certamente l'anno in cui si sono **consolidate le modalità di concessione contributiva** dettate dall'ordinanza commissariale **n. 100/2020**: il principio di **semplificazione amministrativa** ha trovato la giusta collocazione nel procedimento di concessione ed erogazione contributiva, dando il giusto impulso al processo di ricostruzione, complice anche le energie spese da parte del personale dell'USR Umbria nella divulgazione delle nuove procedure e nella formazione dei tecnici della pubblica amministrazione e dei professionisti operanti nel settore. **Con l'ordinanza commissariale n. 126/2022 si è reso necessario attuare una revisione delle istanze già presentate** e, pertanto, l'impegno istruttorio dell'USR Umbria si è rivolto anche all'aggiornamento dei nuovi importi.
I dati evidenziano che nel 2022 sono state decretate **609** istanze, per un totale di contributi concessi dall'avvio della ricostruzione al 31 dicembre 2022 pari ad **€ 655.866.447,71**, il **36 %** dei quali è stato concesso nel **solo nel 2022**.
Per quanto riguarda specificatamente la sola attività dell'USR, si rileva l'avvenuta concessione di 475 istanze, l'autorizzazione di 29 istanze di variante, la rideterminazione del contributo di 33 istanze per richiesta di applicazione delle previsioni dell'ordinanza commissariale n. 126/2022, l'emissione di 27 decreti di improcedibilità e di 48 decreti di rigetto, per un totale di **612 istruttorie concluse, mentre 345 istanze risultano in istruttoria** e 431, presentate in forma semplificata, sono in attesa di essere perfezionate entro il 15 marzo 2023.

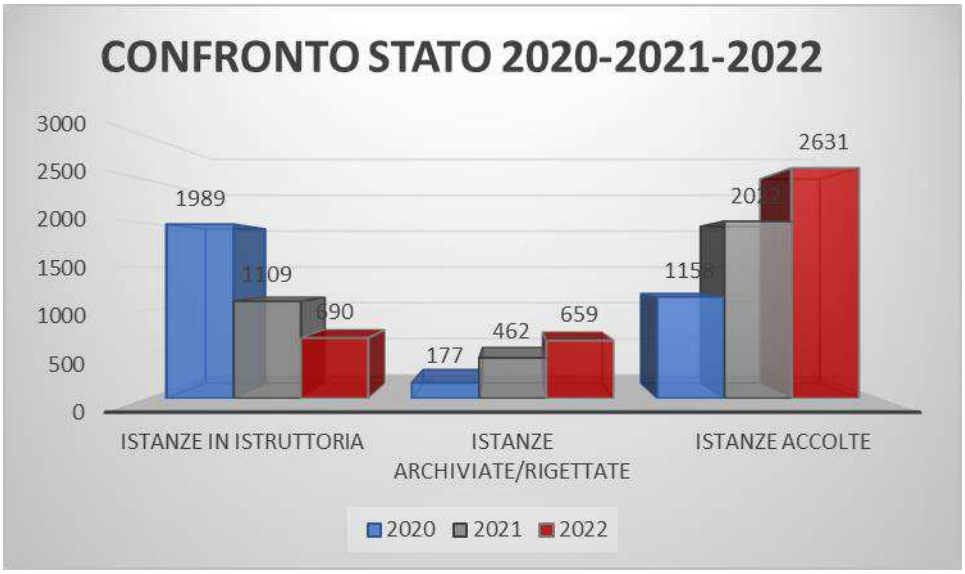

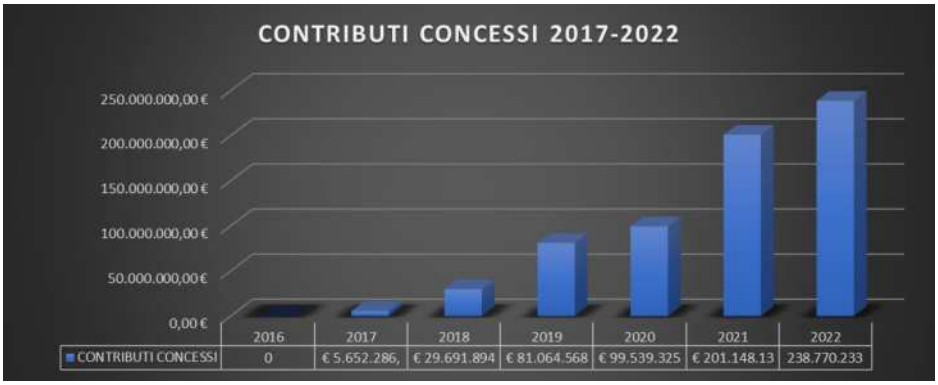
CONTRIBUTI CONCESSI 2017-2022
250.000.000,00 €
200.000.000,00 €
150.000.000,00 €
100.000.000,00 €
50.000.000,00 €
0,00 €
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CONTRIBUTI CONCESSI 0 € 5.652.286, € 29.691.894 € 81.064.568 € 99.539.325 € 201.148.13 238.770.233

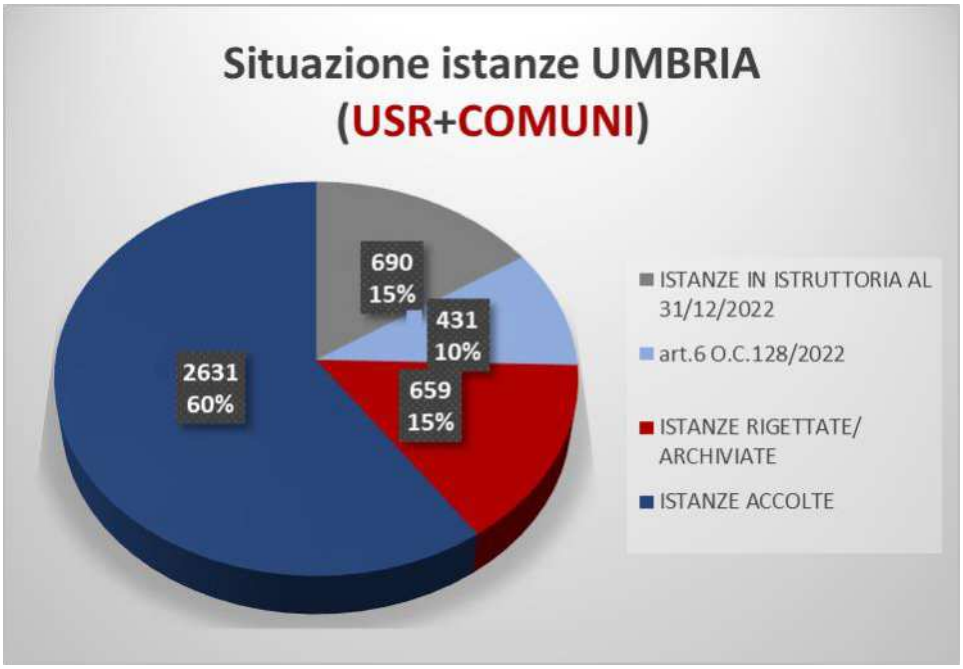
Situazione istanze UMBRIA
(USR+COMUNI)
690
15%
431
10%
659
15%
2631
60%
ISTANZE IN ISTRUTTORIA AL 31/12/2022
art.6 O.C.128/2022
ISTANZE RIGETTATE/ ARCHIVIATE
ISTANZE ACCOLTE

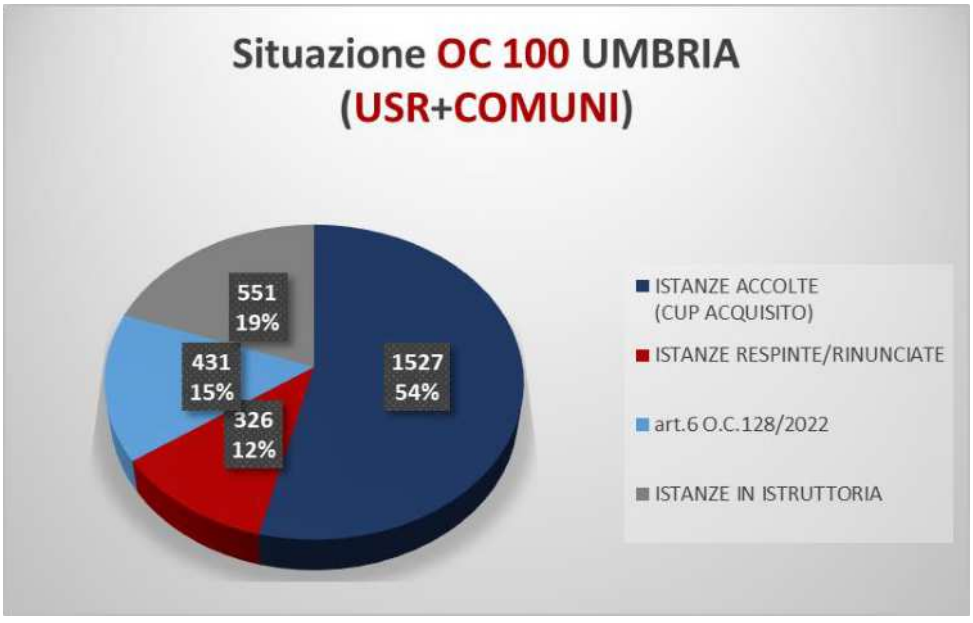
Situazione OC 100 UMBRIA
(USR+COMUNI)
551
19%
431
15%
326
12%
1527
54%
ISTANZE ACCOLTE (CUP ACQUISITO)
ISTANZE RESPINTE/RINUNCIATE
art.6 O.C.128/2022
ISTANZE IN ISTRUTTORIA

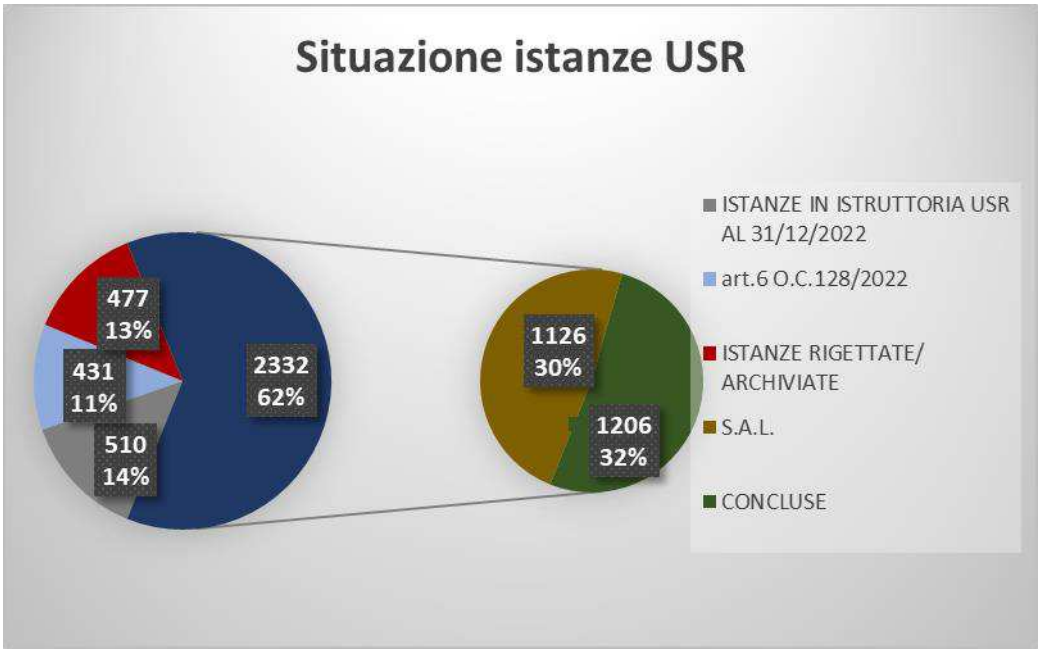

Anche nel 2022, come nel 2021, si è registrato un **significativo incremento** delle richieste di **erogazione** di **stati di avanzamento**. Nel 2022 l'USR Umbria ne ha evasi **1.401**.

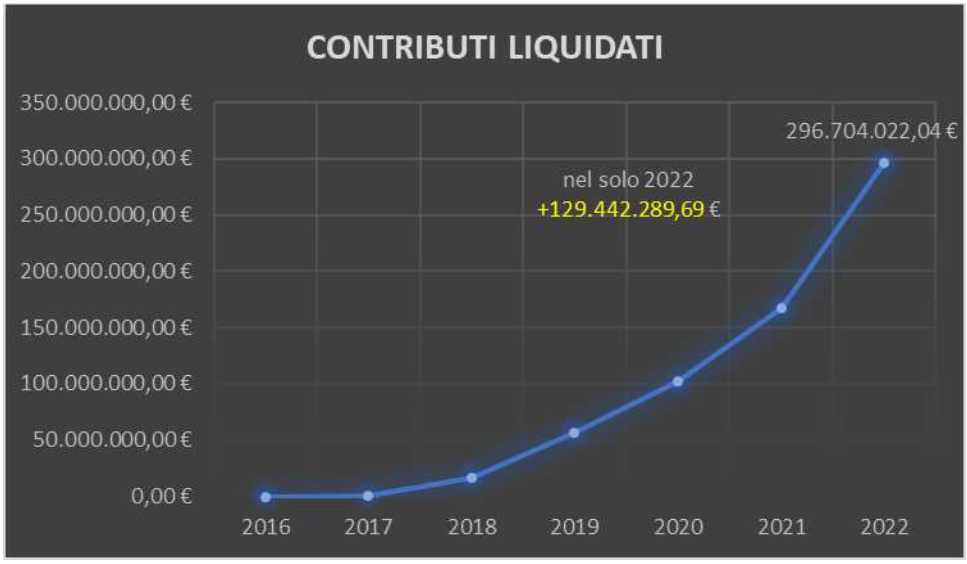

A tal fine l'USR Umbria si è dotato di una **efficace organizzazione interna**, nella consapevolezza dell'importanza che tale attività riveste a livello economico e sociale visto il perdurare della sfavorevole congiuntura economica.
Gli **importi liquidati** dall'avvio della ricostruzione al 31 dicembre 2022 sono **pari a € 296.704.022,04**, dei quali il 44% nel solo 2022.
Il 2022 è stato anche l'anno in cui sono state **semplificate anche le modalità di erogazione delle liquidazioni** dettate dall'ordinanza commissariale n.

118/2021, operative dal primo gennaio 2022 con la firma del decreto attuativo n. 627 del 31 dicembre 2021, grazie all'asseverazione degli stati di avanzamento dei lavori da parte dei professionisti incaricati.
La **semplificazione riguarda sia i SAL intermedi, che il SAL finale**.

In conclusione, dall'analisi dei dati emerge che l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata in Umbria ha avuto, a partire dal 2020, una **consistente accelerazione nonostante un contesto congiunturale difficile** per:

- l'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha comportato la sospensione delle attività nei cantieri per diversi mesi;
- le difficili dinamiche del mercato dell'edilizia innescate dalle detrazioni del 110% sulle ristrutturazione che hanno determinato nelle aree del cratere una forte carenza di tecnici e di imprese nonchè il fortissimo incremento dei prezzi dei materiali da costruzioni e di molti materiali indispensabili per l'edilizia;
- l'aumento dei prezzi dell'energia e di altre materie prime a seguito del conflitto tra Ucraina e Russia.

2.6. Attività istruttoria pratiche sismiche

Dal 2021, in seguito all'adozione dell'ordinanza del Vice Commissario n. 12/2020, sono in capo all'USR – Servizio Ricostruzione privata le attività connesse agli **adempimenti per le costruzioni in zona sismica** di cui agli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. n. 380/01, cui segue l'emissione delle autorizzazioni preventive e degli esiti favorevoli del controllo sugli atti progettuali per le verifiche a campione in corso d'opera (art. 208 L.R. n. 1/2015).
Nel dettaglio l'attività istruttoria per le sole istanze di ricostruzione privata in capo all'USR Umbria: in particolare su un totale di **433 istanze presentate**, **201 sono state istruite ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva e 49 ai fini del controllo** in corso d'opera per i depositi e i preavvisi scritti estratti, congiuntamente all'attività della sezione "Controlli".

USR UMBRIA - ISTRUTTORIE SISMICHE 2022		
Attività: istruttoria per l'autorizzazione sismica o rilascio esito favorevole del controllo sulle pratiche oggetto di preavviso scritto e deposito e oggetto di controllo in corso d'opera ai sensi dell'art. 208 della L.R. 1/2015		
	Numero istruttorie	
Istruttoria autorizzazione	210	(201 + 9*)
Istruttoria preavviso scritto e deposito	56	(49 + 7*)
TOTALE	266	(250 + 16*)
Istanze istruite per conto dei Comuni di Spoleto, Cascia e Norcia (O.C. n. 99/2020)		
Fonte dati: Sistema gestionale SAVIO al 31 dicembre 2022		

Inoltre il Servizio Ricostruzione Privata, per il tramite della Sezione 'Erogazione Contributi e Sismica', istituita con Ordinanza del Vice Commissario n. 12/2020, è competente per l'istruttoria e il rilascio dei provvedimenti previsti in zona sismica anche delle istanze di danno lieve in capo ai comuni di Spoleto, Cascia e Norcia, secondo le previsioni dell'O.C. n. 99/2020, nonchè per il rilascio del parere di conformità alle norme tecniche vigenti per gli interventi di ricostruzione pubblica e, pertanto, ha eseguito **l'istruttoria di ulteriori 16 istanze, di cui 9 autorizzazioni sismiche e 7 depositi estratti per controlli in corso d'opera.** Oltre a ciò il Servizio Ricostruzione privata dell'USR-Umbria si è occupato del **rilascio di pareri** sul **progetto definitivo** delle **Conferenze regionali delle opere di ricostruzione pubblica** e, dall'adozione della DGR n. 331/2021, nei casi dei lavori pubblici soggetti alle disposizioni del comma 2-ter, dell'art. 5 della L. 186/2004, su richiesta del soggetto attuatore, rilascia il **parere di conformità alle norme tecniche vigenti**, utile ai fini della verifica di cui all'art. 26 del D. Lgs n. 50/2016 finalizzato alla validazione dei progetti a cura degli stessi soggetti interessati. **In relazione a tale attività sono stati rilasciati 20 pareri di conformità**. A questi si aggiungono gli **esiti istruttori favorevoli per ulteriori 3 opere pubbliche** soggette ad autorizzazione sismica preventiva.

2.7. Autorizzazioni miglioramento sismico e livelli operativi

L'ordinanza commissariale n. 19/2017 prevede che, su richiesta dei soggetti legittimati, l'Ufficio Speciale Ricostruzione possa determinare in maniera preventiva il livello operativo e rilasciare l'autorizzazione alla progettazione di interventi di miglioramento sismico.
Al 31 dicembre 2022 sono state presentate **1862 istanze** di cui 1412 rilasciate, 352 rigettate o archiviate su istanza di parte. Le restanti sono in istruttoria.
Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi allo stato di avanzamento della ricostruzione privata relativamente alle autorizzazioni al miglioramento sismico e alla determinazione del livello operativo.

ANNO	ISTANZE	AUTORIZZAZIONI AL MIGLIORAMENTO SISMICO *ORDINANZA N. 19/2017 ART. 2, C. 4*	DETERMINAZIONE PREVENTIVA DEL LIVELLO OPERATIVO *ORDINANZA N. 19/2017 ART. 6 BIS*
2022	In istruttoria	**20**	**78**
	Concluse	**260**	**1152**
	Rigettate	206	**146**
	TOTALE	486	1376

Fonte dati: Sistema gestionale SAVIO al 31 dicembre 2022

Occorre evidenziare che **tali attività vengono svolte dallo stesso personale**, con profilo tecnico e tecnico-ingegneristico in capo all'USR-Umbria, che già si occupa delle istruttorie contributive e sismiche finalizzate al rilascio delle concessioni relative alle istanze RCR (Richiesta Contributi Ricostruzione).
Questi adempimenti, pur non trovando riscontro oggettivo nella reportistica ufficiale che esamina esclusivamente il rapporto percentuale tra il numero delle istanze RCR "accolte/respinte" e le istanze presentate, **rappresentano un ulteriore carico di lavoro per gli istruttori** e contestualmente ritardi sulle attività prevalenti (rilascio concessioni contributive e liquidazione stati avanzamento lavori).
Il tutto, come già evidenziato nel paragrafo relativo al personale in dotazione all' **USR-Umbria**, è rappresentativo del **sottodimensionamento** dello **stesso in virtù delle numerose attività richieste** alla struttura suddetta.

2.8. Le attività produttive

All'indomani del sisma 2016, con l'ordinanza del Commissario n. 9/2016, è stata consentita la **temporanea delocalizzazione** per le imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza dei sindaci.
La delocalizzazione delle attività economiche è avvenuta in base alle seguenti tipologie:

DELOCALIZZAZIONE	
Tipologia A	**in altro edificio agibile sito nello stesso comune**
Tipologia B	**all'interno del lotto di pertinenza** dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti
Tipologia C	**all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta** in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016
Tipologia D	**all'interno di un'area pubblica attrezzata** dal Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice commissario. **N.B.:** Questa ipotesi non è stata attivata nella Regione Umbria e, ove necessario è stata ricondotta alla tipologia C.

Sono pervenute agli uffici regionali **484 domande** di delocalizzazione di cui 261 ammissibili (53,9%).

In particolare, per le **delocalizzazione di tipo A** è riconosciuto un contributo sulle spese di affitto mediante contabilità speciale. Dal 2018 al 2022 gli importi erogati per gli affitti sono i seguenti:

DELOCALIZZAZIONI DI TIPO A (AFFITTI)	
Anno	Importi liquidati in €
2018	328.692,13
2019	600.253,46
2020	715.229,97
2021	510.786,69
2022	390.871,29
	Fonte dati: USR Umbria al 31 dicembre 2022

Per le **delocalizzazioni di tipo B** la normativa riconosce un contributo sui costi di realizzazione della struttura temporanea nei lotti di pertinenza o nelle immediate vicinanze. Nel corso del 2022 non sono state realizzate nuove strutture temporanee di tipo B per cui non sono stati erogati contributi per tale tipologia di delocalizzazione.
Per le **delocalizzazioni di tipo C** la Regione Umbria ha stabilito che le delocalizzazioni eseguite direttamente dagli uffici regionali fossero limitate ai soli comuni di Cascia, Norcia e Preci, maggiormente colpiti dagli eventi sismici per le seguenti attività economiche: ristoranti di Norcia, negozi turistici di Cascia e Norcia, attività professionali, artigianali e commerciali di Norcia, ristorante, caseifici ed altre attività a Castelluccio di Norcia.

ORDINANZA N. 9/2016	
LIQUIDAZIONE RIMBORSI ATTIVITÀ DELOCALIZZATE	
DOMANDE PRESENTATE	179
DOMANDE LIQUIDATE	179
Tipologia A	**73**
Liquidate	73
Tipologia B	**55**
Liquidate	55
Tipologia C	**51**
Liquidate	51
CONTABILITÀ SPECIALE ANNO 2022 €	**390.871,29**
CONTABILITÀ SPECIALE TOTALE €	**2.548.601,52**
CREDITO DI IMPOSTA ANNO 2022 €	**162.655,50**
CREDITO DI IMPOSTA TOTALE €	**5.905.728,49**
Totale rimborsi erogati €	**8.063.458,72**
Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2022	

In presenza di determinati requisiti è riconosciuto un **rimborso pari all'80%** del costo indicato nella perizia asseverata **per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti,** volti a ripristinare la piena funzionalità dell'impresa nonché pari al 60% del valore delle **scorte distrutte o danneggiate** e dell'80% dei costi documentati per le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature. Il rimborso è erogato con le modalità del credito d'imposta.
Per l'autorizzazione al rimborso dei danni causati dal sisma ad impianti, beni e scorte, ai sensi dell'ordinanza del Commissario n. 13/2017 le pratiche presentate alla data del 31 dicembre 2022 sono riportate nella seguente tabella:

ORDINANZA N. 13/2017	
LIQUIDAZIONE RIMBORSI ATTIVITÀ DELOCALIZZATE (NUOVE DOMANDE)	
Domande presentate	6
Domande autorizzate	5
Domande rigettate	=
Domande in istruttoria o in attesa di integrazioni	1
LIQUIDAZIONE RIMBORSI ATTIVITÀ DELOCALIZZATE NEL 2022	
Domande presentate	9
Domande liquidate e in corso di liquidazione in base agli stati di avanzamento	9
Domande in istruttoria /in attesa di integrazioni	9
Totale rimborsi erogati nel 2022 (credito di imposta) €	967.052,00
Totale rimborsi erogati dal 2016 al 2022 (credito di imposta) €	4.767.576,62
Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2022	

2.9. Contributi per le attività produttive

BANDO 2018: D.L.189/2016, art. 20-bis - Contributi per la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva a seguito del sisma

In attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2017, con decreto del Vice Commissario n. 13 del 21 marzo 2018, è stato approvato un **primo avviso** per la **concessione di contributi finalizzati a favorire la prosecuzione dell'attività e della ripresa produttiva delle imprese** del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica. I contributi concessi sono stati pari al 30% della riduzione del fatturato a seguito degli eventi sismici e comunque in misura non superiore a euro 50.000,00.
Sono state 526 le ditte a cui sono stati concessi i contributi nel 2018 e sono stati liquidati in due tranche – una prima anticipazione del 40% e poi il saldo dopo la verifica dei documenti contabili - nel periodo tra dicembre 2018 e aprile 2022 (liquidati nel 2022 euro 3.883,95). **Questo bando è dunque giunto a conclusione, ad eccezione dei procedimenti di recupero a seguito di revoca ancora in corso.** Nella seguente tabella sono riassunti i dati finali relativi alle liquidazioni:

SITUAZIONE FINALE AL 31 DICEMBRE 2022				
STATO DI ATTUAZIONE	NUMERO DITTE	% DITTE SUL TOTALE	CONTRIBUTO LIQUIDATO IN €	ECONOMIE ACCERTATE IN €
Ditte che hanno percepito il saldo	269	51,14	2.729.761,45	
Ditte con atto di revoca	27	5,13	34.168,91	
CRATERE	**296**	**56,27**	**2.763.930,36**	**336.627,82**
Ditte che hanno percepito il saldo	221	42,02	2.255.567,32	
Ditte con atto di revoca	9	1,71	20.995,97	
FUORI CRATERE	**230**	**43,73**	**2.276.563,29**	**57.224,25**
TOTALE	**526**	**100 %**	**5.040.493,65**	**393.852,07**

BANDO 2021: D.L.189/2016, art. 20-bis - Contributi per la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva a seguito del sisma

Alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto del 6 giugno 2019 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato modificato e integrato il decreto dell'11 agosto 2017 (prevedendo in particolare la concessione dei contributi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti *"in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi"* anziché esclusivamente nel biennio 2017-2018, nonché l'eliminazione del limite del 30 per cento della riduzione del fatturato per la determinazione dei costi della produzione ammissibili al contributo), nel 2021 è stato approvato un **nuovo avviso per i contributi a sostegno alle imprese** ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 189/2016.
Le sopra descritte modifiche normative consentono infatti:

- di concedere i contributi alle imprese che hanno ripreso la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018 e che quindi non hanno sostenuto costi di produzione nel biennio 2017-2018;
- incrementare i contributi concessi alle imprese già beneficiarie in seguito all'avviso di cui al sopracitato decreto del Vice Commissario del 21 marzo 2018, n. 13.

Come si legge nell'atto di approvazione delle disposizioni attuative decreto del Vice Commissario n. 600 del 16 luglio 2021, a fronte dei complessivi € 9.690.000,00 trasferiti nella contabilità speciale n. 6040 intestata alla Presidente della Regione – Vice Commissario per la ricostruzione dal Ministro dello Sviluppo economico finalizzati alla concessione dei contributi in questione, togliendo il fabbisogno per garantire la copertura delle concessioni effettuate con il precedente bando del 2018, le risorse da destinare al nuovo bando sono pari ad € 4.396.104,95.
A causa delle poche domande ricevute, rispetto al potenziale numero delle imprese interessate, la scadenza dell'avviso è stata prorogata dal 31 agosto 2021, al 31 ottobre 2021 e successivamente al 31 dicembre 2021. Le **domande** protocollate al 31 dicembre 2021 **sono in totale 248** di cui 216 sono state inviate dalle ditte beneficiarie dei contributi del primo bando.
Già con la deliberazione n. 250 del 19 marzo 2018 la Giunta Regionale dell'Umbria aveva dato mandato alle strutture regionali competenti della Direzione regionale "Attività Produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione" di assicurare supporto gestionale necessario al funzionamento e alla piena operatività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per gli aspetti afferenti in particolare la gestione degli incentivi di cui al decreto legge 189/2016 art. 20 bis. In attuazione della suddetta DGR n. 250/2018, è stato nominato un **Gruppo di Lavoro Tecnico** (con determinazioni direttoriali n. 3375 del 4 giugno 2018 e n. 5956 dell' 11 giugno 2018, poi modificato e integrato con la determina direttoriale n. 1499 dell' 11 febbraio 2022 e n. 6301 del 22 giugno 2022) che si

è quindi occupato della fase istruttoria delle istanze, di supporto nella gestione del Registro Nazionale Aiuti e dei controlli previsti dalla normativa.
Facendo seguito al verbale del Gruppo di Lavoro Tecnico del 22 giugno 2022, con decreto del dirigente delegato n. 457 del 4 luglio 2022 è stata **adottata la graduatoria delle imprese ammesse a contributo** calcolato tenendo conto anche del precedente contributo già erogato.
Tutti i contributi sono stati liquidati nel corso del 2022 a partire dal mese di luglio, dando luogo ad un'economia di spesa rispetto allo stanziamento iniziale trasferito in contabilità speciale n. 6040 di circa € 1,9 milioni.
Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio per settore di attività e per Comune della sede operativa dell'attività economica:

SETTORE	N. DITTE	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO LIQUIDATO
CRATERE SISMICO	**203**	**2.268.821,28**	**2.253.212,92**
Agricoltura	9	69.366,53	69.366,53
Artigiano	72	727.664,72	727.664,72
Commercio	81	839.916,30	831.854,24
Somministrazione	35	553.675,99	546.285,95
Turismo	6	78.197,74	78.041,48
FUORI CRATERE SISMICO	**37**	**448.700,90**	**448.700,90**
Agricoltura	4	35.657,31	35.657,31
Artigiano	21	285.424,68	285.424,68
Commercio	5	47.730,64	47.730,64
Somministrazione	1	16.876,02	16.876,02
Turismo	6	63.012,25	63.012,25
TOTALE COMPLESSIVO	**240**	**2.717.522,18**	**2.701.913,82**

Ditte con sede operativa nel Comune di:	N. Ditte beneficiarie	Tot. Contributi CONCESSI	Tot. Contributi LIQUIDATI
CRATERE	**203**	**2.268.821,28**	**2.253.212,92**
Cascia	63	507.912,07	507.912,07
Cerreto di Spoleto	1	1.903,50	1.903,50
Ferentillo	1	17.785,20	17.785,20
Monteleone di Spoleto	8	66.708,69	66.708,69
Norcia	92	1.090.192,37	1.074.584,01
Preci	3	33.534,72	33.534,72
Sant'Anatolia di Narco	3	68.838,23	68.838,23
Sellano	1	21.924,11	21.924,11
Spoleto	29	434.095,40	434.095,40
Vallo di Nera	2	25.926,98	25.926,98
FUORI CRATERE	**37**	**448.700,90**	**448.700,90**
Assisi	5	53.690,48	53.690,48
Bastia Umbra	2	11.488,65	11.488,65
Castel Ritaldi	2	63.832,76	63.832,76
Città di Castello	1	1.154,51	1.154,51
Corciano	1	2.282,25	2.282,25
Deruta	7	63.259,53	63.259,53
Foligno	7	42.308,36	42.308,36
Giano dell'Umbria	1	15.190,57	15.190,57
Gualdo Cattaneo	1	1.398,78	1.398,78
Gubbio	1	50.000,00	50.000,00
Nocera Umbra	2	22.190,95	22.190,95
Perugia	2	67.930,62	67.930,62
Todi	1	15.457,10	15.457,10
Torgiano	2	19.411,09	19.411,09
Trevi	2	19.105,25	19.105,25
TOTALE COMPLESSIVO	**240**	**2.717.522,09**	**2.701.913,82**

D.L. 189/2016, art. 20 - Decreto interministeriale del 10 maggio 2018. Contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma.

È stato pubblicato alla fine di giugno 2019 il bando per il finanziamento degli investimenti delle imprese in tutti i settori produttivi ubicate o che si localizzano in uno dei 15 comuni umbri maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017.
L'avviso prevede una dotazione complessiva di € 4.900.000,00, di cui il 40% è oggetto di specifiche **riserve in favore delle imprese dei comuni di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto**.
Sono state pertanto formate due graduatorie A e B, all'interno delle quali una quota massima pari al 10% delle risorse, è destinata ad imprese operanti nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura (A2 e B2).
La graduatoria definitiva - suddivisa in quattro sezioni – è stata approvata con DDD n. 538 del 7 ottobre 2020 e prevedeva la concessione di contributi a 53 imprese.
Nel corso del 2022 tuttavia alcune ditte hanno comunicato di voler rinunciare al contributo concesso ed altre non hanno presentato alcuna richiesta di proroga di scadenza dei termini per poter realizzare il progetto d'investimento, incorrendo così nella decadenza del contributo.
Con le risorse resesi disponibili a seguito di scorrimento delle graduatorie, si è dunque proceduto a concedere il contributo alle ditte utilmente collocate e pertanto al 31 dicembre 2022 **le ditte finanziate sono 52** (*una è stata finanziata parzialmente in due graduatorie) **per un totale di € 4.407.171,88**:

STATO DELLA PRATICA	NUMERO DITTE	Contributo CONCESSO	Contributo LIQUIDATO
Ditte che hanno percepito il saldo	**21**	**1.313.302,15**	**1.293.567,38**
A1	10	527.577,41	513.111,73
B1	11	785.724,74	780.455,64
Ditte da liquidare a saldo	**1**	**15.000,00**	**-**
A2	1	15.000,00	-
Ditte che hanno percepito l'acconto	**3**	**372.799,22**	**-**
B1	3	372.799,22	-
Ditte che devono rendicontare	**28**	**2.706.070,51**	**-**
A1	15	1.231.387,93	-
A2	1	90.040,90	-
B1	11	1.196.760,20	-
B2	1	187.881,48	-

STATO DELLA PRATICA	NUMERO DITTE	Contributo CONCESSO	Contributo LIQUIDATO
Totale ditte beneficiarie	**52***	**4.407.171,88**	**1.442.687,07**
Ditte che hanno rinunciato al contributo	**6**	**510.847,66**	**-**
A1	2	208.424,67	-
B1	4	302.422,99	-
Ditte con decreto di decadenza	**5**	**200.711,85**	**-**
A1	2	107.215,37	-
B1	3	93.496,48	-

Fonte dati: USR Umbria

I dati delle concessioni (al netto di rinunce e decadenze) sono stati aggregati in base al Comune in sui ha sede l'intervento nella tabella sottostante:

COMUNE SEDE INTERVENTO	NUMERO IMPRESE	CONTRIBUTO CONCESSO
Arrone	1	25.040,88
Cascia	9	687.886,57
Monteleone di Spoleto	2	56.868,67
Norcia	30	2.295.027,66
Preci	1	10.351,06
Spoleto	9	1.182.554,73
Vallo di Nera	1	149.442,31
Totale complessivo	**53**	**4.407.171,88**

Fonte dati: USR Umbria

Come previsto dal bando, i beneficiari hanno la possibilità di scegliere tra due modalità di erogazione del contributo concesso:

a) a saldo in un'unica soluzione, a seguito della rendicontazione totale delle spese effettivamente sostenute.

b) in due soluzioni attraverso:
- un'anticipazione del 40% del contributo concesso, garantita da fidejussione.
- un'erogazione a saldo, pari al 60% del contributo concesso, a seguito della rendicontazione totale delle spese effettivamente sostenute.

Nella tabella seguente sono riportati i dati al 31 dicembre 2022 relativi alle liquidazioni suddivisi per anno:

STATO DELLA PRATICA	N. DITTE	CONTRIBUTO CONCESSO IN €	LIQUIDATO IN € NEL 2020	LIQUIDATO IN € NEL 2021	LIQUIDATO IN € NEL 2022	TOTALE PAGATO IN €	ECONOMIE IN €
Liquidato a saldo	**21**	1.313.302,15	220.887,49	**605.897,26**	466.782,63	**1.293.567,38**	***19.734,77***
A1	10	527.577,41	-	188.898,94	324.212,79	513.111,73	***14.465,68***
B1	11	785.724,74	44.386,48	403.499,52	332.569,65	780.455,65	***5.269,09***
In corso di liquidazione	**1**	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A2	1	15.000,00	-	-	-	-	-
Liquidato acconto	**3**	**372.799,22**	**51.244,90**	**38.097,87**	**59.776,92**	**149.119,69**	**-**
B1	3	372.799,22	51.244,90	38.097,87	59.776,92	149.119,69	
Da rendicontare	**28**	**2.706.070,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A1	15	1.231.387,93	-	-	-	-	-
A2	1	90.040,90	-	-	-	-	-
B1	11	1.196.760,20	-	-	-	-	-
B2	1	187.881,48	-	-	-	-	-
Totale	**53***	**4.407.171,88**	**95.631,38**	**630.496,33**	**716.559,36**	**1.442.687,07**	***19.734,77***

In ragione della situazione emergenziale connessa alla pandemia da COVID-19 che ha impedito a molte aziende di realizzare i propri progetti nei termini previsti, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in concerto con il Ministero dello Sviluppo economico del 10 agosto 2022, è stato concesso alle imprese già beneficiarie dei contributi, un'ulteriore **proroga per l'ultimazione dei progetti**, elevando così il termine di cui all'art. 9, decreto 10 maggio 2018, ad un massimo di trentatré mesi dalla concessione del contributo. Ne consegue che le ditte che devono ancora portare a termine il proprio progetto di investimento e rendicontare le spese, **potranno ancora farlo nel corso del 2023**.

2.10. Traslochi e depositi temporanei di mobili

L'Ordinanza del Commissario n. 21/2017 disciplina le modalità di riconoscimento di **un contributo massimo di € 1.500,00 per traslochi e/o depositi temporanei di mobili e di suppellettili** in favore dei soggetti, la cui abitazione - in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - sia stata sgomberata per inagibilità totale a seguito di provvedimenti delle autorità competenti sulla base di schede AeDES con esito E o con esito B o C, purché abbia comunque subìto danni gravi (per danni gravi si intendono quelli individuati dalla tabella 1 allegata all'Ordinanza n. 19 del 2017, che risultino documentati dal richiedente e verificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione prima dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico sull'intero edificio).
Nel grafico sottostante vengono riportate le istanze pervenute per i traslochi e depositi negli anni dal 2017 al 2022:

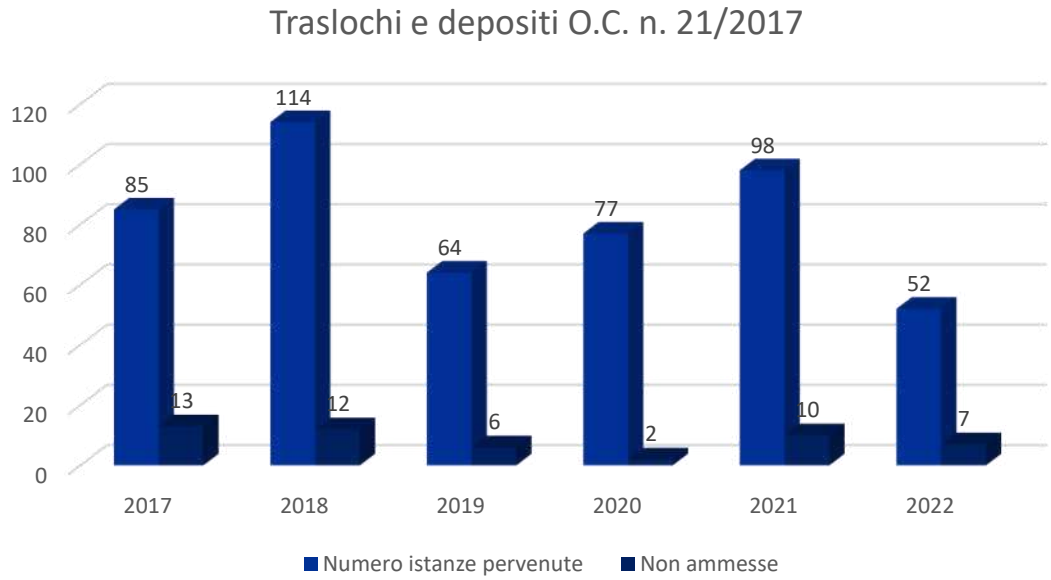

Nella tabella sottostante vengono riportati i contributi concessi dal 2017 al 2022 ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 21/2017:

Anno	Numero istanze traslochi e depositi pervenute	Numero pratiche effettive traslochi e depositi (escluse non ammissibili/annullate)	Contributo concesso in €
2017	85	73	93.832,45
2018	114	102	145.814,30
2019	64	58	82.987,97
2020	77	75	108.245,80
2021	98	86	124.633,00
2022	**59**	**52**	**64.737,40**
Totale	**497**	**446**	**620.250,92**
Fonte dati: USR Umbria - *Sistema gestionale SAVIO al 31 dicembre 2022*			

Infine la situazione riepilogativa delle pratiche e dei **contributi concessi per traslochi e depositi dal 2017 al 2022** nei comuni del cratere e fuori cratere si può evincere dalla seguente tabella:

TRASLOCHI E DEPOSITI DAL 2017 AL 2021											
COMUNE	TOTALE	ANNULLATA	NON AMMISSIBILE	PRATICHE EFFETTIVE	ACC. INVIO NOTA	ASSEGNATA	RICHIESTA INTEGRAZIONE	ISTRUTTORIA	SOSPESA	ATTO EROGAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO IN €
COMUNI CRATERE											
CASCIA	107		1	**106**						106	155.948,30
CERRETO DI SPOLETO	1			**1**						1	1.500,00
FERENTILLO	4			**4**						4	5.551,00
MONTELEONE DI SPOLETO	4			**4**						4	5.664,00
NORCIA	287	1	20	**266**	3		1		1	261	373.930,25
PRECI	7			**7**						7	9.750,00
SELLANO	1			**1**						1	1.500,00
SPOLETO	52		18	**34**						34	44.394,80
COMUNI FUORI CRATERE											
BASTIA UMBRA	1			**1**						1	976,00
BEVAGNA	2		2	=							=
CASTEL RITALDI	1			**1**						1	1.500,00
DERUTA	1			**1**						1	1.500,00
FOLIGNO	9		3	**6**						6	8.148,00
GUALDO CATTANEO	3			**3**						3	4.464,00
MARSCIANO	3		3	-							=
MONTEFALCO	1		1	-							=
NOCERA UMBRA	2			**2**						2	2.461,40
PERUGIA	1		1	-							=
SPELLO	1			**1**						1	1.463,17
TERNI	1			**1**						1	1.500,00
TOTALE	**497**	**1**	**49**	**446**	**3**	=	**1**	=	**1**	**446**	**620.250,92**
Percentuale 98%											
Fonte dati: USR Umbria - *Sistema gestionale SAVIO al 31 dicembre 2022*											

3. Controlli

3.1. Legalità e trasparenza

Il tema della legalità e quello della trasparenza sono centrali nel processo di ricostruzione post- sisma 2016. Questi princìpi non possono essere confusi con un aggravio di burocrazia ma sono la premessa indispensabile per una ricostruzione trasparente che non sia influenzata dalla criminalità organizzata o da fatti di malcostume. Il decreto legge 189 del 2016 prevede al riguardo le seguenti specifiche azioni:

1. Costituzione di una Anagrafe Antimafia in cui tutte le imprese che intendono lavorare per la ricostruzione si debbono iscrivere (articolo 30 del decreto legge n. 189/2016). Trattasi di un ulteriore passo in avanti rispetto alle già sperimentate White List presenti presso le Prefetture in quanto tutte le imprese iscritte sono sottoposte al preventivo controllo antimafia.
2. Norme obbligatorie da inserire nei contratti di appalto anche per la ricostruzione privata per disciplinare sub appalti (articolo 31 del decreto legge n. 189/2016). Per la prima volta vengono introdotti limitazioni al ricorso del sub appalto secondo disposizioni già vigenti per i lavori pubblici.
3. Controllo della Corte dei Conti (articolo 33 del decreto legge n. 189/2016). Pur non essendo obbligatori il legislatore per la ricostruzione dell'Italia Centrale ha previsto il controllo preventivo della Corte dei Conti sugli atti di programmazione ed organizzazione adottati dal Commissario Straordinario. La stessa Corte esercita il controllo sull'attività posta in essere dal Commissario.
4. Qualificazione dei professionisti (articolo 34 del decreto legge n. 189/2016). La ricostruzione privata è un modello privatistico e pertanto è il beneficiario che sceglie il professionista a cui affidare l'incarico per riparare, ripristinare o ricostruire la sua casa danneggiata. Il legislatore ha voluto rendere pubblico l'elenco dei professionisti, che nel rispetto delle competenze, possono assumere incarichi relativi alla ricostruzione privata. La pubblicazione dell'elenco è finalizzata ad agevolare la scelta dei cittadini per l'affidamento degli incarichi a professionisti tra quelli iscritti a tale elenco. Anche per i professionisti che intendono iscriversi nell'Elenco, deve essere assicurato come requisito indispensabile la regolarità contributiva.
5. Regolarità contributiva delle imprese (articolo 30 del decreto legge n. 189/2016). Tra i requisiti per l'iscrizione all'Anagrafe delle imprese è richiesta la regolarità contributiva non solo a carattere generale ma specifica per i vari cantieri della ricostruzione.
6. Tracciabilità dei pagamenti (articolo 31 del decreto legge n. 189/2016). Per assicurare la trasparenza del processo sia le imprese che i professionisti sono obbligati ad assicurare la tracciabilità di tutti i

movimenti in entrata ed in uscita relativi alla ricostruzione post sisma 2016.

7. Tutela dei lavoratori (articolo 35 del decreto legge n. 189/2016). Ci sono disposizioni puntuali volte ad assicurare anche la tutela dei lavoratori impiegati nel processo di ricostruzione.
8. Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (articolo 36 del decreto legge n. 189/2016).
9. Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario Straordinario (articolo 31 del decreto legge n. 189/2016). Il ruolo dell'ANAC sia nella gestione dell'emergenza che nella ricostruzione, appare centrale ed al riguardo è prevista una vigilanza collaborativa nei confronti dei soggetti che per tutti gli affidamenti ed appalti devono preventivamente sottoporsi al controllo ANAC al fine di assicurare piena legalità al processo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 32, del decreto legge n. 189/2016 **l'Unità Operativa Speciale (UOS) dell'ANAC** ha svolto verifiche preventive sulle procedure della ricostruzione pubblica post sisma 2016 in attuazione dell'accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021.
Dall'inizio della collaborazione nel dicembre 2016 fino al 30 giugno 2022, l'Unità operative speciale di ANAC ha verificato un totale di 740 diverse procedure di affidamento per un valore complessivo di oltre 320 milioni di euro, emanando quasi 2.500 pareri (in media due per giorno lavorativo). Nel primo semestre 2022 la UOS ha verificato complessivamente 85 nuove procedure, per quasi 80 milioni di euro di valore a base di gara, adottando complessivi 319 pareri, senza registrare casi di contenzioso.
Dei 319 pareri rilasciati, il 45% ha riguardato la Regione Marche, il 23% il Lazio, il 18,5% l'Abruzzo e il 13,5% l'Umbria:

Distribuzione geografica verifiche ANAC I semestre 2022			
REGIONE	**NUMERO NUOVE PROCEDURE**	**NUMERO PARERI EMESSI**	**VALORE STIMATO OPERE IN €**
ABRUZZO	12	57	6.617.194,01
LAZIO	23	73	21.167.386,31
MARCHE	38	144	31.126.004,57
UMBRIA	12	44	19.088.891,29
Struttura Commissario Ricostruzione		1	
TOTALE	**85**	**319**	**77.999.476,18**

Fonte: Relazione sorveglianza ANAC ricostruzione post sisma - primo semestre 2022

Alla fine del 2022, al fine di rendere I controlli di legalità nella ricostruzione pubblica post sisma 2016 ancora più rapidi ed efficaci, attraverso un accordo

tra ANAC e Commissario Straordinario è stato poi definito **un nuovo sistema, basato su una scheda di autovalutazione degli atti per gli affidamenti diretti e quindi su un maggiore coinvolgimento degli USR e delle Stazioni appaltanti** nella verifica preliminare della documentazione, così da velocizzare ulteriormente i controlli dell'Unità operativa speciale (UOS).
Al fine del controllo della legittimità degli atti e delle procedure degli appalti pubblici e in attuazione del protocollo del 2 febbraio 2021 tra Commissario, Autorità anticorruzione, Regioni e Invitalia, l'USR Umbria fornisce al Presidente ANAC, tramite il proprio referente, per la verifica in via preventiva i seguenti atti:
● schema di determina a contrarre ● bandi di gara/lettere di invito ● disciplinari di gara ● capitolati ● schemi di contratto ● provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice ● atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse ● provvedimenti di aggiudicazione e, riguardo alla fase di esecuzione dei contratti: ● proposte di risoluzione contrattuale e comunicazione dei nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori con riferimento agli appalti di lavori.
Per altri atti e contratti, di importo inferiore alle soglie indicate nel Protocollo, l'**USR Umbria trasmette all'Autorità un report trimestrale**, sottoposto a controlli a campione.
L'introduzione di tutti questi giusti princìpi relativi alla legalità e trasparenza comportano, come detto, una serie di adempimenti, sia nella fase di preparazione preliminare degli atti, nella fase di rilascio dei contributi e nel pagamento dei vari stati di avanzamento con il reiterato controllo da effettuare sui vari soggetti coinvolti in ordine al permanere delle iscrizioni, alle regolarità contributive, etc, che impegnano gli uffici competenti per dare puntuale applicazione alle norme.
Sempre nell'ambito della legalità, il 4 marzo 2022, inoltre, l'USR Umbria ha sottoscritto il **protocollo di legalità della Prefettura di Terni 'per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare nella ricostruzione post sisma'** ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 229/2016 di conversion del decreto legge n. 189/2016.
Analogo protocollo era stato sottoscritto nell'ottobre 2021 con la Prefettura di Perugia con l'obiettivo di prevenire fenomeni come il lavoro nero, il dumping contrattuale, la concorrenza sleale, l'evasione contributiva e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Infine, per quanto riguarda l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, l'USR Umbria provvede ad effettuare anche verifiche durante il corso dei lavori, al fine di monitorare il rispetto delle previsioni di cronoprogramma previste in progetto e la coerenza degli interventi autorizzati, in relazione al danno subito a causa del sisma.
Per i controlli relativi alla ricostruzione privata l'USR Umbria dal 2021 ha previsto nel proprio organigramma una apposita sezione che provvede alle verifiche ai controlli sugli interventi oggetto di contributo, così come previsto dal decreto legge n. 189/2016, con particolare riferimento a quanto disposto all'articolo 12 dell'ordinanza commissariale n. 100/2020.

3.2. I controlli dell'USR - Umbria

Con l'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 100/2020 gli USR, in base all'articolo 12 della medesima ordinanza, devono eseguire dei **controlli a campione sulle istanze presentate** sia di natura preventiva che successiva alla concessione dei contributi.
L'USR-Umbria, a tal fine, si è organizzato fin da subito per lo svolgimento di tale adempimento normativo predisponendo un apposito software e un primo regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 1632 del 12 agosto 2020.
L'evoluzione normativa e il nuovo assetto dell'USR Umbria hanno portato a far adottare un ulteriore regolamento approvato con determinazione direttoriale n. 2213 del 29 settembre 2021.
Il nuovo assetto dell'USR ha introdotto dall'agosto 2021 una **nuova sezione all'interno del Servizio Ricostruzione Privata** denominata "Controlli" dedicata, tra le altre cose, all'attività di estrazione per il controllo a campione e per lo svolgimento dei controlli in corso d'opera o a fine lavori.
Con l'ordinanza del Vice Commissario n. 3/2022 la sezione "Controlli" ha assunto la **denominazione "Controlli e Programmi Straordinari Ricostruzione"** mantenendo la finalità di assicurare il corretto espletamento dei controlli a campione in virtù delle specifiche competenze e qualità di ufficio di riferimento sul territorio per le attività di ricostruzione.

I controlli, determinati sulla base delle percentuali previste dall'articolo 12, commi 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 100/2020, **riguardano il 20% delle domande di concessione del contributo** presentate dai professionisti abilitati (attività svolta normalmente con cadenza mensile determinata anche in rapporto delle istanze ricevute), **il 10% dei decreti di concessione dei contributi** adottati nel mese precedente e **il 10% delle comunicazioni di fine lavori** sempre pervenute nel mese precedente alla data di estrazione.
Il controllo sulle pratiche estratte riguarda anche la documentazione in materia sismica nel rispetto dell'art. 208 c. 4 della L.R. n. 1/2015 e il campione del controllo è determinato in misura del **5% delle istanze presentate** con preavviso scritto e deposito e un campione pari al **5% delle istanze presentate** con richiesta di autorizzazione sismica come previsto dalla D.G.R. n. 596/2020.
Nel 2022 sono state estratte a campione **75 istanze per il controllo preventivo**, di cui **27 istanze per il controllo sismico**; **43 istanze per il controllo su decreti di concessione; 16 istanze** per il controllo successivo alla **fine lavori**.
Nella tabella esemplificativa seguente vengono evidenziati i dati relativi ai controlli dell'USR-Umbria alla data del 31 dicembre 2022:

2022	Numero istanze estraibili a controllo preventivo	Numero istanze estratte a controllo preventivo	Numero istanze estratte a controllo sismico su istanze estratte a controllo preventivo	Numero decreti adottati	Numero decreti estratti a controllo	Numero istanze estraibili a controllo dopo fine lavori	Numero istanze estratte a controllo dopo fine lavori
Gennaio	67	14	5	35	4	7	1
Febbraio	28	7	2	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	67	7	11	2
Aprile	31	7	2	53	6	6	1
Maggio	27	6	2	21	3	5	1
Giugno	12	3	2	31	4	7	1
Luglio	22	5	2	27	3	8	1
Agosto	23	5	2	21	3	4	1
Settembre	24	5	2	37	4	8	1
Ottobre	28	6	2	21	3	28	3
Novembre	45	9	3	25	3	15	2
Dicembre	40	8	3	26	3	14	2
Totale	**347**	**75**	**27**	**364**	**43**	**113**	**16**

Fonte dati: USR Umbria al 31 dicembre 2022

Passando all'analisi dei dati si evidenzia che **il numero delle istanze sottoposte a campione è superiore al 20%** del complessivo delle istanze pervenute, a causa degli arrotondamenti all'intero superiore del numero di istanze estratte nelle singole estrazioni.
Dai controlli preventivi atti a verificare la presenza dei necessari presupposti per la concessione dei contributi, la correttezza di quanto asseverato da parte dei tecnici privati nella richiesta di concessione di contributo e la congruenza tra l'importo del contributo richiesto e l'intervento di ristrutturazione e/o ricostruzione proposto, **non sono emerse situazioni di inammissibilità delle**

istanze, seppur **in taluni casi è risultato necessario produrre integrazioni documentali e comunque di carattere non sostanziali**.
I controlli sui decreti, svolti con le medesime finalità, allo stato attuale, **non hanno evidenziato situazioni di inammissibilità**. Il controllo, in questo caso è continuativo per tutta la durata del cantiere e si esaurisce con la liquidazione del saldo.
Si ricorda che qualora dalle verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi non corrispondano a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, è previsto l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi nonché la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
Come anticipato in precedenza **dal mese di agosto 2021 è stata avviata anche l'attività di controllo in cantiere**, sia in corso d'opera che a fine lavori.
Alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati dal personale USR – Umbria controlli sulle istanze estratte a controllo sismico e **18 sopralluoghi in corso d'opera di pratiche estratte a campione dopo il decreto di concessione e di 16 istanze per le quali è pervenuta la comunicazione di fine lavori**.
In alcuni casi sono state riscontrate lievissime differenze rientranti nella sfera di competenza del direttore dei lavori e comunque mai incidenti sui contributi concessi, come anche disciplinato dal comma 5, articolo 12 dell'ordinanza commissariale n. 100/2020.

4. Centri urbani e frazioni

4.1. Perimetrazioni dei centri e nuclei gravemente danneggiati

2017

La ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 2016 oltre a prevedere le modalità di ricostruzione, nel caso dei danni lievi e dei danni gravi, prevede anche specifiche indicazioni per il recupero dei centri e nuclei gravemente danneggiati in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legge n. 189/2016.

Il **Comitato tecnico scientifico**, nominato a supporto dell'attività del Commissario con ordinanza n. 11/2017, ha formulato i criteri e gli indirizzi per consentire alle Regioni di individuare e perimetrare i centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dagli eventi sismici.

Detti criteri sono stati approvati dal **Commissario Straordinario** con **ordinanza n. 25/2017** e successivamente, con **l'ordinanza n. 39/2017** sono stati approvati i principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici fornendo ulteriori indicazioni sul processo di partecipazione da parte dei comuni interessati al procedimento di perimetrazione, inizialmente non previste.

L'**Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria**, ai fini della perimetrazione, **ha valutato nel dettaglio la situazione del livello di danneggiamento** nei centri di San Pellegrino, Castelluccio, Campi Alto, Nottoria, Capo del Colle, Piè del Colle, Piè la Rocca, S. Angelo nel Comune di Norcia; nei centri di Valle, Acquaro, Collescille, Todiano, Abeto, Castelvecchio, Piedivalle, Roccanolfi, Saccovescio, nel comune di Preci e nei centri di Avendita, Colle di Avendita, Maltignano nel Comune di Cascia.

In data 30 ottobre 2017 sono stati **pubblicati dall'USR - Umbria gli esiti dell'istruttoria** relativa al procedimento di perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 al fine renderlo conoscibile dalla popolazione coinvolta.

La proposta di perimetrazione ha interessato nel **Comune di Norcia** i seguenti centri: **Nottoria, Castelluccio, Ancarano** (Capo del Colle, Piè la Rocca, Piè del Colle, S. Angelo), **San Pellegrino, Campi Alto**.

Nel **Comune di Preci** sono stati interessati i centri di **Acquaro, Valle** e **Collescille**.

2018

I decreti del Vice – Commissario relativi alla approvazione definitiva delle perimetrazioni (DVC nn. 16/2018, 19/2018, 27/2018 e 28/2018), unitamente alla quantificazione delle risorse necessarie per gli incarichi professionali esterni per la redazione dei piani attuativi dei centri perimetrati **sono stati notificati ai Comuni interessati e al Commissario straordinario** per la ricostruzione per gli adempimenti di competenza.
Il Commissario straordinario per la ricostruzione con propri decreti nn.124 e 125 del 4 giugno 2018 ha stanziato e trasferito all'USR Umbria le **risorse per l'affidamento degli incarichi professionali** per la pianificazione attuativa dei centri perimetrati per un totale di € 496.846,40 (di cui € 67.901,08 per il Comune di Preci ed € 428.945,32 per il Comune di Norcia).
Conseguentemente l'USR-Umbria ha invitato ai Comuni di Norcia e Preci a procedere ai sensi dell'art.10, c. 2 dell'O.C. n. 39/2017 alla redazione dei piani attuativi con incarichi da affidare a cura del Comune a soggetti di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con le procedure previste all'art. 24 del medesimo decreto, avvalendosi di professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016.
Il 5 settembre 2018 il Comune di Norcia ha pubblicato l'avviso per "la manifestazione di interesse e contestuale presentazione dell'offerta per l'**affidamento di incarichi** per la **redazione di piani attuativi** relativi alle frazioni di Campi Alto, Nottoria, Ancarano Sant'Angelo, Ancarano Pie' la Rocca, Ancarano Capo del Colle, Ancarano Pie' del Colle".
L'affidamento degli incarichi è stato perfezionato nel mese di novembre sia dal comune di Norcia (determinazioni n. 89/2018, n. 90/2018, n. 91/2018, n. 92/2018, n. 93/2018, n. 94/2018) che dal comune di Preci (determinazioni n. 1072/2018, n. 1073/2018, n.1074/2018).

2019

L'affidamento dell'incarico per la redazione del PUA **di S. Pellegrino di Norcia** è avvenuto con determinazione dirigenziale n. 58 del 3 settembre 2019. Il centro di Castelluccio di Norcia è oggetto di variante urbanistica a PIR-PUA vigente affidata con determinazioni dirigenziali n. 66 e 67 del 3 settembre 2019.

2020

Nel mese di dicembre 2020 i piani attuativi del Comune di Norcia Campi Alto, Nottoria, Ancarano Sant'Angelo, Ancarano Pie' la Rocca, Ancarano Capo del Colle, Ancarano Pie' del Colle sono stati approvati in sede di conferenza permanente.

2021

Per San Pellegrino si è proceduto all'approvazione dei piani attuativi da parte della Conferenza Permanente ex art. 16 DL n. 189/2016 il 21 luglio 2021. Il **Piano attuativo del Centro di Castelluccio** è stato invece adottato con delibera del Consiglio comunale n. 38 del 2 agosto 2021 ed è stato approvato nella conferenza permanente del 30 dicembre 2021.

2022

Il 13 maggio 2022, nel corso di una iniziativa pubblica, viene consegnato ai committenti il **primo decreto di ricostruzione privata** situato all'interno del **piano attuativo di Castelluccio**, frazione del comune di Norcia.

Parte la ricostruzione anche all'interno della perimetrazione del **piano attuativo di Ancarano (Capo del Colle):** il 14 ottobre 2022, nel corso di una iniziativa pubblica, viene consegnato il primo decreto di contributo per la ricostruzione di un immobile danneggiato gravemente dal sisma del 2016.

Si può dire che nel 2022 la ricostruizone dei centri urbani e delle frazioni dei comuni del cratere maggiormente colpite dagli eventi sismici del 2016 (Cascia, Norcia e Preci) **è ormai partita** ed è al centro di un sistema integrato di politiche volte non solo a ripristinare le normali condizioni di vita delle comunità colpite ma anche a garantire il raggiungimento di livelli più elevati di sicurezza sismica ed efficienza energentica del tessuto edilizio.

Come vedremo, la perimentrazione dei centri e nuclei maggiormente danneggiati, i programmi straordinari di ricostruzione, le microzonazioni sismiche, il piano delle opere pubbliche, le ordinanze speciali contengono in sè misure non solo volte alla ricostruzione di questi luoghi ma anche alla loro rivitalizzazione e a frenare lo spopolamento salvaguardando l'identità e le specificità dei luoghi.

4.2. Programmi Straordinari di ricostruzione

I Programmi Straordinari di Ricostruzione (P.S.R.) sono stati introdotti dal primo comma dell'art. 3 bis del decreto legge n. 123-2019, inizialmente allo scopo di accelerare la ricostruzione di interventi 'conformi' ai preesistenti, anche in deroga ai vigenti piani e regolamenti urbanistici. In seguito all'emanazione del decreto legge 'semplificazioni' n. 76/2020, che ha assunto tali deroghe quale norma generale per la ricostruzione modificando l'art. 12, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, il Commissario straordinario, con l'ordinanza n. 107/2020 – e le linee guida allegate – ha introdotto **importanti elementi di novità** delineando con precisione obiettivi, contenuti, e procedure formative di tali importanti strumenti di programmazione.

Cascia

Con **decreto n. 6 del 29 dicembre 2022 del Vice Commissario alla Ricostruzione - Presidente della Regione Umbria** è stato approvato il Programma Straordinario del Comune di Cascia. L'atto, predisposto dall'**Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria**, su proposta del comune di Cascia, è rivolto principalmente agli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici prioritari, sia del capoluogo che di alcune principali frazioni del territorio e tende ad indirizzare l'attenzione verso attività di **adeguamento e miglioramento dei contesti urbanizzati**, mediante interventi su temi strategici quali accessibilità ai servizi primari, viabilità, sottoservizi a rete, interventi su strutture pubbliche esistenti, al fine di definire la migliore programmazione degli interventi del patrimonio edilizio pubblico in connessione con gli interventi per la ricostruzione degli edifici privati.
Il P.S.R. di Cascia ha dato quindi una **lettura integrata tra tutti gli interventi di ricostruzione**, sia pubblica che privata, al fine di **ottimizzare tempi** e risorse. Particolare attenzione è stata posta alla rifunzionalizzazione dei servizi essenziali relativi alla ricostruzione del polo scolastico e dell'ospedale oltre che delle necessarie infrastrutture di supporto come parcheggi e viabilità, fondamentali per l'accesso a questi nuovi edifici pubblici di primaria importanza. Per gli interventi sopra esposti e contenuti nella citata proposta di PSR il Commissario straordinario ha emanato apposita ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione nel comune di Cascia".
Inoltre il P.S.R. di Cascia propone una nuova **lettura funzionale di viale Cavour**, quale **asse principale di accesso** al capoluogo, tramite una serie di interventi puntuali di rigenerazione urbana, di parti delle infrastrutture del capoluogo e interventi su alcune **frazioni particolarmente danneggiate** dagli eventi sismici 2016 (ad esempio Avendita, Colle di Avendita, Maltignano, etc...) al fine di garantire una rapida ricostruzione migliorando contestualmente la qualità e la vivibilità delle frazioni stesse.

Norcia

Con **decreto n. 3 del 7 aprile 2021 del Vice Commissario alla Ricostruzione – Presidente della Regione Umbria** è stato approvato il Primo Programma Straordinario del Comune di Norcia (PSR). L'atto, predisposto dall'**Ufficio Speciale Ricostruzione** su proposta del comune nursino, è uno strumento di natura programmatica e di indirizzo che consente di accelerare il processo di ricostruzione in tutto il territorio comunale di Norcia, compreso nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica con particolare riferimento agli edifici con danni gravi per i quali è richiesta la demolizione e ricostruzione.
A tal fine il P.S.R. classifica il territorio comunale in **tre distinti ambiti territoriali in base al grado di tutela paesaggistica** cui è sottoposto e, per ogni ambito, emana indirizzi per la modifica dell'ingombro planivolumetrico degli edifici esistenti (sagoma, sedime e prospetti).
Il P.S.R. di Norcia, nato da una stretta condivisione con la Struttura del Commissario e la competente Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal sisma, riduce la burocrazia e consente di **'conservare' e 'innovare'** nello stesso tempo.
Dalla sua approvazione questo strumento ha consentito una significativa accelerazione del processo di ricostruzione grazie ad una organica lettura del quadro normativo di riferimento.

Preci

Con **decreto n. 7 del 29 dicembre 2022 del Vice Commissario alla Ricostruzione – Presidente della Regione Umbria** è stato approvato il Programma Straordinario del Comune di Preci. L'atto, predisposto dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, su proposta del comune di Preci analizza esigenze, potenzialità e criticità per una corretta ricostruzione post sisma 2016 completa di una **visione integrata e sostenibile** con gli edifici pubblici, le infrastrutture e i sottoservizi. Le tematiche trattate all'interno del P.S.R., in particolare, riguardano i seguenti aspetti:

- analisi delle criticità ed individuazione delle soluzioni per la ricostruzione di Preci capoluogo;
- valutazione sulla necessità di perimetrare gli immobili da ricostruire in aggregati edilizi attraverso delibera di consiglio comunale;
- analisi della cantierabilità al fine di ridurre i disagi alla popolazione e consentire una veloce ricostruzione riducendo così le interferenze tra i vari cantieri anche attraverso l'individuazione delle aree pubbliche da utilizzare per lo stoccaggio dei materiali vista la particolare conformazione urbanistica dell'abitato di Preci e di alcune frazioni;
- individuazione delle eventuali aree per le delocalizzazioni di alcune unità strutturali ricadenti in ambiti a rischio geologico e soluzioni per il recupero delle aree lasciate libere dagli immobili delocalizzati;
- censimento puntuale delle opere pubbliche con l'eventuale individuazione di nuovi edifici strategici funzionali al piano di protezione civile comunale.

4.3. Microzonazioni sismiche

2017

Con l'ordinanza del commissario del 12 maggio 2017 n. 24 si è stabilito che i Comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016 dovevano essere dotati di studi di microzonazione sismica di livello 3 da utilizzare per la pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal sisma, come definiti dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Con successiva ordinanza del commissario n. 55, art. 5: "Modifiche all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017", sono stati approvati i "Criteri generali per l'utilizzo dei risultati degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016".
Il Centro di Microzonazione Sismica per tutti i 15 comuni umbri del cratere ha espletato la verifica della rispondenza degli studi secondo gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

2018

La Regione Umbria con propria deliberazione del 4 aprile 2018, n. 298 ha provveduto ad adottare gli studi di microzonazione sismica di livello 3 per il loro utilizzo per la pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal sisma dei comuni di: Cerreto di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Scheggino, Sellano, Spoleto, Vallo di Nera.
Successivamente con deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2018, n. 764 sono stati adottati sei **studi di microzonazione sismica** di livello 3 di cui all’Ordinanza del Commissario n. 24 del 12 maggio 2017 relativi ai comuni di Cascia, Monteleone di Spoleto, Montefranco, Arrone, Ferentillo, Sant’Anatolia di Narco.
Va precisato che con la sopracitata delibera di giunta regionale n. 298/2018 sono stati altresì adottati i criteri generali per l’utilizzo dei risultati degli studi di microzonazione sismica di livello 3 e contestualmente **approvate le indicazioni sul corretto utilizzo degli studi di microzonazione sismica di livello 3**.
Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica, nella sola Regione Umbria, sono stati assegnati ai 15 Comuni, € 380.600,00 (IVA compresa), a valere sul finanziamento di € 6.500.000,00 disposto dall’articolo 1 del decreto legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189/2016.
Nella Regione Umbria, il finanziamento di € 380.600,00 è stato ripartito tra i Comuni sulla base dei criteri previsti dall’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, come indicato nella seguente tabella:

PROGRESSIVO	COMUNE	FINANZIAMENTO AI COMUNI IN €	TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO
1	ARRONE	28.100,00	b)
2	CASCIA	28.100,00	b)
3	CERRETO DI SPOLETO	22.500,00	b)
4	FERENTILLO	22.500,00	b)
5	MONTEFRANCO	22.500,00	b)
6	MONTELEONE DI SPOLETO	22.500,00	b)
7	NORCIA	28.100,00	b)
8	POGGIODOMO	22.500,00	b)
9	POLINO	22.500,00	b)
10	PRECI	22.500,00	b)
11	SANT'ANATOLIA DI NARCO	22.500,00	b)
12	SCHEGGINO	22.500,00	b)
13	SELLANO	22.500,00	b)
14	SPOLETO	48.800,00	b)
15	VALLO DI NERA	22.500,00	b)
	TOTALE €	380.600,00	

La tipologia di affidamento degli incarichi di redazione degli studi di microzonazione ha tenuto conto di attività simili già in corso in alcuni Comuni e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione di I livello, predisposti con precedenti finanziamenti di diversa natura.

2019

Con l'ordinanza commissariale n. 79, registrata in data 12 agosto 2019 al numero 1719, è stata disposta l'assegnazione dei **finanziamenti per** i centri di **Collescille** (Preci), **Cascia** capoluogo e **Nottoria** (Norcia) per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017.
Con l' ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019 il Commissario Straordinario ha inoltre disposto **approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci**, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio 2017 da condursi in Umbria nei **Comuni di Norcia e di Preci**.
Con la stessa ordinanza è stato istituito l'elenco speciale degli operatori che si

occuperanno dello studio delle faglie attive e capaci (FAC).

2021

Nel gennaio 2021 **sono stati pubblicati gli esiti degli studi previsti** con l'ordinanza commissariale n. 79/2019 relativa agli "approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017".
Per la Regione Umbria le aree oggetto di approfondimento sono state **Collescille** (Preci), **Cascia** capoluogo e **Nottoria** (Norcia).
In seguito, l'ordinanza commissariale n. 119/2021, inerente la "disciplina degli interventi in aree interessate da **Faglie Attive e Capaci** e da altri dissesti idro-geomorfologici", ha introdotto con l'articolo 2 la "disciplina della ricostruzione in aree interessate da FAC" con particolare riferimento alla tipologia di interventi di ricostruzione consentiti o meno, nelle zone di attenzione, di suscettibilità e di rispetto. Inoltre, l'ordinanza n. 119/2021 ha apportato la sostituzione dell'art. 22 dell'ordinanza commissariale n. 19/2017, riguardante gli edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici e rivisto la parte relativa all'acquisto di edificio equivalente, introducendo l'articolo 22-bis.
Analogamente, anche per gli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza commissariale n. 13/2017, ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici, è stato sostituito l'articolo 14-bis della citata ordinanza.
Con l'allegato 4 dell'ordinanza n. 119/2021 è stato definito e sottoscritto l'accordo di collaborazione scientifica per "l'aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e capaci FAC tra Commissario straordinario e INGV".
Con decreto n. 391 del settembre 2021 è stata approvata la Fase 2 di approfondimento e sottoscritto l'accordo di collaborazione scientifica tra il Commissario straordinario e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per l' "aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e capaci (FAC)", con particolare riferimento alla Fase 3 di studio.
Altro decreto di rilievo per gli aspetti legati alle FAC è dato dal decreto n.509 dell'ottobre 2021, avente ad oggetto "ordinanza n.119 del 8 settembre 2021- art. 2 comma 1 – Disciplina della ricostruzione in aree interessate da FAC - Zone di attenzione (ZA) assimilate a ZS (Zone di Suscettibilità)", con il quale si prende atto delle indicazioni integrative, rimesse con parere della Commissione Paritetica INGV ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 119/2021, secondo cui "Le ZA definite nella Fase 2 possono essere temporaneamente assimilate a ZS (Zone di Suscettibilità) fino a quando i risultati attesi nella Fase 3 non saranno disponibili in maniera definitiva (…omissis…) e che si può applicare la conseguente disciplina d'uso di cui alle Linee Guida FAC integrate secondo quanto stabilito ai commi 2 e successivi dell'art. 2 dell'Ordinanza 119/2021.
Infine con decreto n. 626 del dicembre 2021 è stato rivisto e approvato l'ex allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 119/2021, concernente le "Linee

guida per l'affidamento e lo svolgimento degli studi di approfondimento delle aree caratterizzate da instabilità e definizione della procedura relativa alla valutazione costi-benefici", di cui agli artt. 4 e 5 della stessa ordinanza.

2022

Elemento di rilievo caratterizzante il 2022 è la **conclusione degli studi sulle faglie attive e capaci per il Comune di Norcia**.

In particolare con il decreto del Commissario Straordinario n.391 del 22 agosto 2022, che richiama l'accordo di collaborazione scientifica per "l'aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito delle analisi paleosismologiche e degli approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e capaci (FAC) nel Comune di Norcia (PG)", tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario del Governo, e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia del 25 febbraio 2022, vengono recepiti e pubblicati gli esiti degli studi sulle faglie attive a capaci (Fase 3 – lotto 1) del Comune di Norcia.

In sostanza **sono stati definiti nuovi lineamenti tettonici e revisionate le tracce delle FAC e delle Zone di FAC riportate nella cartografia** di Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Norcia, a seguito dei rilievi geologici di campagna e delle nuove indagini geofisiche realizzate nella Fase 2 e, soprattutto grazie alla campagna di indagini paleosismologiche realizzate nella Fase 3.

Tutte le FAC investigate hanno mostrato evidenze di attività tettonica recente.

Per l'area di Norcia capoluogo nello specifico sono state così definite delle FAC certe (FAC_a), sia sintetiche che antitetiche rispetto alla faglia principale a monte, in corrispondenza delle quali sono state costruite Zone di Rispetto (ZR), con un buffer asimmetrico di 30 metri corrispondente a 6 metri nel blocco di letto e 24 metri nel blocco di tetto.

Sempre nel Comune di **Norcia**, per le località di Piè la Rocca e Capo del Colle, nuclei di **Ancarano**, è stata aggiunta la traccia di una FAC certa (FAC_a) sulla quale è stata costruita Zone di Rispetto (ZR), con un buffer asimmetrico di 30 metri corrispondente a 6 metri nel blocco di letto e 24 metri nel blocco di tetto.

Infine, nella località di **Campi** è stata ridefinita e integrata la traccia di una FAC certa (FAC_a) sulla quale è stata costruita Zone di Rispetto (ZR), con un buffer asimmetrico di 30 metri corrispondente a 6 metri nel blocco di letto e 24 metri nel blocco di tetto.

Con la pubblicazione degli studi sulle FAC viene così resa applicabile la "Disciplina della ricostruzione in aree interessate da FAC" di cui all'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 119 dell'8 settembre 2021.

NORCIA
SAVELLI
loc. S. MICHELANGELO
16.12.2016

5. Ricostruzione pubblica

5.1. La ricostruzione pubblica in sintesi

Il decreto Legge n. 189/2016 ha disposto il **finanziamento della ricostruzione pubblica** attraverso la concessione di contributi a favore degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, degli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale.
Come è noto, a differenza della ricostruzione privata, che risulta interamente finanziata attraverso il meccanismo del credito d'imposta, quella pubblica è finanziata direttamente da **fondi statali inseriti nel bilancio annuale e pluriennale**. Al momento le risorse assegnate al Commissario Straordinario coprono solo in parte le esigenze di recupero complessivo del patrimonio pubblico danneggiato dagli eventi sismici del 2016-2017. I contributi sono erogati in via diretta, secondo i criteri e le modalità attuative definite dal Commissario straordinario con propri provvedimenti, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Al Commissario, inoltre, sono attribuiti ampi poteri di programmazione, da esercitare con ordinanze.
A tal fine, i principali provvedimenti emessi in materia di opere pubbliche e di beni culturali sono riepilogabili con l'**ordinanza commissariale n. 105/2020** attinente le **chiese** e con l'**ordinanza commissariale n. 109/2020** che ha attuato una ricognizione generale degli **interventi pubblici** già finanziati, al fine di costituire un elenco unico delle opere pubbliche, sostitutivo ed integrativo dei piani e dei programmi già approvati. Inoltre, sempre con l'ordinanza n. 109/2020, è stata data attuazione alle norme di semplificazione degli appalti contenute negli ultimi provvedimenti normativi.
Per la Regione Umbria, nello specifico:

1) l'**ordinanza commissariale n. 105/2020**, riguardante il **piano chiese**, prevede lo stanziamento di ulteriori € 40 milioni per 82 interventi, che vanno ad aggiungersi ai 55 interventi per € 31.760.588,85 già finanziati per le Diocesi e il F.E.C. con le ordinanze commissariali nn. 23/2017, 32/2017 e 38/2017, per un totale complessivo di € 71.760.588,85 poi sostanzialmente ricompreso negli elenchi di cui al decreto commissariale n. 395/2020.

2) l'**ordinanza commissariale n. 109/2020** – con alcuni interventi poi confluiti nelle ordinanze speciali del sub commissario alla ricostruzione – riguardante le **opere pubbliche** attraverso l'approvazione dell'elenco unico di rimodulazione degli importi degli interventi già finanziati con le ordinanze commissariali nn. 27/2017, 33/2017, 56/2018, 64/2018, 86/2019, per un totale complessivo di € 145.606.026,24.
3) l'**ordinanza commissariale n. 129/2022** riguardante l'approvazione del **programma straordinario di rigenerazione urbana** per € 51.705.583,00 e il nuovo piano di ricostruzione delle altre opere pubbliche per € 67.257.875,00;
4) l'**ordinanza commissariale n. 132/2022** riguardante l'approvazione dei **nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi**;

Inoltre, con l'**ordinanza commissariale n. 110** del 21 novembre 2020 sono state disciplinate le **ordinanze speciali** stabilendo che le stesse devono indicare 'le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi', la copertura finanziaria, il soggetto attuatore, le relative modalità di realizzazione degli interventi, il cronoprogramma e i sub-commissario competenti.

Per la Regione Umbria, nello specifico, le ordinanze speciali riguardano:

1) l'ordinanza speciale **n. 10/2021**: **ricostruzione** dell'**abbazia di Sant'Eutizio** nel Comune di Preci ed altri interventi;
2) l'ordinanza speciale **n. 11/2021**: interventi di ricostruzione delle **scuole** e del **municipio del Comune di Norcia**;
3) l'ordinanza speciale **n. 12/2021**: **interventi di ricostruzione** nel **comune di Cascia**;
4) l'ordinanza speciale **n. 18/2021**: **interventi di ricostruzione** del sentro storico di **Castelluccio di Norcia**;
5) l'ordinanza speciale n. **27/2021**: interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di **immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio** dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
6) l'ordinanza speciale **n. 31/2021**: programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle **strutture scolastiche** dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
7) l'ordinanza speciale **n. 39/2022**: interventi di ricostruzione nel **Comune di Preci**;
8) l'ordinanza speciale **n. 43/2022**, "Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione **di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino**".

Il riepilogo complessivo delle **opere pubbliche finanziate** per la Regione Umbria – ricomprendendo anche i proventi degli sms solidali di cui all'ordinanza commissariale n. 48/2018 – consta complessivamente di 438 interventi, per un importo complessivo stanziato di € 706.138.890,14, così ripartiti:

Descrizione	Interventi	Importo in €
Ordinanza Commissariale n. 109/2020 Opere Pubbliche	144	145.606.026,24
Ordinanza Commissariale n. 129/2022 Nuovo Piano OOPP	98	67.257.875,00
Ordinanza Commissariale n. 129/2022 Rigenerazione Urbana	55	51.705.583,00
Ordinanza Commissariale n. 48/2018 SMS Solidali	9	4.818.296,76
Ordinanza Speciale n. 10/2021 (Preci)	7	12.322.918,91
Ordinanza Speciale n. 11/2021 (Norcia)	10	52.937.870,83
Ordinanza Speciale n. 12/2021 (Cascia)	5	21.432.158,39
Ordinanza Speciale n. 18/2021 (Castelluccio di Norcia)	8	22.621.807,00
Ordinanza Speciale n. 27/2021 (Agenzia del Demanio)	8	4.491.000,00
Ordinanza Speciale n. 31/2021 (Nuovo Piano Scuole)	59	245.769.950,50
Ordinanza Speciale n. 39/2022 (Preci)	25	34.132.793,51
Ordinanza Speciale n. 43/2022 (Castelluccio, Campi Alto e San Pellegrino)	10	43.042.610,00
TOTALE	**438**	**706.138.890,14**

Nel grafico che segue viene riportata la percentuale della ripartizione dei finanziamenti stanziati per le opere pubbliche della Regione Umbria al 31 dicembre 2022, ripartito per le singole ordinanze commissariali e speciali:

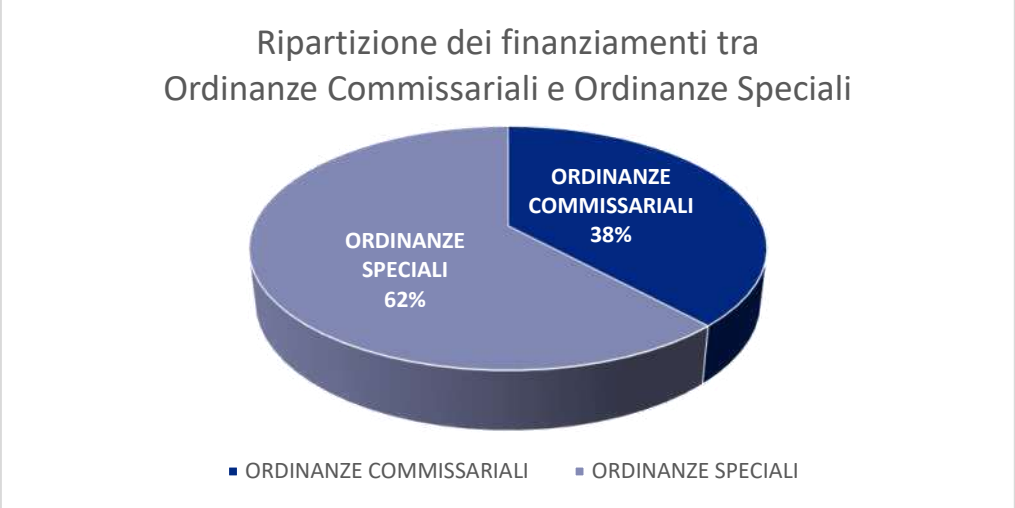

Per quanto riguarda, invece, gli **edifici di culto** con la recente ordinanza Commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" è stato modificato l'allegato 1 dell'O.C. 105/2020 così come rivisto con decreto commissariale n.395/2020. Inoltre, con l'allegato 3 è stato approvato il nuovo piano degli edifici di culto di proprietà di Diocesi ed Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Con la citata ordinanza **si è inteso completare il quadro complessivo del danno riferito agli edifici di culto** i cui **soggetti attuatori** sono le **Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti**, tenuto conto non solo della precedente programmazione (ordinanza commissariale n. 105/2020 rivista con decreto commissariale n. 395/2020), ora aggiornata anche alla luce del necessario adeguamento degli importi degli interventi all'attuale situazione economica e di costo delle materie prime, ma anche della nuova programmazione scaturita dal complesso lavoro di censimento realizzato dalla struttura commissariale con le Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti per mezzo della CEI.

Nella tabella che segue, è riportata la ripartizione degli interventi e delle risorse su base regionale:

	PROGRAMMAZIONE ALL. 1 ORD. 132/2022		PROGRAMMAZIONE ALL. 3 OC N. 132/2022		PRGRAMMAZIONE TOTALE EDIFICI DI CULTO	
REGIONE	INTERVENTI	IMPORTO IN € PROGRAMMATO	INTERVENTI	IMPORTO IN € PROGRAMMATO	INTERVENTI	IMPORTO IN € PROGRAMMATO
ABRUZZO	114	51.139.749,53	95	82.771.243,01	209	133.910.992,54
LAZIO	118	71.318.222,74	24	9.877.500,00	142	81.195.722,74
MARCHE	536	331.955.627,17	158	69.460.585,27	694	401.416.212,44
UMBRIA	**142**	**104.317.155,44**	**64**	**32.177.206,00**	**206**	**136.494.361,44**
Totale	**910**	**558.730.754,88**	**341**	**194.286.534,28**	**1251**	**753.017.289,16**

Per quanto riguarda lo stato di attuazione degli interventi di cui all'allegato 1 del decreto del Commissario n. 395/2020, la situazione è la seguente:

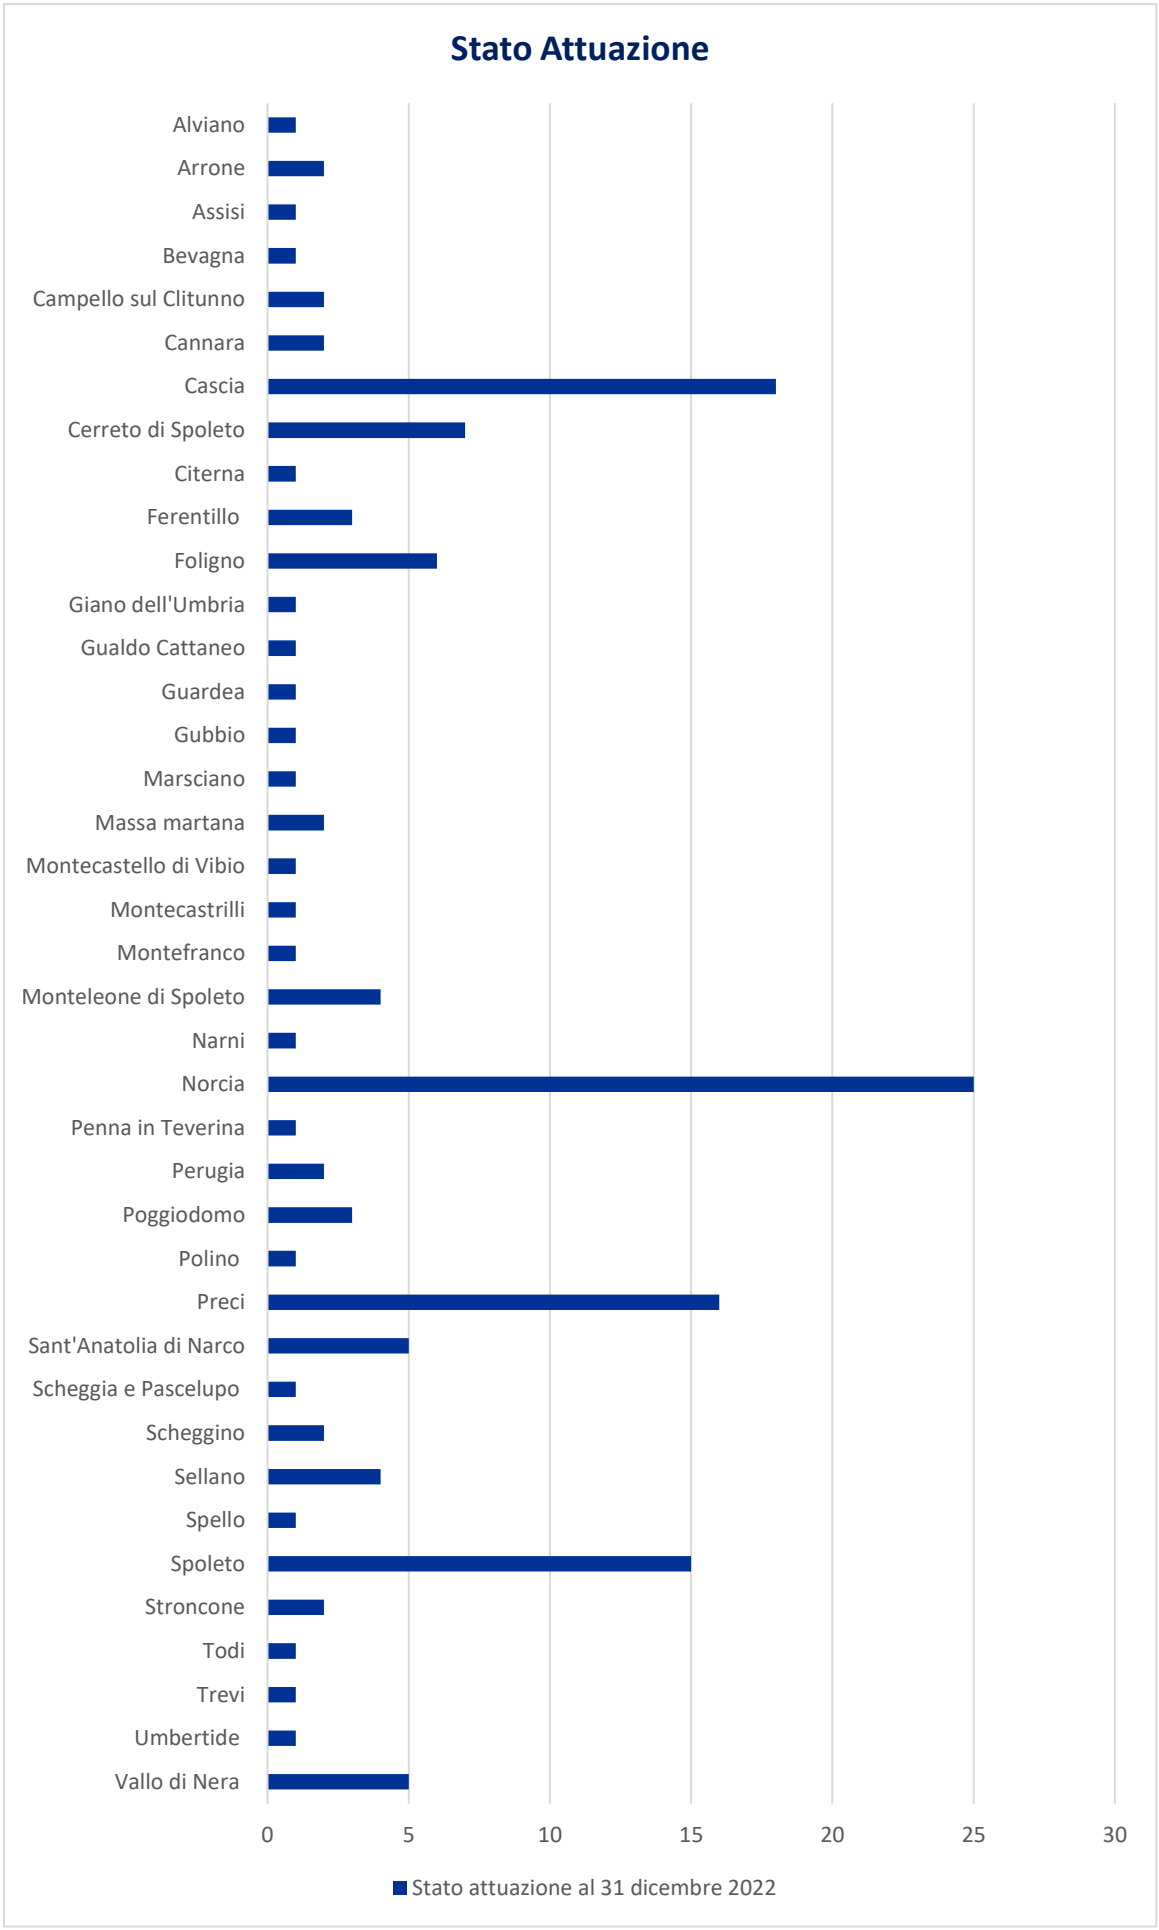
Stato Attuazione
Alviano
Arrone
Assisi
Bevagna
Campello sul Clitunno
Cannara
Cascia
Cerreto di Spoleto
Citerna
Ferentillo
Foligno
Giano dell'Umbria
Gualdo Cattaneo
Guardea
Gubbio
Marsciano
Massa martana
Montecastello di Vibio
Montecastrilli
Montefranco
Monteleone di Spoleto
Narni
Norcia
Penna in Teverina
Perugia
Poggiodomo
Polino
Preci
Sant'Anatolia di Narco
Scheggia e Pascelupo
Scheggino
Sellano
Spello
Spoleto
Stroncone
Todi
Trevi
Umbertide
Vallo di Nera
0
5
10
15
20
25
30
Stato attuazione al 31 dicembre 2022

Per quanto riguarda, invece, gli importi finanziati per soggetto attuatore dell'allegato 1 del decreto del commissario n. 395/2020 (Diocesi e EECR), così come aggiornato con ordinanza commissariale n. 132/2022, la situazione è la seguente:

REGIONE UMBRIA	NUMERO INTERVENTI	IMPORTI IN €
Arcidiocesi di Spoleto-Norcia	101	80.925.200,00
Diocesi di Assisi – Nocera Umbria – Gualdo Tadino	1	390.000,00
Diocesi di Città di Castello	1	143.000,00
Diocesi di Foligno	7	3.852.800,00
Diocesi di Gubbio	4	1.619.000,00
Diocesi di Orvieto – Todi	2	525.000,00
Diocesi di Perugia – Città della Pieve	2	564.000,00
Diocesi di Terni – Narni - Amelia	6	1.930.532,00
Provincia Serafica di San Francesco dell'Ordine dei Frati Minori	2	2.600.000,00
TOTALE	**126**	**92.549.532,00**

L'articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 189/2016 prevede, per quanto attiene alle attività previste per la programmazione e ricostruzione del patrimonio culturale, un protocollo di intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro della Cultura ed il rappresentante delle Diocesi proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare congiuntamente priorità, modalità e tempi dell'attività di recupero e ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma 2016.
In particolare, nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stata promossa, ai fini operativi e tecnico-scientifici, l'istituzione di uno specifico **tavolo tecnico** che include i soggetti individuati con decreto del Commissario n. 396/2020 e decreto del Commissario n. 400/2021 coordinato da un delegato del Commissario straordinario.
L'attività è indirizzata principalmente a garantire l'efficacia del complesso processo di ricostruzione negli aspetti che riguardano la qualità tecnico-scientifica degli interventi di tutela sul patrimonio culturale.
Per quanto riguarda i beni culturali di interesse religioso danneggiati dall'evento sismico del 2016, sono state determinanti le valutazioni del tavolo tecnico non soltanto per la definizione delle **priorità**, delle **modalità** e dei **tempi** ai fini della programmazione degli interventi per il loro recupero, ma anche per la determinazione delle **modalità stesse di progettazione**.

Il **tavolo tecnico** costituisce un **punto di riferimento** concreto per gli Uffici della Struttura Commissariale, per gli Uffici speciali per la ricostruzione a livello regionale, per gli Uffici del Ministero della Cultura e per la CEI, nei casi in cui si profilano rilevanti complessità applicative di interesse generale, determinando così un miglioramento ed implementazione continua delle linee di indirizzo, delle norme tecniche, dei criteri e modelli di intervento previsti dall'articolo 8, co. 3, dell'O.C. 105 del 2020.

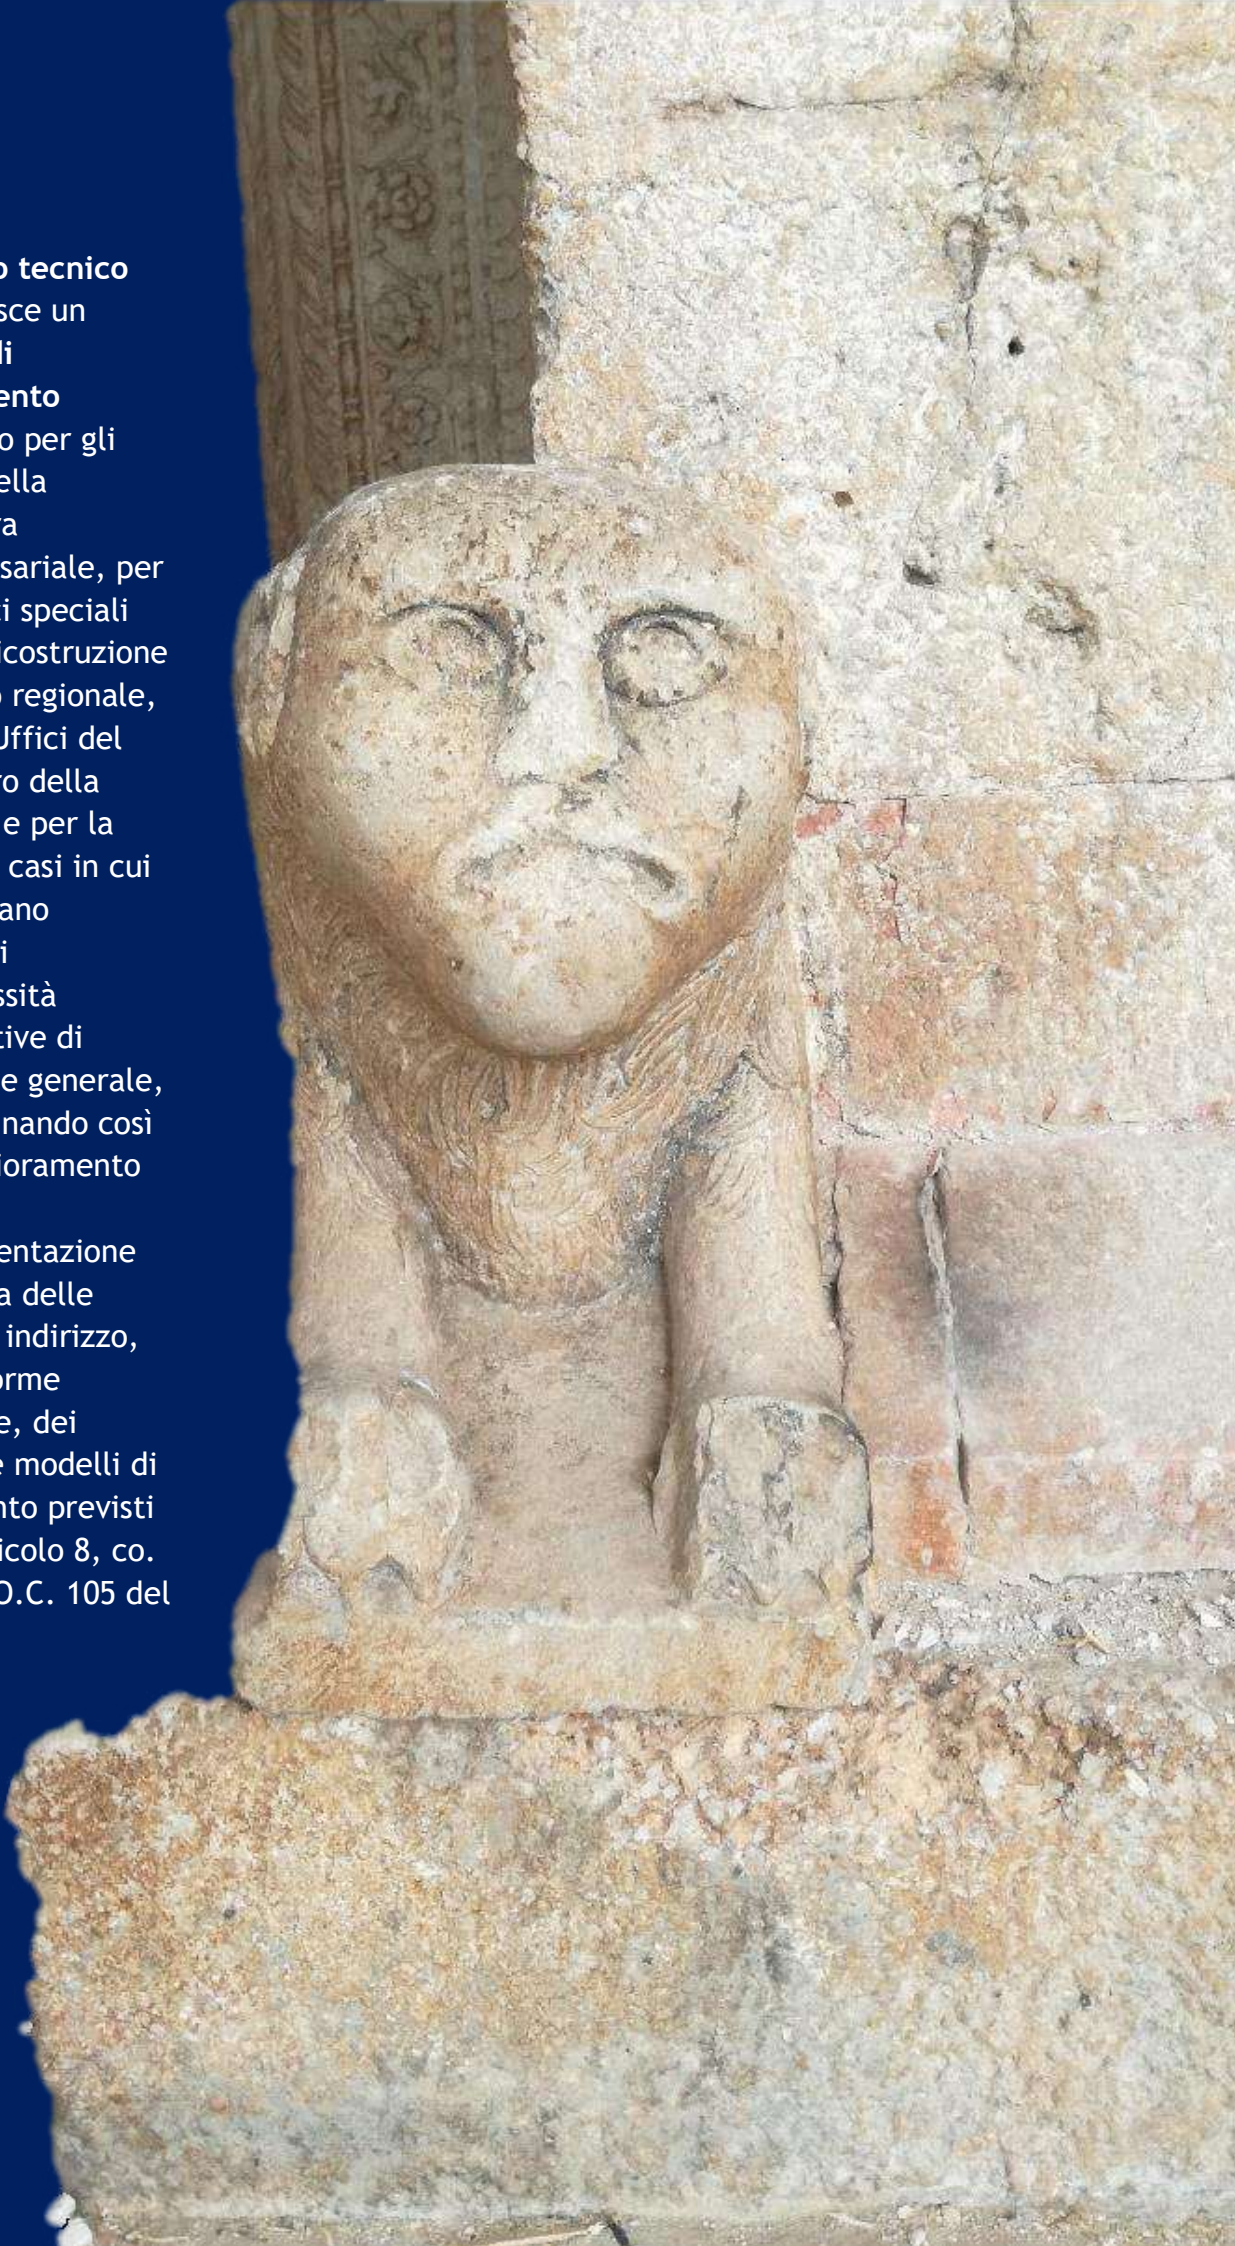

5.2. Stato di attuazione delle opere pubbliche

Lo stato di attuazione degli interventi delle opere pubbliche, necessita di una lettura articolata in base alle ordinanze di riferimento dei singoli interventi. Come già ampiamente illustrato, l'ordinanza commissariale n. 109/2020 contiene l'elenco unitario degli interventi finanziati anche con precedenti ordinanze, mentre le ordinanze speciali, oltre che dettare specifiche disposizione, in alcuni casi prevedono un incremento del finanziamento per sopraggiunte esigenze.
Inoltre, l'ultima ordinanza commissariale n. 129/2022 approva, per la Regione Umbria, un consistente numero di interventi per complessivi € 118.963.458,00. Tale ordinanza, registrata in data 27 dicembre 2022, nella sua attuazione, prevede il rispetto di termini precisi da parte di tutti i soggetti attuatori, ivi compresa la nomina del RUP di ciascun intervento ed il relativo cronoprogramma delle fasi attuative entro la data del 31 gennaio 2023.
Per tale ragione ed in considerazione della data di registrazione del 27dicembre 2022 dell'ordinanza commissariale n. 129/2022, anche lo stato di attuazione andrà necessariamente distinto tra le due principali ordinanze delle opere pubbliche (O.C. n. 109/2020 e O.C. n. 129/2022) e le ordinanza speciali attuate dai Sub-Commissari, con particolare riferimento al nuovo piano scuole approvato con l'ordinanza speciale n. 31/2021.

Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"

Alla data del 31 dicembre 2022, lo stato di attuazione dei 144 interventi facenti capo all'ordinanza commissariale n. 109/2020 evidenzia come **il 100% delle procedure sono in corso di attuazione**.
Poco più di **un terzo degli interventi è in fase di progettazione**, mentre **il 31% è in fase di approvazione da parte dell'USR Umbria**. In tale fase, è compresa l'attuale procedura di adeguamento prezzi disciplinata con l'ordinanza commissariale n.126/2022 che comporta, per l'USR Umbria, un ulteriore processo istruttorio finalizzato alla determinazione degli ulteriori fabbisogni economici derivanti dall'applicazione dell'ultima edizione del prezzario vigente.
Alla data del 31 dicembre 2022, **il 15% degli interventi è in fase di esecuzione lavori**, mentre **il 6% degli interventi è concluso** ed è in fase di rendicontazione delle spese sostenute, come risulta dal diagramma che segue:

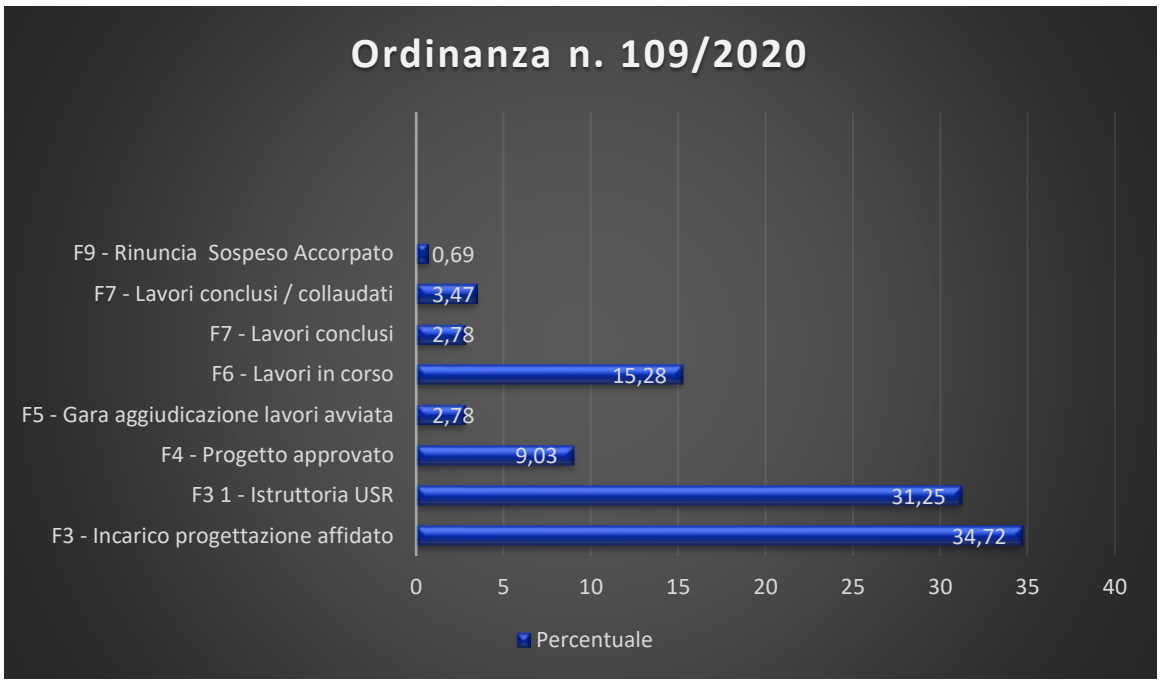

Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022

"Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo"

Il Commissario Straordinario, con propria ordinanza, ha approvato due importanti ulteriori programmi che si vanno a sommare con quanto già in corso di attuazione con l'ordinanza commissariale n. 109/2020.
In particolare, si interviene su due importanti programmi:

1. Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti
2. Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche

Gli interventi finanziati, sono così ripartiti:

ALLEGATI	INTERVENTI	IMPORTO IN €
O.C. n. 129/2022 – Allegato A: **Rigenerazione Urbana**	55	51.705.583,00
O.C. n. 129/2022 – Allegato B: **Nuovo Piano Opere Pubbliche**	98	67.257.875,00
TOTALE	**153**	**118.963.458,00**

Al 31 dicembre 2022 – quattro giorni dopo la data di registrazione dell'ordinanza - tutti gli interventi devono essere, ovviamente, ancora avviati.
L'ordinanza commissariale n. 129/2022 introduce, tra l'altro, dei termini che i soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a rispettare, che si possono così riassumere:

- **31 gennaio 2023:** il soggetto attuatore deve nominare il RUP di ogni singolo intervento;

- **31 gennaio 2023**: per ciascuna opera finanziata, il soggetto attuatore invia all'Ufficio speciale per la ricostruzione e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento;

- **28 febbraio 2023**: i Vice-Commissari possono indicare, di concerto con i Comuni, per l'attuazione degli interventi, il proprio Ufficio Speciale per la Ricostruzione quale soggetto attuatore ovvero proporre l'adozione, da parte del Commissario, di un'ordinanza speciale per gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono da esercitarsi in deroga;

- **31 marzo 2023**: il RUP dovrà perentoriamente, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Vice Commissario, aver avviato le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione dell'intervento ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto.

5.3. Monitoraggio delle opere pubbliche

Analizzando i **438 interventi finanziati dalle ordinanze commissariali** e dalle **ordinanze speciali**, è possibile individuare le seguenti macro-tipologie di intervento:

DESCRIZIONE	INTERVENTI	IMPORTO
SCUOLE ED ISTITUTI SCOLASTICI	94	€ 347.835.108,20
MUNICIPI E PALAZZI COMUNALI	18	€ 23.157.696,16
OSPEDALI O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE	7	€ 23.028.469,73
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	35	€ 36.400.572,40
CASERME	2	€ 5.310.293,82
DISSESTI	23	€ 21.412.877,70
CIMITERI	49	€ 24.135.426,19
LUOGHI DI CULTO	17	€ 18.669.858,59
SMS SOLIDALI	9	€ 4.818.296,76
VIABILITÀ	1	€ 391.000,00
RIGENERAZIONE URBANA	62	€ 65.755.583,00
ALTRE OPERE PUBBLICHE	121	€ 135.223.707,59
Totale complessivo	**438**	**€ 706.138.890,14**

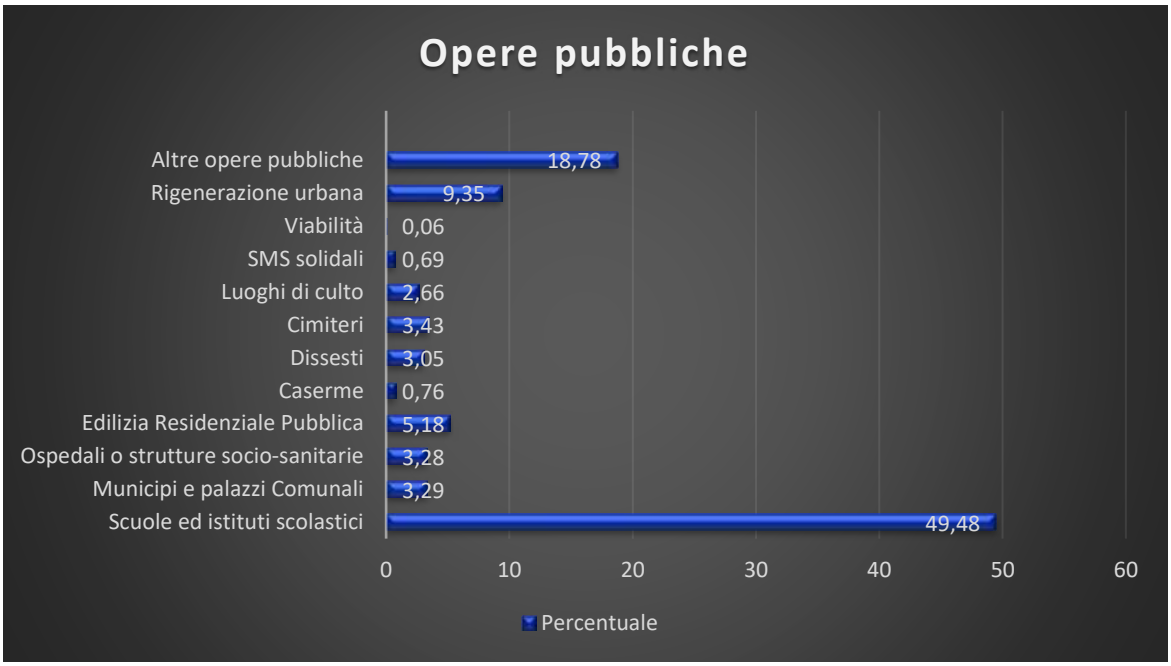

Come disciplinato dall'articolo 15 del decreto legge n. 189/2016, gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate sono attuati dalle Regioni, attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, ovvero dai Comuni e dagli enti locali interessasti, previa specifico atto di delega da parte del Presidente della Regione in qualità di Vice-Commissario. Da un punto di vista, quindi, della ripartizione della totalità degli interventi finanziati per soggetto attuatore, la situazione è la seguente:

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTI	IMPORTO
USR UMBRIA	33	€ 78.881.187,68
REGIONE UMBRIA	18	€ 37.701.490,88
PROVINCIA DI PERUGIA	35	€ 225.801.006,25
PROVINCIA DI TERNI	2	€ 907.000,00
ATER UMBRIA	21	€ 30.320.793,97
ADISU	1	€ 2.970.000,00
AGENZIA DEL DEMANIO	8	€ 4.491.000,00
ARCIDIOCESI SPOLETO-NORCIA	4	€ 12.283.656,91
COMUNE DI ACQUASPARTA	2	€ 203.910,00
COMUNE DI ALVIANO	1	€ 1.900.000,00
COMUNE DI ASSISI	4	€ 7.034.872,00
COMUNE DI BASTIA UMBRA	1	€ 965.248,50
COMUNE DI BETTONA	3	€ 1.013.798,19
COMUNE DI BEVAGNA	5	€ 4.413.520,00
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO	4	€ 1.515.040,00
COMUNE DI CANNARA	5	€ 6.713.000,00
COMUNE DI CASCIA	15	€ 30.362.369,50
COMUNE DI CASTEL RITALDI	2	€ 3.284.800,00
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO	18	€ 9.476.138,81
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO	1	€ 500.000,00
COMUNE DI COLLAZZONE	3	€ 989.920,00
COMUNE DI COSTACCIARO	1	€ 800.000,00
COMUNE DI DERUTA	1	€ 621.000,00
COMUNE DI FERENTILLO	7	€ 5.386.235,00
COMUNE DI FOLIGNO	18	€ 35.703.632,00
COMUNE DI FOSSATO DI VICO	2	€ 1.400.000,00
COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	3	€ 1.532.650,00
COMUNE DI GIOVE	1	€ 3.603.920,00
COMUNE DI GUALDO CATTANEO	7	€ 2.246.150,00
COMUNE DI GUALDO TADINO	2	€ 3.840.000,00
COMUNE DI GUARDEA	1	€ 1.073.250,00
COMUNE DI GUBBIO	1	€ 100.000,00

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTI	IMPORTO
COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA	1	€ 217.400,00
COMUNE DI MARSCIANO	3	€ 1.337.611,33
COMUNE DI MASSA MARTANA	3	€ 843.800,00
COMUNE DI MONTECASTRILLI	6	€ 1.139.660,00
COMUNE DI MONTECCHIO	2	€ 66.500,00
COMUNE DI MONTEFALCO	7	€ 5.431.112,00
COMUNE DI MONTEFRANCO	6	€ 3.034.994,00
COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO	6	€ 7.102.535,01
COMUNE DI MONTONE	3	€ 577.020,00
COMUNE DI NOCERA UMBRA	7	€ 4.774.700,00
COMUNE DI NORCIA	16	€ 42.496.620,83
COMUNE DI ORVIETO	1	€ 1.500.000,00
COMUNE DI OTRICOLI	1	€ 1.214.312,00
COMUNE DI PACIANO	1	€ 250.000,00
COMUNE DI PENNA IN TEVERINA	2	€ 85.000,00
COMUNE DI PERUGIA	2	€ 3.450.000,00
COMUNE DI POGGIODOMO	3	€ 666.300,00
COMUNE DI POLINO	9	€ 1.413.360,00
COMUNE DI PRECI	28	€ 36.340.399,38
COMUNE DI SAN VENANZO	1	€ 135.640,00
COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO	10	€ 3.927.193,83
COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO	3	€ 120.691,00
COMUNE DI SCHEGGINO	15	€ 4.358.979,83
COMUNE DI SELLANO	4	€ 1.292.677,52
COMUNE DI SIGILLO	1	€ 350.000,00
COMUNE DI SPELLO	3	€ 509.080,00
COMUNE DI SPOLETO	29	€ 46.149.648,25
COMUNE DI TERNI	3	€ 1.650.742,22
COMUNE DI TODI	5	€ 7.068.014,00
COMUNE DI TREVI	1	€ 1.100.000,00
COMUNE DI UMBERTIDE	1	€ 2.495.000,00
COMUNE DI VALFABBRICA	3	€ 652.568,00
COMUNE DI VALLO DI NERA	21	€ 5.776.741,25
COMUNE DI VALTOPINA	1	€ 575.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	**438**	**€ 706.138.890,14**

I vari piani e programmi della ricostruzione pubblica fin qui approvati hanno avuto quale obiettivo principale quello di **finanziare opere ed edifici strategici** ai fini della rapida **ripresa della vita sociale ed economica** dei territori maggiormente colpiti dal sisma.
Analizzando quindi la ripartizione delle risorse all'interno del territorio regionale si può osservare **come due terzi dei finanziamenti** complessivi siano stati assegnati ad interventi ricadenti all'interno del **cratere sisma**.

Ripartizione dei finanziamenti tra Comuni del cratere e fuori cratere sisma

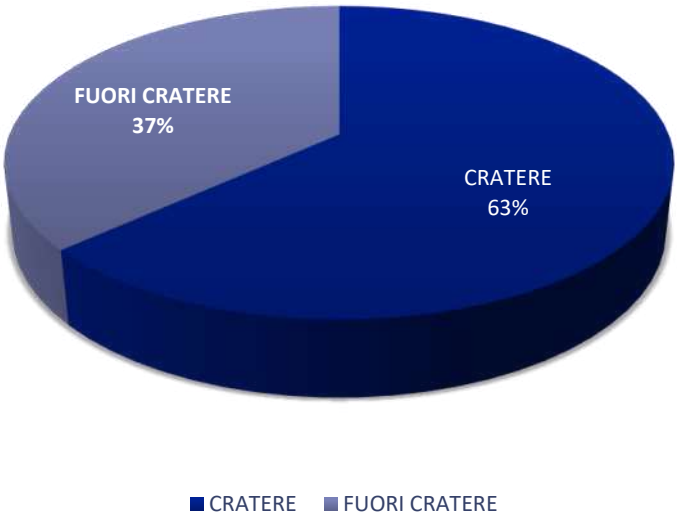

5.4. Le ordinanze speciali

Il Commissario Straordinario, con l'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, ha disciplinato le **ordinanze speciali** individuando interventi e opere urgenti di particolare criticità. L'ordinanza commissariale n. 110/2020, a tal fine, sbabilisce che le ordinanze speciali devono indicare 'le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il soggetto attuatore, le relative modalità di realizzazione degli interventi, il cronoprogramma e i sub-commissario competenti'.
Di seguito si riportano le ordinanze speciali adottate fino al 31 dicembre 2022 per l'attuazione degli interventi ricadenti nei territori della Regione Umbria:

ORDINANZE	INTERVENTI	IMPORTO IN €
Ordinanza speciale n. 10/2021 (Preci)	**7**	12.322.918,91
Ordinanza speciale n. 11/2021 (Norcia)	**10**	52.937.870,83
Ordinanza speciale n. 12/2021 (Cascia)	**5**	21.432.158,39
Ordinanza speciale n. 18/2021 (Castelluccio di Norcia)	**8**	22.621.807,00
Ordinanza speciale n. 27/2021 (Agenzia del Demanio)	**8**	4.491.000,00
Ordinanza speciale n. 31/2021 (Nuovo Piano Scuole)	**59**	245.769.950,50
Ordinanza speciale n. 39/2022 (Preci)	**25**	34.132.793,51
Ordinanza speciale n. 43/2022 (Castelluccio, Campi Alto, San Pellegrino di Norcia)	**10**	43.042.610,00
TOTALE	**132**	**436.751.109,14**

In riferimento all'elenco sopra riportato, si segnala come per l'ordinanza speciale n. 31/2021 - che rappresenta il programma di attuazioni più corposo e complesso - il Commissario Straordinario ha previsto, per i soggetti attuatori, allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione del programma straordinario, quale strumento di attuazione obbligatorio, uno o più **accordi quadro**, con uno o più operatori economici individuati previa procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. Nelle pagine che seguono viene illustrato lo stato di attuazione delle singole ordinanze speciali anche in riferimento agli interventi principali in esse individuati.

Ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021

"Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi"

Il territorio di Preci è stato fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016. I danni sono rilevanti sia sul patrimonio pubblico che privato, riscontrando gravi disagi a carico della popolazione. Particolarmente danneggiato è risultato il patrimonio costituito da edifici ed agglomerati di interesse storico-architettonico che necessitano di particolare attenzione e sensibilizzazione relativamente agli interventi strutturali che dovranno necessariamente incrementare il livello di sicurezza attraverso un miglioramento o adeguamento sismico, compatibilmente con la disciplina del Codice dei Beni Culturali.
Proprio per queste tipologie di opere, il Comune di Preci e l'Archidiocesi di Spoleto Norcia, hanno manifestato la volontà di intervenire in maniera urgente ed unitaria sul **complesso monumentale dell'Abbazia di Sant'Eutizio**, gravemente danneggiata dalle scosse sismiche dell'agosto 2016, ma ancor più quelle del 26 e 30 ottobre, che hanno provocato il crollo del muro di contenimento del sovrastante cimitero.

Il territorio di Preci è altresì caratterizzato da alcuni movimenti franosi che hanno prodotto cedimenti e scivolamenti in prossimità di collegamenti viari, ostacolando sia la transitabilità in sicurezza che la ricostruzione di edifici privati sottostanti la strada.
In particolare, le opere analizzate ed inserite in ordinanza sono:

- il complesso dell'abbazia di Sant'Eutizio, articolato in tre interventi:
  - consolidamento della rupe e ricostruzione della torre campanaria
  - ripristino e ricostruzione della chiesa di Sant'Eutizio
  - ripristino e ricostruzione del convento di Sant'Eutizio
- ricostruzione del cimitero di Sant'Eutizio
- fenomeno franoso in località Abeto
- fenomeno franoso in località Valle

	IMPORTO ORD. N.109/2020 VALIDATO CIR IN €	IMPORTO ORD. N.105/2020 IN €	MAGGIORE IMPORTO STIMA STUDIO DI FATTIBILITÀ IN €	IMPORTO TOTALE IN €
Ripristino e miglioramento sismico cimitero di S. Eutizio	1.476.062			1.476.062
Abbazia di S. Eutizio e rupe di travertino Studio FAC e risposta sismica locale				
Chiesa di S. Eutizio		750.000	5.210.993	5.960.993,04
Contento di S. Eutizio				
Movimento franoso loc. Abeto (I° e II° stralcio)	1.563.200			1.563.200
Movimento franoso in località Valle	1.000.000			1.000.000
			TOTALE INVESTIMENTI	**10.000.255,04**

Per quanto riguarda l'intervento dell'abbazia di Sant'Eutizio ad agosto 2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, incrementato di ulteriori € 822.663,87 derivanti dall'utilizzo del fondo di accantonamento, per l'importo complessivo concesso di € 6.783.656,91.
Lo scorso **3 ottobre 2022** è stato **firmato il contratto per l'avvio dei lavori** con l'impresa C.E.S.A. di Città di Castello, capogruppo del raggruppamento d'impresa che ha vinto la gara di appalto insieme alla Tecnostrade srl di Perugia.

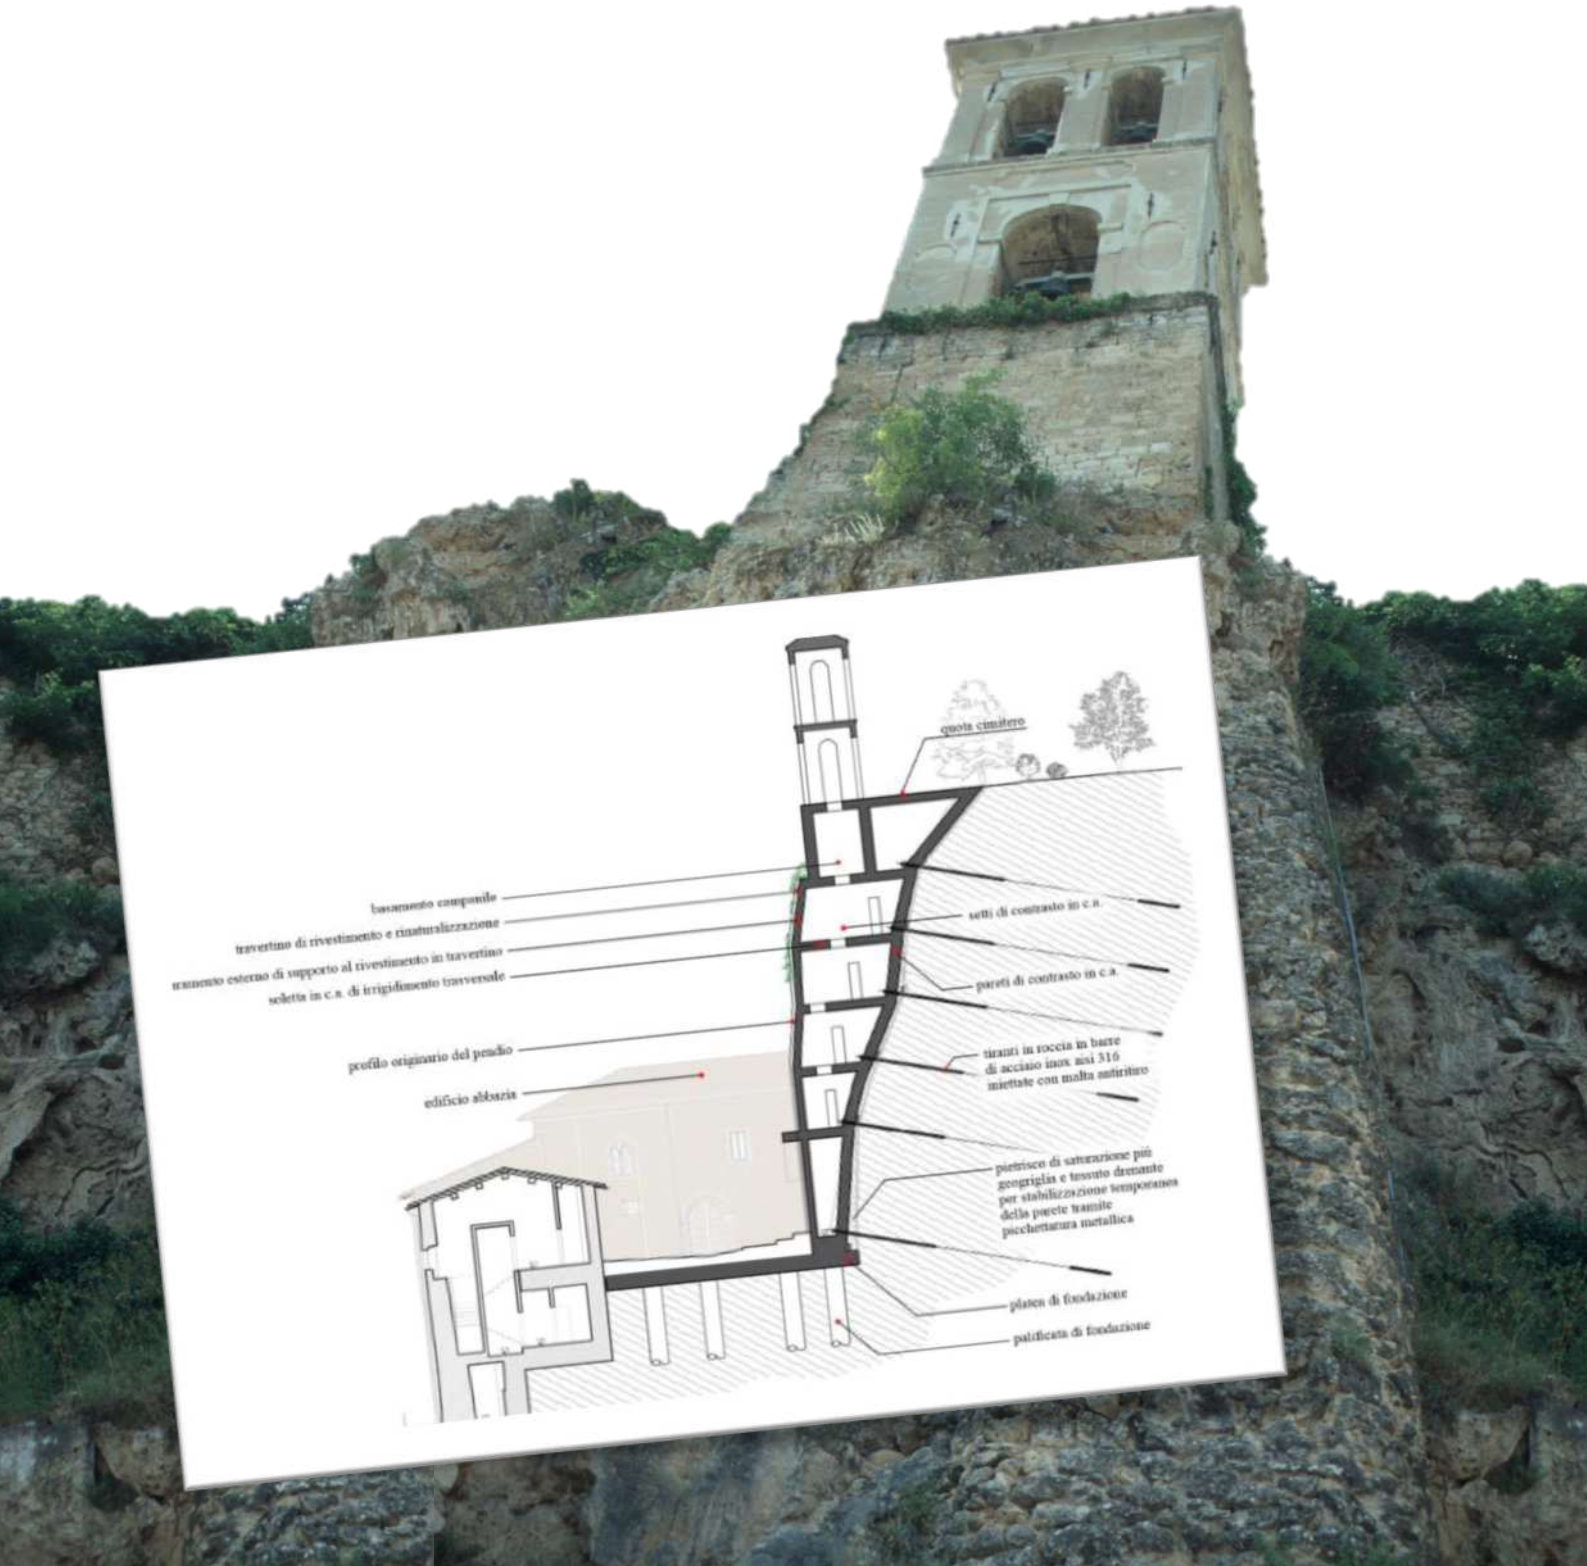

Ordinanza Speciale n. 11 del 15 luglio 2021

"Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia"

In seguito agli eventi sismici, il territorio di **Norcia** ha riportato numerosi danni agli edifici scolastici con conseguenti gravi disagi a carico della popolazione scolastica e delle relative famiglie.

Particolarmente **danneggiati sono risultati anche molti edifici pubblici** tra cui l'ospedale con conseguenti inconvenienti connessi alla dispersione di servizi e attività.

In particolare, le opere pubbliche ricomprese nell' ordinanza speciale sono:

- **Polo scolastico**
- **Palazzetto del tennis**
- **Uffici tecnici comunali – via Solferino**
- **Palazzo comuale – P.zza San Benedetto**
- **Edificio "La Castellina" – P.zza San Benedetto**
- **Caserma dei Carabinieri**
- **Mura urbiche – Porta Romana**
- **Mura urbiche – Porta Ascolana**
- **Tratto mura urbiche tra Porta Romana e Porta Orientale**
- **Ospedale di Norcia**

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi relativi alle singole opere pubbliche previste nell'ordinanza speciale:

	IMPORTO STIMATO IN €	IMPORTO ORD. N.109/2020 VALIDATO CIR IN €	MAGGIORE IMPORTO IN €	IMPORTO TOTALE IN €
Polo scolastico Norcia		15.569.250	9.912.000	25.481.250
Palazzetto del tennis	1.500.000			1.500.000
Edificio la Castellina		785.514,07		785.514,07
Caserma dei Carabinieri		4.454.264		4.454.264
Palazzo Comunale		5.760.000		5.760.000
Uffici comunali tecnici Via Solferino		969.581,35		969.581,35
Mura Urbiche Porta Acolana		900.000		900.000
Mura Urbiche Porta Romana		1.500.000		1.500.000
Tratto di Mura Urbiche da Porta Romana a Porta Orientale		1.914.485,93		1.914.485,93
Ospedale di Norcia		5.400.000	4.000.000	9.400.000
TOTALE INVESTIMENTI		**37.253.095,35**	**13.912.000**	**52.665.095,35**

Date le funzioni che la maggior parte degli edifici svolgono, vocate ad offrire servizi per il cittadino e per la collettività, appare opportuno che il ripristino debba essere accelerato e reso prioritario al fine di ricostruire le condizioni di normalità e sviluppo della città. Gli interventi risultano tutti in avanzato stato di attuazione. **Le progettazioni sono ultimate praticamente per tutti gli edifici ad eccezione del palazzetto del Tennis**. Per quanto riguarda l'appalto dei lavori, **risulta conclusa la procedura di scelta dell'impresa per gli interventi relativi all'ospedale di Norcia** mentre **sono in corso i lavori nel palazzo comunale**.

Ordinanza Speciale n. 12 del 15 luglio 2021

"Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia"

In seguito agli eventi sismici, il territorio di Cascia ha riportato numerosi danni al patrimonio pubblico dell'edilizia scolastica ed ospedaliero, con conseguenti gravi disagi a carico della popolazione. In particolare, le opere pubbliche ricomprese nell' ordinanza speciale n.12/2021 sono:

- Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone Fidati"
- Istituto superiore e palestra
- Riorganizzazione e riqualificazione dell'assetto viario per l'area del polo scolastico
- Ospedale di Santa Rita in Cascia
- Miglioramento strada di accesso ospedale e creazione di nuovi parcheggi di servizio

DESCRIZIONE	IMPORTO ORD. N.109/2020 VALIDATO CIR IN €	IMPORTO P.S.R. IN €	MAGGIORE IMPORTO IN €	IMPORTO TOTALE IN €
Istituto Omnicomprensivo	5.227.500			5.227.500
Istituto superiore			1.607.714,78	1.607.714,78
Palestra			491.092,88	491.092,88
Riqualificazione area scuola		3.752.681		3.752.681
Ospedale	7.560.000		2.000.000	9.560.000
Riqualificazione area ospedale		793.169,73		793.169,73
TOTALE INVESTIMENTI				**21.432.158,39**

Per quanto riguarda l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'Ospedale, è conclusa la gara di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ed è in corso la redazione del progetto esecutivo da parte dell'operatore economico affidatario dell'appalto.

Ordinanza Speciale n. 18 del 15 luglio 2021

"Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia"

Il territorio di Norcia nel suo complesso è stato considerevolmente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, sia nel capoluogo che nelle sue diverse frazioni. In particolare, la frazione di **Castelluccio** ha subito danni tanto ingenti al nucleo urbanistico, che risulta in larga parte raso al suolo con puntuali restanti parti in elevato stato di pericolosità, tanto da interdire l'accesso all'area e comportare la necessità di demolizione dei pochi residui edilizi.

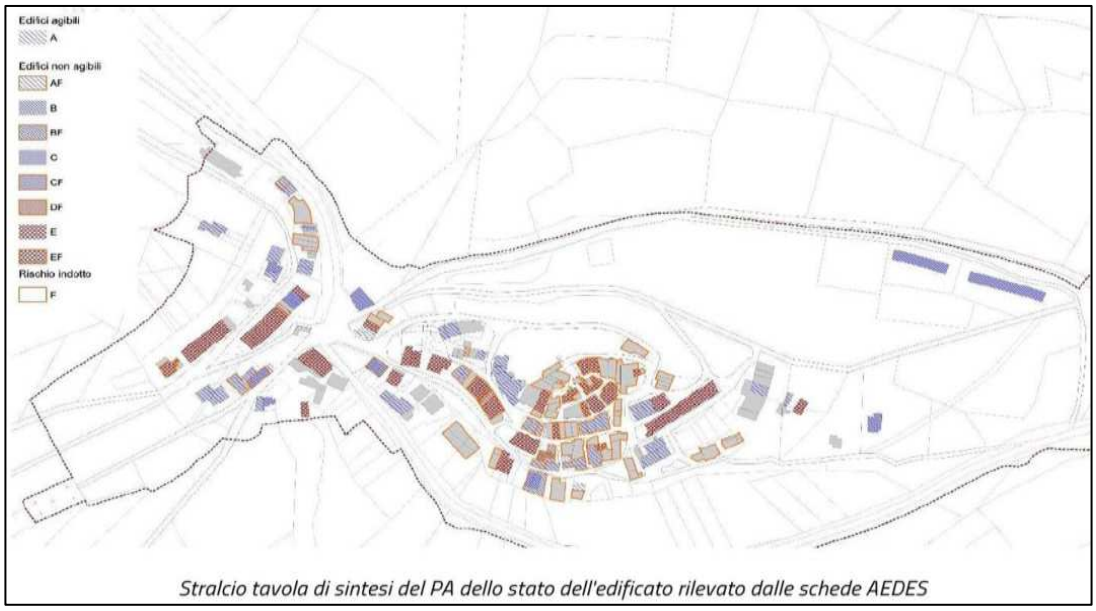

Stralcio tavola di sintesi del PA dello stato dell'edificato rilevato dalle schede AEDES

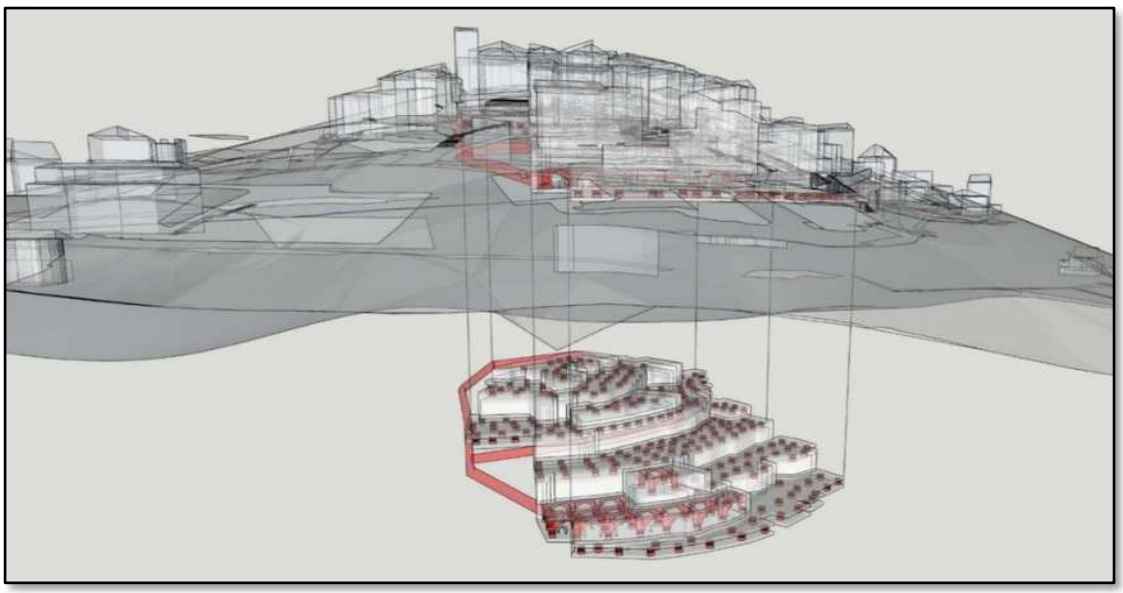

In particolare, le opere pubbliche ricomprese in ordinanza speciale sono:

DESCRIZIONE	STIMA INTERVENTO IN €	STIMA SOLA PROGETTAZIONE IN €	SPESA AUTORIZZATA IN €	RISORSE CONTABILITÀ SPECIALE EX ART. 4 C. 3 DL 189/2016 (PER INTERVENTI) IN €	RISORSE CONTABILITÀ SPECIALE EX ART. 4 C. 3 DL 189/2016 (PER SOLA PROGETTTAZIONE) IN €
Ripristino viabilità di accesso al nucleo abitato versante nord	2.584.125		2.584.125	2.584.125	
Consolidamento versante nord centro storico	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
Ripristino strade principali e secondarie nucleo abitato	2.734.500	287.122	287.122		287.122
Terrazzamenti nucleo abitato	4.964.250	692.475	692.475		692.475
Sottoservizi nucleo abitato	4.747.740	664.683	664.683		664.684
Realizzazione parcheggi interrati	1.760.000	236.297	236.297		236.297
Realizzazione spazi pubblici	1.510.420	177.152	177.152		177.152
Percorsi pedonali e di sicurezza	165.825	28.749	28.749		28.749
TOTALE INVESTIMENTI	**19.448.860**		**5.670.604**	**3.584.125**	**21.432.158,39**

Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 18/2021

Alla data del 31 dicembre 2022 **tutti gli interventi** ricompresi nell'ordinanza speciale n. 18/2021 **sono in corso di progettazione**. In particolare, per quanto riguarda il **ripristino della viabilità di accesso al nucleo abitato versante nord** (ossia strada delle cavalle, via degli sciatori e via dietro la torre) è stato

consegnato il progetto definito il 27 dicembre 2022 ed è in corso, da parte dell'USR Umbria l'istruttoria sul progetto. I servizi di progettazione per le fasi di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'attività di monitoraggio area R4 dell'intervento erano stati affidati direttamente il 23 febbraio 2022 (determinazione dirigenziale n. 393/2022) a Sergio Calabrò per un importo di € 130.878,59.
Quanto al consolidamento del versante nord è stato appurato che non è in corso alcun fenomeno franoso per cui è stata fatta richiesta di utilizzare le risorse destinate a questo intervento per il ripristino della viabilità.
Per l'intervento di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia, la sua attuazione avverrà in più fasi:

1. Realizzazione interventi pubblici individuati come opere funzionali e necessari per la ripresa del borgo indipendenti dall'intervento unitario

2. Ripristino viabilità di accesso al nucleo abitato sul versante Nord consolidamento del versante Nord del centro storico. Predisposizione atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione di Castelluccio.

3. Affidamento dei servizi di progettazione della ricostruzione di Castelluccio e dell'intervento unitario.

4. Realizzazione interventi pubblici individuati come funzionali e necessari per la ripresa di Castelluccio

Nel mese di settembre 2022 sono state **completate le operazioni di demolizione e messa in sicurezza dell'edificato esistente** da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Perugia.
Il 3 novembre 2022, con determinazione dirigenziale n. 2302, **sono stati affidati**, da parte dell'USR Umbria, tramite **Accordo Quadro** con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., i **servizi di progettazione**, **fattibilità tecnica ed economica**, **definitiva ed esecutiva**, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico di direzione dei lavori, relativi alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le **strutture fondali antisismiche** e accessorie, inerenti il **complesso degli interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio**. Tali servizi sono stati affidati alla S.A.G.I. srl per un importo di € 6.110.000.

Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021

"Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189"

In coerenza con l'ordinanza n. 110/2020, è stata predisposta l'Ordinanza Speciale per taluni immobili di proprietà dello Stato al fine di favorire quanto prima la ripresa socio-economica delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016, nonché il ripristino del territorio nelle sue funzioni sociali ed economiche, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie ad accelerare l'intera filiera dei processi di realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione e approvazione del progetto all'affidamento ed esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda la Regione Umbria, gli interventi finanziati sono i seguenti:

DENOMINAZIONE INTERVENTO	COMUNE	IMPORTO PROGRAMMATO IN ORDINANZA IN €
Stazione ferroviaria di Triponzo	CERRETO DI SPOLETO	**390.000,00**
Magazzino merci stazione ferroviaria di Serravalle	NORCIA	**138.000,00**
Stazione ferroviaria	NORCIA	**670.000,00**
Casello ferroviario Castel San Felice	SANT'ANATOLIA DI NARCO	**130.000,00**
Deposito officina ferroviaria	SPOLETO	**1.380.000,00**
Fabbricato ferroviario per viaggiatori	SPOLETO	**1.100.000,00**
Magazzino ferroviario merci	SPOLETO	**218.000,00**
Stazione ferroviaria di Caprareccia	SPOLETO	**465.000,00**

Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 27/2021

Per tutti gli interventi sopra riportati, sono in corso le attività di affidamento della progettazione definitiva da parte del soggetto attuatore che è l'**Agenzia del Demanio**.

Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021

"Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria".

Con l'Ordinanza Speciale n. 31/2021 è stato approvato il programma straordinario degli interventi finalizzati al recupero delle **strutture scolastiche danneggiate dal sisma**.

Per quanto riguarda la **Regione Umbria**, il programma si compone, complessivamente, di **59 interventi per complessivi € 245.769.950,50.**

Allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione del Programma Straordinario, il Commissario straordinario mette a disposizione dei soggetti attuatori, uno o più Accordi Quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

Per il coordinamento del programma sono individuati, in ragione delle loro competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Fulvio Soccodato, quale sub Commissario per gli interventi riferiti alle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria e l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario per gli interventi riferiti alla Regione Marche.

Dal punto di vista della distribuzione territoriale degli interventi finanziati, la situazione è così riassunta:

COMUNE	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO COMPLESSIVO ASSEGNATO IN €
ASSISI	7	14.880.400,00
BASTIA UMBRA	1	965.248,50
BEVAGNA	1	2.722.320,00
CANNARA	1	4.050.000,00
CERRETO DI SPOLETO	1	2.640.000,00
COSTACCIARO	1	800.000,00
FOLIGNO	18	72.477.012,00
GIOVE	1	3.603.920,00
GUALDO TADINO	1	8.172.000,00
MONTEFRANCO	1	527.250,00
NOCERA UMBRA	1	1.054.500,00
PERUGIA	10	62.943.750,00

COMUNE	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO COMPLESSIVO ASSEGNATO IN €
PRECI	1	1.100.000,00
SPOLETO	12	55.338.550,00
TODI	1	12.000.000,00
UMBERTIDE	1	2.495.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	59	245.769.950,50
Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 31/2021		

Alla data del 31 dicembre 2022 sono poco meno di **una decina i progetti già elaborati di cui la metà in fase di istruttoria da parte dell'USR Umbria**, per la successiva fase della Conferenza dei Servizi Speciale, indetta e condotta, di regola, dal Sub Commissario.

Ordinanza Speciale n. 39 del 23 dicembre 2022

"Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci"

Con l'Ordinanza Speciale n. 39/2022 è stato approvato il programma straordinario degli interventi da attuare nel **territorio del Comune di Preci**, come di seguito riepilogato:

DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO STIMATO IN €	ORDINANZA N. 109/2020 IN €	ORDINANZA N. 109/2020 (SCHEDA 2) IN €	MAGGIORE IMPORTO RICHIETO IN €	IMPORTO TOTALE IN €
Hotel Scacchi Comune di Preci	2.127.615,20	2.127.615,20			2.127.615,20
Caserma Carabinieri e altro (largo Trento e Trieste Via S. Caterina	996.428,40	996.428,40			996.428,40
Palazzo Comunale e Sala Consiliare	1.449.541.20	1.449.541.20		669.660,75	2.119.201,95
Palestra Comunale corpo spogliatoi	686.147	686.147			686.147
Palazzo Finocchioli	1.239.078,38	1.239.078,38			1.239.078,38
Edificio Produttivo Magazzino Comunale	1.191.682,90	1.191.682,90			1.191.682,90
Cimitero Abeto	193.565,70	193.565,70			193.565,70
Strada omunale La Costarella dissesti scarpata di monte	240.000	240.000			240.000
Sottoservizi Preci Capoluogo	8.365.000		3.350.000	5.300.000	3.350.000
Sala Polivalente ed altro	1.400.000		1.400.000		1.400.000
Muro Caserma dei carabinieri e via Santa Caterina	1.950.000		1.000.000	950.000	1.950.000
Muri di sostegno	3.800.000		1.800.000	2.000.000	3.800.000

DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO STIMATO IN €	ORDINANZA N. 109/2020 IN €	ORDINANZA N. 109/2020 (SCHEDA 2) IN €	MAGGIORE IMPORTO RICHIETO IN €	IMPORTO TOTALE IN €
e contenimento M1, M2, M3					
Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Geca	900.000		500.000	400.000	900.000
Spogliatoi campo sportivo	300.000				300.000
Roccanolfi, ex Palazzo Ciri	2.500.000				2.500.000
Roccanolfi frana	2.500.000				2.500.000
Via Catani, 5 ERP	823.877,04	823.877,04			1.196.269,46
Via Catani, 9 ERP	881.717,09	3.500.000			1.280.253,21
Via Cavallotti, 1 ERP	471.436,12	471.436,12			471.436,12
Loc. Todiano - Edificio Piazza della Torre	1.162.043,73	1.162.043,73			1.162.043,73
				TOTALE INVESTIMENTO già finanziato	19.513.132,76
				TOTALE INVESTIMENTO non finanziato	14.619.660,75
				TOTALE INVESTIMENTO	34.132.793,51
Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 39/2022					

Ordinanza Speciale n. 43 del 31 dicembre 2022

"Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino"

Con l'Ordinanza Speciale n. 43/2022 è stato approvato il programma straordinario degli interventi da attuare nelle frazioni di **Campi Alto** e **San Pellegrino**, nonché l'attuazione della seconda fase della ricostruzione di **Castelluccio di Norcia**. Trattandosi di interventi molto complessi, legati all'elevato grado di danneggiamento delle frazioni, verranno necessariamente attuate mediante una serie organica di interventi propedeutici e prioritari al fine di permettere una corretta esecuzione delle lavorazioni.
Per quanto riguarda la ricostruzione della frazione di **Campi Alto**, il complesso degli interventi è il seguente:

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO STIMATO IN €	SPESA AUTORIZZATA IN €	FINANZIAMENTO EX ORDINANZE N. 105/2020 E N. 132/2022 IN €	FINANZIAMENTO EX ORDINANZA N. 129/2020 IN €	RISORSE CONTABILITÀ SPECIALE EX ART. 4, C. 3, DL 189/2016 IN €
Indagini geologiche, monitoraggio e opere di stabilizzazione dei versanti	1.237.000	1.237.000			1.237.000
Completamento funzionale del ripristino definitivo della viabilità di accesso al nucleo abitato	6.215.000	6.215.000			6.215.000
Completamento delle urbanizzazioni, viabilità interne e sottoservizi	7.100.000	7.100.000		3.000.000	4.100.000
Ripristino mura urbiche	12.458.610	1.000.000			1.000.000
Chiesa S. Andrea	4.000.000	4.000.000	4.000.000		0
TOTALE	**31.010.610**	**19.552.000**	**4.000.000**	**3.000.000**	**12.552.000**

Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 43/2022

Per quanto riguarda la ricostruzione della frazione di **San Pellegrino**, il complesso degli interventi è il seguente:

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO STIMATO IN €	ORDINANZA N. 109/2020 IN €	ORDINANZA N. 129/2022 (Scheda 2) IN €	MAGGIORE IMPORTO RICHIESTO IN €	IMPORTO TOTALE IN €
Frana da crollo	1.000.000	1.000.000			
Infrastrutture a rete ed opere puntuali San Pellegrino	7.210.000		3.000.000	4.210.000	7.210.000
TOTALE	**8.210.000**	**1.000.000**	**3.000.000**		**7.210.000**
				INVESTIMENTO già finanziato	4.000.000
				INVESTIMENTO non finanziato	4.210.000
				TOTALE INVESTIMENTO	8.210.000
					Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 43/2022

Relativamente alla fase due della ricostruzione del centro storico di **Castelluccio di Norcia**, il complesso degli interventi è così definito:

DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	STIMA INTERVENTO DA O.S. N. 18/2022 IN €	STIMA AGGIORNATA IN €	SPESA AUTORIZZATA IN €
Ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo abitato	**USR Umbria**	2.734.500	3.281.000	3.281.000
Terrazzamenti del nucleo abitato	**USR Umbria**	4.946.250	5.935.500	5.935.500
Sottoservizi del nucleo abitato	**USR Umbria**	4.747.740	5.697.288	5.697.288
Realizzazione parcheggi interrati	**USR Umbria**	1.510.420	1.812.504	1.812.504
Realizzazione degli spazi pubblici	**USR Umbria**	1.760.000	2.112.000	2.112.000
Percorsi pedonali e di sicurezza	**USR Umbria**	165.825	198.990	198.990
Piastra fondale ad isolatori sismici	**USR Umbria**		3.822.000	3.822.000
TOTALE INVESTIMENTI		**15.864.735**		**22.859.282**
				Fonte: Relazione allegata ordinanza speciale n. 43/2022

5.5. Donazioni solidali

In Umbria soggetto attuatore dei progetti legati alle **donazioni** raccolte attraverso il **numero solidale 45550** attivato all'indomani del sisma del 2016 è l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Umbria.

La quota di fondi attribuita all'Umbria, più volte rimodulata nel corso del tempo, è stata pari ad € 4.835.296,76 così destinati:

1) ***Dotazioni e apparecchiature per le scuole dei comuni maggiormente colpiti dal sisma*** = € 568.838,52 per dotare i territori della Valnerina di una rete informatica per le scuole primarie con aule interamente digitali e cablate. **Il progetto si è concluso nel 2021.**
2) ***Restauro beni culturali mobili*** = € 116.600,00 per il restauro dei beni culturali mobili al fine di restituirli ai rispettivi siti originari. Sono stati restaurati beni mobili provenienti dalla chiesa di San Salvatore e dalla chiesa di S. Andrea di Campi nel comune di Norcia; dalla chiesa di Sant'Anatolia nel comune di Cascia e dalla chiesa di San Bartolomeo di Todiano nel comune di Preci. **Il progetto si è concluso nel 2021.**
3) ***Centri di comunità*** = € 4.149.858,24 per realizzare una rete di Centri di Comunità con finalità di protezione civile nei comuni di Norcia, Vallo di Nera, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto che non dispongono di simili strutture anche al fine di sostenere l'integrazione sociale della collettività. **Il progetto è in corso di realizzazione.**

Dopo la primissima presentazione dei progetti alle varie comunità, non poche sono state le difficoltà incontrate tra cui il fatto che alcune amministrazioni individuate tra le beneficiarie – precisamente quelle ricadenti comune nel "cratere" - hanno ritenuto opportuno modificare via via le prime aree individuate. Per alcune aree sono state anche riscontrate non poche problematiche legate a vincoli che non consentivano la realizzazione degli interventi, e così via.

Relativamente ai progetti dei Centri di Comunità, si ricorda che allo stato attuale, ed ormai definitivo, gli stessi sono stati accorpati complessivamente in **cinque Ambiti Territoriali**, che vengono di seguito illustrati:

AMBITO DI INTERVENTO	INTERVENTO	COSTO INTERVENTO IN €
Ambito 1	Norcia: Piediripa, Savelli, Valcaldara	1.066.500,00
Ambito 2	Lotto 1: Vallo di Nera capoluogo (ristrutturazione) e Piedipaterno. Todiano di Preci.	832.000,00
	Lotto 2: Collegiacone di Cascia	324.500,00
Ambito 3	Maltignano di Cascia Monteleone capoluogo	645.000,00
Ambito 4	Preci capoluogo e Montebufo	760.000,00
Ambito 5	Cascia capoluogo (ristrutturazione con adeguamento sismico ex cinema)	479.858,24

Tutti i Centri di comunità, per la natura delle opere e delle fonti di finanziamento, **sono dichiarati interventi "essenziali"** ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 48/2018 - e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 3-bis.1 del decreto legge n.189/2016 - e la loro attuazione doveva avvenire attraverso la redazione del progetto definitivo, per poi procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori attraverso l'istituto dell'appalto integrato ma questo percorso, istituito proprio per dare a questi interventi un processo "accelerato", si è dimostrato in realtà foriero di ritardi, complicazioni e di non partecipazione degli operatori alle procedure di gara.
Il decreto legge n. 76/2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 – e più specificatamente con l'"Attuazione delle norme di Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici ai sensi degli artt.11 e 11-bis L. n.120/2020 e art.3 dell'ordinanza commissariale n.109/2020" con il quale sono state soppresse le parole "sulla base del progetto definitivo" contenute nell'art.14, comma 3-bis del decreto legge n.189/2016 (escludendo di fatto il ricorso all'appalto integrato) ha sicuramente **semplificato il procedimento** e si è quindi provveduto all'estensione del contratto per la redazione del progetto esecutivo, ai progettisti titolari del progetto definitivo. Di seguito si riporta una breve descrizione sullo stato di attuazione di ciascun Ambito Territoriale:

Ambito Territoriale 1
Comune di Norcia: Loc. Piediripa, Savelli e Valcaldara

Per quanto riguarda l'Ambito Territoriale 1, dopo le difficoltà iniziali legate alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori attraverso l'istituto dell'appalto integrato, è stato approvato il progetto esecutivo posto a base di gara ed è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori con l'impresa aggiudicatrice ESSE.CI. srl Unipersonale di Anagni (FR) in data 16 febbraio 2022.
I lavori sono attualmente in corso di esecuzione ed alla data del 31 dicembre 2022 risulta completata la struttura di fondazione per tutti i tre edifici dell'Ambito Territoriale e sono in corso di costruzione le strutture portanti verticali.

Ambito Territoriale 2
Comune di Vallo di Nera: Capoluogo (ristrutturazione) e Loc. Piedipaterno
Comune di Preci: Loc. Todiano
Comune di Cascia: Loc. Collegiacone

Anche per questo Ambito sono state riscontrate problematiche di gara legate all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori attraverso l'istituto dell'appalto integrate. Superata questa fase di criticità, in sede di redazione del progetto esecutivo dell'edificio sito nel comune di Cascia, in località Collegiacone, è emerso che alla luce di quanto disposto dall'art. 15 delle NTA del PAI, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, ha individuato tale area come non compatibile con la localizzazione di una nuova realizzazione in ragione del livello di pericolosità P3 (molto elevata). A seguito di ulteriori specifici **approfondimenti condotti in raccordo con le competenti strutture della Regione Umbria e la stessa Autorità di Bacino** è emerso che la realizzazione del Centro di comunità nel sito di Collegiacone è perseguibile solo dopo un adeguato programma di studio e monitoraggio al fine anche di verificare l'effettiva pericolosità dell'area. In questa ottica, il Comune di Cascia edotto della problematica ed in considerazione del fatto che non è stato possibile individuare un'area alternativa in sito, si è reso disponibile ad affidare a professionista qualificato lo studio dell'area in esame al fine di poter valutare il corretto grado di pericolosità del sito in questione.
Tale attività di studio e monitoraggio condotta dal Comune di Cascia, sta comportando, necessariamente, un aggravio di tempi sulla procedura di appalto dei lavori che non può compromettere il buon esito degli altri interventi ricompresi in questo Ambito Territoriale. Al fine di poter quindi dar seguito alla gara lavori per gli edifici di Vallo di Nera (nuovo edificio Loc. Piedipaterno e ristrutturazione in loc. Capoluogo) e Preci Loc. Todiano sono stati elaborati due distinti Quadri Tecnici Economici (QTE) desunti dalla documentazione progettuale redatta dal professionista incaricato, senza ulteriori costi per la stazione appaltante.
I lavori, per il lotto 1 di Vallo di Nera (nuovo edificio Loc. Piedipaterno e ristrutturazione in loc. Capoluogo) e **Preci Loc. Todiano sono stati affidati** all'impresa N.A.N. Costruzioni srl di Volla (NA) che sta attualmente operando presso l'area di Preci – Todiano dove sono state realizzate le strutture di fondazione ed avviata la fase di costruzione delle strutture portanti, mentre a **Vallo di Nera – Capoluogo è stata avviata la fase di scavo e sbancamento per la realizzazione della struttura di fondazione** della parte di ampliamento dell'edificio esistente. Per l'area di Vallo di Nera – Piedipaterno si è reso necessario attendere l'ultimazione delle attività di rimozione delle linee aeree elettriche e trasmissioni dati presenti sul sito di intervento al fine di rimuovere le interferenze e consentire un corretto avvio dei lavori, avvenuto in data 10 novembre 2022 con la recinzione dell'area di cantiere da parte dell'impresa incaricata.
Per il lotto 2 di Cascia – **Collegiacone sono in corso di valutazione da parte dell'Autorità di Bacino**, le risultanze del monitoraggio svolto dal Comune di Cascia al fine di verificare l'idoneità dell'area. Una volta conclusa la fase di valutazione, si potrà procedere con l'approvazione del progetto esecutivo e con la successiva fase di appalto dei lavori.

Ambito Territoriale 3
Comune di Monteleone di Spoleto: Capoluogo
Comune di Cascia: Loc. Maltignano

Anche per questo Ambito, come per i precedenti, sono state riscontrate problematiche di gara legate all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori attraverso l'appalto integrato riscontrando la mancanza di offerte, nonostante i numerosi operatori economici invitati alla procedura (circa 80).
Il 26 gennaio 2022, comunque, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori con l'A.T.I. formata tra l'impresa SA.FI. ART Srl di Altamura (BA) e S&N Impiantistica Elettrica di Altamura (BA).
I lavori sono iniziati nel mese di aprile 2022 tramite la cantierizzazione e il tracciamento degli edifici. Al 31 dicembre 2022 risulta completata la parte delle strutture orizzontali e verticali in cemento armato per l'edificio di Maltignano, mentre a Monteleone di Spoleto sono in corso di ultimazione le fasi di getto delle strutture verticali e inclinate sommitali in cemento armato.

Ambito Territoriale 4
Comune di Preci: Capoluogo e Loc. Montebufo

Relativamente all'ambito territoriale in questione il Comune di Preci aveva inizialmente individuato due aree conformi, le quali erano già state approvate e pronte per l'inizio della realizzazione degli interventi. Con l'avvento della nuova amministrazione comunale, sono state indicate due nuove aree che hanno comportato una serie di criticità nella fase di progettazione, rendendo necessario un attento studio delle sistemazioni esterne a causa della particolare acclività dei siti scelti dal Comune. Proprio per queste esigenze, il professionista incaricato della progettazione ha dovuto elaborare oltre al progetto definitivo, un propedeutico progetto di fattibilità tecnica ed economica necessario ai fini della valutazione delle possibilità di realizzazione degli edifici. In questa ottica, vista l'area individuata dal Comune di Preci in località **Montebufo**, si è deciso di realizzare un edificio analogo agli altri, ma, valutata anche la modesta popolazione residente nella frazione, con dimensioni in pianta proporzionalmente ridotte.
Al 31 dicembre 2022 risultano **approvati i progetti definitivi** e sono in corso di **elaborazione i progetti esecutivi** da porre a base di gara per la successiva fase dei lavori.

Ambito Territoriale 5
Comune di Cascia: Capoluogo

Per l'Ambito territoriale 5 dal **Comune di Cascia** - che è anche soggetto attuatore per l'ambito specifico - l'amministrazione comunale ha comunicato la decisione di voler addivenire alla realizzazione di un **unico intervento presso il capoluogo** e di non effettuare più il recupero dei due edifici inizialmente previsti (sempre in Cascia capoluogo e nella frazione di Avendita).

Tale scelta è scaturita dal fatto che l'amministrazione comunale ha ritenuto insostenibili le spese di adeguamento a proprio carico delle strutture inizialmente individuate dal momento che in sede di Conferenza regionale sono state date delle prescrizioni vincolanti che avrebbero dovuto portare la classe d'uso degli immobili di tutti i Centri di comunità ad un livello 4, in quanto strategici.

Il nuovo edificio individuato - l'**ex Cinema Europa, sito in piazza San Francesco** – sempre di proprietà dell'amministrazione comunale, **risulta strategicamente più idoneo a svolgere le funzioni richieste per un centro di comunità**, ovvero sia un centro con finalità di protezione civile che un luogo di aggregazione e di ritrovo per la collettività.

Alla data del 31 dicembre 2022 il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza regionale ed **è in corso di elaborazione il progetto esecutivo** da porre a base di gara per la successiva fase dei lavori.

Donazioni per l'APSP Fusconi-Lombrici-Renzi

Nel settembre 2022 sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di una **struttura temporanea in luogo della casa di riposo per gli anziani dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Lombrici-Fusconi Renzi**.
Con il sisma del 2016, infatti, **la struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) di Norcia era stata gravemente danneggiata** e parzialmente demolita nel novembre del 2018.
La **Regione Umbria**, per tale scopo, ha a disposizione complessivi € 1.503.560,89 frutto di donazioni e dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 634/ 2020.
Con determinazione dirigenziale n. 11459/2021 del Servizio Protezione Civile ed emergenze della Regione Umbria, è stata approvata la documentazione progettuale e il 1°febbraio 2022 la Regione Umbria, con determinazione dirigenziale n. 1048 del servizio provveditorato, gare e contratti, ha espletato la gara per la realizzazione della delocalizzazione della casa di riposo affidando i lavori alla ditta "Opera S.r.l. Consolidamenti e Restauri", con sede in Sesto Campano (IS) che ha presentato la migliore offerta, offrendo un ribasso percentuale del 18,235%.
Al 31 dicembre 2022 i **lavori sono in corso**.

5.6. PNRR – Fondo Complementare Aree Sisma Centro Italia 2009-2016

Il 13 Luglio 2021, con Decisione del Consiglio ECOFIN notificata all'Italia dal Segretariato Generale dell'Organo suddetto, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), unitamente ad un allegato in cui vengono definiti gli obiettivi e i traguardi, cadenzati temporalmente, cui ciascun investimento e riforma deve sottostare e al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.
Con successivi decreti attuativi venivano indicate le misure urgenti relative all'istituzione del **Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza** in cui, una parte di tutti gli investimenti previsti venivano riservati ad interventi per le **aree del terremoto del 2009 e del 2016**, con la suddivisione degli stessi in sub-misure e Linee di intervento, a seconda delle caratteristiche tipologiche e di finalità da conseguire degli interventi stessi.
In particolare, per quanto attiene l'Umbria, oltre alle Sub-misure approvate con le ordinanze commissariali nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e n. 3 del 20 dicembre 2021 quali:

- ***A4*** **"Infrastrutture e mobilità"**, ***Linea intervento 4 intitolata*** **"Investimenti sulla rete stradale statale"** con soggetto attuatore l'Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione e soggetto responsabile Ing Fulvio Soccodato di ANAS S.p.a. che per l'Umbria prevedono interventi sulla S.S. 685 "Tre Valli Umbre", nello specifico sul **"Tratto Spoleto-Acquasparta. 2° stralcio: Firenzuola-Acquasparta" per € 7.000.000,00** e per la **"Rettifica tracciato e corsia di arrampicamento tra Borgo Cerreto e Vallo di Nera km 41+500 e km 51+500"** per complessivi **€ 20.000.000,00**;

- ***A4*** **"Infrastrutture e mobilità"**, ***Linea intervento 3 intitolata*** **"Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie"** con soggetto attuatore l'Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione e soggetto Responsabile Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. che per l'Umbria prevedono interventi nelle **Stazioni di Spoleto e Baiano di Spoleto** per complessivi **€.5.000.000,00**;

- ***A4*** **"Infrastrutture e mobilità"**, ***Linea intervento 2 intitolata*** **"Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili"** con soggetto attuatore l'Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione e soggetto responsabile Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. di costo complessivo per l'intera tratta pari ad € 109mln (di cui 50 mln a valere sul Fondo complementare PNRR ed inerente in un primo momento la progettazione e realizzazione degli impianti di terra per produzione, stoccaggio e

distribuzione dell'idrogeno per 22mln, con successiva dotazione del materiale rotabile per il Servizio L'Aquila-Sulmona (28 mln), con la parte residua per il materiale rotabile per il Servizio Terni-L'Aquila (59mln) a carico del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile);

ed a quanto approvato con l' ordinanza commissariale nn. 8 del 30 dicembre 2021 rispettivamente per la sub-misura:

- ***A2*** **"Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"**, ***Linea di intervento n. 1*** **"Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici"**, con soggetto Attuatore l'Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione e soggetto responsabile Agenzia del Demanio, che per l'Umbria prevedono interventi sulla **"ex Caserma Minervio" per € 7.650.000** nel Comune di Spoleto e per la **"Sistemazione delle Marcite 2° stralcio"** per **€ 2.350.000** e **"Sistemazione delle Marcite 3° stralcio"** per **€ 10.650.000** entrambe nel Comune di Norcia;

con le ordinanze commissariali nn. 6-7-9-11 del 30 dicembre 2021 sono state rispettivamente finanziate, per l'Umbria, le seguenti misure ed interventi:

- ***A4*****, "Infrastrutture e mobilità"**, ***Linea di intervento 5, intitolata*** **"Investimenti sulla rete stradale comunale"**, con soggetto attuatore l'Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione, mentre soggetti Responsabili sono i **Comuni** rispettivamente individuati per i propri interventi, per un totale di finanziamento a valere sui fondi PNC pari ad **€ 5.628.000**.

- ***A3*****, "Rigenerazione urbana e territoriale"**, ***Linea di intervento 1, intitolata*** **"Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"**, con soggetto attuatore l'Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione mentre soggetti responsabili sono i **Comuni** rispettivamente individuati per i propri interventi con il supporto del Gruppo Operativo di Lavoro (GOL) designato dal soggetto attuatore, per un totale di finanziamento per l'Umbria a valere sui fondi PNC pari ad **€ 18.760.000**.

- ***A3*****, "Rigenerazione urbana e territoriale"**, ***Linea di intervento 3, intitolata*** **"Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita"**, con soggetto attuatore l'Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione mentre soggetti responsabili sono i

Comuni rispettivamente individuati per i propri interventi con il supporto del Gruppo Operativo di Lavoro (GOL) designato dal soggetto attuatore, per un totale di finanziamento per l'Umbria a valere sui fondi PNC pari ad **€ 10.000.000**.

- ***A3*, "Rigenerazione urbana e territoriale", *Linea di intervento 2*, *intitolata* "Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali",** con soggetto ttuatore l'Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione, mentre soggetto responsabile è la **Regione Umbria**, per un totale di finanziamento a valere sui fondi PNC pari ad **€ 9.750.000.**

Tutti i Comuni della Regione Umbria, grazie al costante coordinamento e **supporto da parte dell'USR Umbria**, hanno centrato l'obiettivo della *milestone* del 31 dicembre 2022.
Solo per un intervento di cui alla Misura A3.1 di **Sellano**, non si è proceduto all'aggiudicazione ma solo all'avvio (rispettando quindi lo stesso la *milestone*) in quanto la prima gara è andata deserta mentre, a seguito di nuova indizione nei termini, ad oggi risulta individuato il contraente e sono in corso le attività di verifica propedeutiche all'aggiudicazione efficace e definitiva.
Per ulteriore riscontro, pure per la misura 3.2 relativa all'**ampliamento di Santo Chiodo Lotto 1**" e al "recupero dell' **ex Mattatoio** - Lotto 2" nel Comune di **Spoleto** ma in capo alla Regione Umbria, dopo una iniziale gara deserta per entrambi (avviata comunque nei tempi della *milestone* del 31 dicembre 2022) si è addivenuti all'espletamento della gara per l'ex Mattatoio - dove sono in corso le attività di verifica per l'aggiudicazione efficace -, mentre scadrà il 28 gennaio 2023 il termine ultimo per la presentazione delle offerte per l'ampliamento di **Santo Chiodo**.

PNRR Fondo complementare
Misura 3.2.

Spoleto, ampliamento deposito
beni culturali di Santo Chiodo

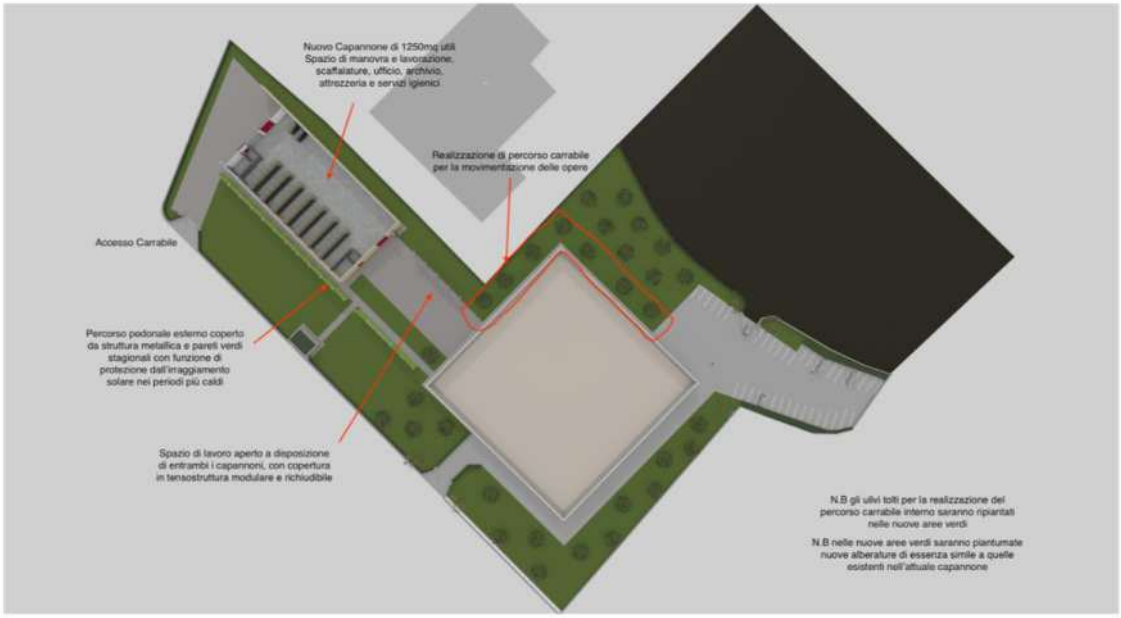

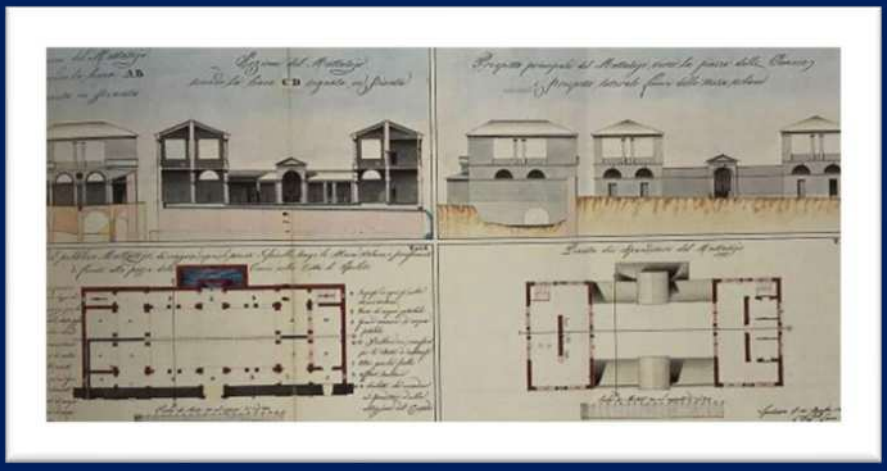

PNRR Fondo complementare Misura 3.2.

Spoleto, recupero ex mattatoio realizzato su progetto dell'ing. Ireneo Aleandri nel 1838. Ampliamento del centro operativo per la conservazione, manutenzione e valorizzazine dei beni storico-artistici e archivistici dell'Umbria.

5.7. Le procedure di gara espletate dall'USR Umbria

Nel 2021, in seguito alla riorganizzazione dell'USR Umbria, con l'ordinanza del Vice Commissario n. 12/2020, è stata creata la sezione 'Gare e Contratti' nell'ambito del Servizio Ricostruzione Pubblica. Nel corso del 2022 sono state espletate le seguenti procedure di gara:

STAZIONE APPALTANTE	SOGGETTO ATTUATORE	OGGETTO	PROCEDURA DI GARA	IMPORTO APPALTO IN €	AGGIUDICAZIONE	DITTA AGGIUDICATRICE
USR Umbria	Regione Umbria	Lavori per l'intervento di "**Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Campi**" in Comune di Norcia (PG) di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 21/11/2020	Procedura negoziata	748.023,33	Determinazione dirigenziale n. 1881 del 01/09/2022	Tecnostrade srl
USR Umbria	Regione Umbria	Lavori relativi all'intervento di "**Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Ancarano Piè la Rocca**" in Comune di Norcia (PG) di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 21/11/2020	Procedura negoziata	900.000,00	Determinazione dirigenziale n. 1785 del 17/08/2022	Cicas srl
USR Umbria	Regione Umbria	Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'**Ospedale di Norcia** danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi di cui all'Ordinanza speciale del Commissario straordinario del Governo n. 11 del 15.07.2021	Procedura negoziata	7.776.504,96	Determinazione dirigenziale n. 2163 del 14/10/2022	Taddei spa

STAZIONE APPALTANTE	SOGGETTO ATTUATORE	OGGETTO	PROCEDURA DI GARA	IMPORTO APPALTO IN €	AGGIUDICAZIONE	DITTA AGGIUDICATRICE
USR Umbria	Regione Umbria	Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Ricostruzione, in sito, dell'**Ospedale Santa Rita di Cascia** (PG)" di cui all'Ordinanza speciale del Commissario straordinario del Governo n. 12 del 15.07.2021	Procedura negoziata	7.808.163,76	Determinazione dirigenziale n. 2625 del 19/12/2022	VI.AM. Infrastrutture srl
USR Umbria	USR Umbria	Lavori "**Ambito territoriale 2** - Lotto 1: realizzazione dei **centri di comunità nel Comune di Vallo di Nera** (PG) in località Capoluogo (Ristrutturazione) e **Piedipaterno, nel Comune di Preci (PG)** in località **Todiano**". O.C. n. 48 del 10/01/2018	Procedura negoziata	658.692	Determinazione dirigenziale n. 244 del 08/02/2022	N.A.N. Costruzioni srl
USR Umbria	USR Umbria	Servizi di progettazione per le fasi di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'attività di monitoraggio area R4 dell'intervento di **"Ripristino della viabilità di accesso al nucleo abitato sul versante nord di Castelluccio di Norcia"** prov. Perugia, di cui all'Ordinanza speciale n. 18 del 15/07/2021.	Affidamento diretto	130.878,59	Determinazione dirigenziale n. 393 del 23/02/2022	Sergio Calabrò
USR Umbria	USR Umbria	Lavori di "Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale della **Scuola primaria e dell'infanzia in via Piermarini a Foligno (PG)** –Ed. storico in muratura", di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 21/11/2020 e a quella Speciale n. 31 del 31.12.2021	Procedura aperta	2.059.904,87	Determinazione dirigenziale n. 1406 del 22/06/2022	Grandi Lavori srl

STAZIONE APPALTANTE	SOGGETTO ATTUATORE	OGGETTO	PROCEDURA DI GARA	IMPORTO APPALTO IN €	AGGIUDICAZIONE	DITTA AGGIUDICATRICE
USR Umbria	USR Umbria	Lavori di **"Consolidamento del corpo stradale SP4 Arronese",** all'altezza del Km.3+908 e 7+682, nel Comune di Arrone (TR)".O.C. 109/2020 (Ordinanza di origine O.C. 37/2017)	Procedura negoziata	278.025,84	Determinazione dirigenziale n. 2333 del 14/10/2021	ICAM srl
USR Umbria	USR Umbria	**Accordo Quadro** con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per i servizi di progettazione, fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico di direzione dei lavori, relativi alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli **"INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG)"**di cui all'Ordinanza speciale n. 18 del 15/07/2021	Accordo quadro	6.110.000	Determinazione dirigenziale n. 2302 del 03/11/2022	S.A.G.I. srl

5.8. Gestione delle macerie

2016

La Regione Umbria, a differenza di quanto fatto da altre regioni, sin dal dicembre 2016, ha predisposto un Piano di gestione delle macerie prevedendo un ciclo integrato di gestione, ovvero dal ritiro al recupero, compresa la gestione dei depositi temporanei, sia al fine di mettere a disposizione dei Comuni materiali inerti riciclati da impiegare gratuitamente nelle opere emergenziali e della ricostruzione, che per evitare frazionamenti e una pluralità di soggetti nella filiera di gestione di questi rifiuti. Inizialmente sono state stimate in Umbria 100.000 tonnellate di macerie (cd pubbliche) da rimuovere e sono stati individuate due aree di deposito temporaneo nel comune di Norcia: una in località Misciano e l'altra nella frazione di Castelluccio.
La materia è disciplinata dall'art. 28 del decreto legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e smi, ed ha consentito alla Regione Umbria di affidare, previo esperimento della verifica preventiva ANAC disposta ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto tra ANAC e Dipartimento Nazionale Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, alla società Valle Umbra Servizi S.p.A. (società che gestisce il servizio di igiene urbana nei Comuni interessati dal sisma) il ciclo integrato delle macerie derivanti dagli eventi sismici, dalla rimozione fino al trattamento delle stesse. La norma in questione D.L. 189/2016, che si incardina nel quadro delle normative attinenti lo stato di emergenza - prorogato a tutto il 31 dicembre 2021 con il decreto legge n. 14 agosto 2020, n. 104 – all'art. 28, commi 7 e 13 bis, i cui termini, sulla base degli emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio, verranno prorogati con l'approvazione della stessa entro il 31.12.2021, prevede specifici limiti temporali in scadenza al 31 dicembre di ogni anno sia per la gestione dei depositi temporanei che per i materiali da scavo e pertanto hanno impedito la sottoscrizione di contratti di durata superiore al 31 dicembre di ogni anno.

2017

Il contratto sottoscritto nel 2017 con la Società Valle Umbra Servizi Spa era pertanto finalizzato alla gestione delle macerie (rimozione, cernita, recupero) fino alla concorrenza di 100.000 tonnellate, come risultanti dalla prima stima, con il termine temporale obbligato del 31 dicembre 2018 in quanto collegato ai termini originariamente stabiliti per la durata dello stato di emergenza.

2018

Alla fine del 2018, dopo una verifica effettuata insieme ai Comuni interessati è emerso, che la stima iniziale di 100.000 tonnellate non era esaustiva e si è proceduto ad aggiornare il Piano di gestione delle macerie (D.D. n. 2236 del 7 marzo 2019 e decreto Vice Commissario n. 24 dell'8 marzo 2019) dal quale sono risultate stimate ulteriori 53.500 tonnellate di macerie ancora da rimuovere, comprensive dei fabbricati ancora da demolire ma non essendo intervenuta la proroga normativa dei termini contenuti all'art. 28 del D.L. 189/2016 non è stato possibile procedere alla prosecuzione del contratto

in essere con la Società Valle Umbra Servizi Spa, la Regione Umbria è stata costretta ad interrompere le operazioni di ritiro delle macerie.

2019

Solo nel luglio 2019, a seguito della proroga dei termini all'art. 28 del D.L. 189/2016 e del decreto del Commissario Straordinario n. 273 del 10 luglio 2019, con le medesime modalità e previa verifica preventiva di ANAC, si è proceduto alla sottoscrizione del nuovo contratto con la Società Valle Umbra Servizi S.p.A. per un quantitativo di macerie pari a 53.500 tonnellate, come risultante dall'aggiornamento del Piano di gestione delle macerie e dai fondi stanziati dalla Struttura Commissariale. Come per il precedente, il contratto con la Società Valle Umbra Servizi S.p.A. ha trovato il suo termine temporale nei limiti imposti dall'articolo 28 del decreto legge n. 189/2016 per la gestione derogatoria delle macerie dalle norme ordinarie dei rifiuti, prorogato al 31 dicembre 2019 coincidente con la scadenza dello stato di emergenza.
Alla data del 31.12.2019, la mancata proroga dei termini di cui all'art. 28 del decreto legge n. 189/2016, oltre a non consentire il differimento del termine a tutto il 31 dicembre 2020 del contratto in essere con VUS e quindi la completa attuazione del Piano di gestione macerie, ha comportato l'impossibilità giuridica di utilizzare i depositi temporanei e, di fatto, il blocco delle attività.

2020

Le attività sono potute riprendere dopo l'emanazione, avvenuta il 28 febbraio 2020, della L. n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", nella quale, all'art. 15 c.7-sexies, i termini di cui all'art. 28 del Dl 189/2016, originariamente fissati al "31.12.2019", sono stati modificati al "31.12.2020".
Pertanto, sulla base del mutato quadro legislativo, la Regione Umbria, al fine di dare completa attuazione all'aggiornamento del Piano di Gestione macerie e previa sottoposizione alla verifica preventiva di ANAC degli atti della procedura, con Determinazione Dirigenziale n. 2432 del 18.03.2020 ha affidato alla Società Valle Umbra Servizi la gestione integrata delle macerie ai fini del completamento della rimozione delle macerie previste nel primo aggiornamento del Piano di gestione, approvato dal Vice Commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 con decreto dell'8 marzo 2019, n. 24.
Successivamente alla modifica dei termini di cui all'art. 28 del decreto legge n. 189/2016 il Comune di Norcia, con Decreti Sindacali n. 7 del 09 marzo 2020 e n. 15 del 04 maggio 2020, ha confermato e prorogato i decreti di occupazione delle aree destinate a deposito temporaneo delle macerie, ubicante in località Misciano e nella frazione di Castelluccio.
In data 16 aprile 2020 si è provveduto a dare avvio all'esecuzione in via d'urgenza del servizio affidato con Determinazione Dirigenziale n. 2432 del 18.03.2020 ed il contratto con la Società Valle Umbra Servizi Spa è stato sottoscritto in data in data 28 maggio 2020, acquisito Raccolta Atti in data 29 maggio 2020 con il n. 5674.

Nel contratto del 2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato chiesto all'Affidatario di aggiornare le procedure di sicurezza relative sia alla gestione dei Depositi temporanei, che delle attività.
Nel mese di settembre 2020, in seguito alle comunicazioni effettuate dai Comuni su richiesta del Commissario Straordinario, il Vice Commissario-Presidente della Regione Umbria, con decreto 21 ottobre 2020 n. 49, ha approvato il "Documento per l'aggiornamento del Piano per la gestione delle macerie a seguito degli eventi sismici a far data dal 24/08/2016. Secondo aggiornamento".
Dalle informazioni fornite dagli Enti e sulla base dell'attuazione del precedente aggiornamento del Piano di Gestione, attraverso la ricognizione delle consistenze catastali ricavate dall'interrogazione del sistema Sister e mediante l'utilizzo di fattori di calcolo indicati dalla Relazione redatta dal ITC Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione e Corpo Nazionale Vigili Del Fuoco, è risultato stimabile un quantitativo di macerie classificate con il CER 200399, ancora da rimuovere, pari a circa 70.200 tonnellate, con conseguente aggiornamento del programma temporale di esecuzione delle attività di gestione del ciclo delle macerie, valutato in base alle potenzialità del momento e sulla base delle attività svolte, in un tempo massimo stimato in ulteriori 24 mesi, con oneri per l'attuazione delle azioni conseguenti all'aggiornamento del Piano di gestione delle macerie e, fatte salve ulteriori esigenze che si dovessero manifestare da parte dei Comuni interessati, stimati sulla base degli allora costi di gestione, in € 5.084.937,00.
L'aggiornamento del Piano di gestione è stato trasmesso in data 22.10.2020 alla Struttura Commissariale.
Sempre nel settembre del 2020 sono state completate le operazioni di rimozione delle macerie all'interno del deposito temporaneo sito presso la frazione di Castelluccio nel Comune di Norica e pertanto il Servizio regionale di Protezione Civile ha avviato un confronto con l'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 al fine di poter ipotizzare ulteriori utilizzi per le attività connesse alla ricostruzione pubblica compatibili con l'area al fine di evitare ulteriore consumo di suolo e impegnare ulteriori risorse pubbliche.
Il Contratto 2020 sottoscritto tra Regione Umbria e società Valle Umbra Servizi S.p.A. si è concluso alla data del 31 dicembre 2020 ed ha consentito di concludere le rimozioni previste dal primo aggiornamento del Piano di gestione approvato dal Vice Commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 con Decreto del 08 marzo 2019, n. 24, con una rimozione di macerie e MCA (materiali contenenti amianto) pari a 16.211,04 tonnellate nel 2019 e 34.974,90 tonnellate nel 2020 per un complessivo di 51.185,94 tonnellate, quale completamento dei provvedimenti riconducibili alla stima approvata nel 2019, per i quali è stata effettuata la necessaria demolizione ed è stata possibile la successiva rimozione. La differenza tra il dato di stima, 53.500 t e le tonnellate effettivamente rimosse, 51.185 t, pari a circa 2.315 t, è riconducibile a macerie per le quali non è stata autorizzata la rimozione da parte dei proprietari e/o macerie non disponibili per mancata demolizione dell'immobile.
Nel dicembre 2020 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016, a fronte dell'Ordinanza Commissariale n. 109 del 21 novembre 2020 e al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria all'affidamento del servizio di smaltimento in corso di predisposizione, ha richiesto l'accesso al fondo istituito con all'art. 11 della stessa Ordinanza n. 109, per un importo di euro

5.084.937,00, necessari per l'attuazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione macerie.
Lo stesso Ufficio, per poter continuare ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività di rimozione e trattamento macerie, in considerazione del fatto che, con l'art. 57, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 era stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, ha altresì segnalato alla Struttura Commissariale la necessità di prorogare a tutto il medesimo termine, quelli contenuti all'art. 28, commi 7 e 13-ter, del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, in scadenza al 31 dicembre 2020.
Così come accaduto per il 2019, anche per il 2020 la proroga dei termini contenuta nel richiamato articolo non è intervenuta entro l'anno; i termini derogatori fino a tutto il 31 dicembre 2021 sono stati individuati ad opera della Legge del 26.02.2021 n. 21, in vigore dal 2 marzo 2021.

2021

Per quanto riguarda il 2021, va evidenziato che il Commissario Straordinario, con proprio decreto n. 160 del 16 aprile 2021 ha ripartito tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le risorse previste all'art. 11 dell'Ordinanza n. 109 del 2020 per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle macerie, in attuazione dell'art. 28, comma 13, del D.L. 189/2016. In particolare, alla Regione Umbria sono stati assegnati € 5.084.937,00. Successivamente, con decreto n. 164 del 16 aprile 2021 il Commissario Straordinario ha disposto il trasferimento di un acconto di € 4.067.949,60, pari all'80% del contributo concesso, sui fondi nella Contabilità Speciale n. 6040 intestata al Presidente della Regione Umbria – Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016.
Nel mese di maggio 2021 e previa sottoposizione alla verifica preventiva di ANAC degli atti della procedura, con Determinazione Dirigenziale n. 4468 del 11.05.2021 la Regione Umbria ha affidato alla Società Valle Umbra Servizi la gestione integrata delle macerie ai fini del completamento della rimozione delle macerie previste nel secondo aggiornamento del Piano di gestione, approvato dal Vice Commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 con decreto del 21 ottobre 2020 n. 49 e avviato le attività di rimozione. Con successivo decreto del Vice Commissario-Presidente della Regione del 15 settembre 2021, n. 6, si è disposto che alla gestione e agli oneri del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie in attuazione dell'articolo 28, comma 13, del decreto legge n. 189/2016, si provvede in regime di contabilità speciale, con le risorse di cui alla contabilità n. 6040, con imputazione al fondo istituito con l'articolo 11 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario 21 novembre 2020, n. 109 autorizzando il Dirigente del Servizio regionale di Protezione Civile ad operare sulla contabilità speciale entro i limiti della disponibilità economica che di volta in volta verrà accreditata dalla Struttura Commissariale.
In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 S.O. n. 49 è stata approvata la proroga dello stato di emergenza a tutto l'anno 2022 e al comma n. 454 sono stati prorogati al 31 dicembre 2022 i termini di cui all'art. 28 del D.L. n. 189/2016 che consentono la gestione delle macerie in questione. Sulla

base delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio, la Regione Umbria, al fine di assicurare la continuità delle attività di gestione macerie, ha provveduto al differimento del termine contrattuale a tutto il 2022, coerentemente con le previsioni dell'affidamento.
Il Commissario del Governo per la ricostruzione con nota prot. n. 62830 del 09.12.2021, ha richiesto l'aggiornamento del Piano di gestione delle macerie. A tal fine, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 ha acquisito dai Comuni interessati le ulteriori esigenze. Dalle informazioni fornite dagli Enti e sulla base dell'attuazione del precedente aggiornamento del Piano di Gestione, è risultato stimabile un quantitativo di macerie classificate con il CER 200399 ancora da rimuovere pari a circa 34.900 tonnellate, fatte salve ulteriori esigenze che si dovessero manifestare da parte dei Comuni interessati.

2022

Facendo seguito alla richiesta del Commissario e sulla base delle esigenze segnate dai Comuni, con decreto del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 del 9 giugno 2022 n. 4 è stato approvato il "Terzo aggiornamento del Piano per la gestione delle macerie a seguito degli eventi sismici a far data dal 24/08/2016". L'aggiornamento del Piano di gestione è stato trasmesso alla struttura Commissariale ai fini dell'acquisizione del necessario finanziamento, per il quale, anche a seguito di sollecito non sono pervenuti riscontri.
Dall'avvio delle attività riferite al contratto 2021 sono state rimosse 62.403 tonnellate di macerie, mentre complessivamente ne risultano rimosse un quantitativo di circa 213.655 tonnellate. La differenza tra il dato di stima, 70.200 t e le tonnellate effettivamente rimosse 62.403 t, pari a circa 7.797 t, è riconducibile a macerie per le quali non è stata autorizzata la rimozione da parte dei proprietari e/o macerie non disponibili per mancata demolizione degli immobili, anche a seguito di successive comunicazione da parte dei Comuni.
Al 31 dicembre 2022 le attività di rimozione delle macerie effettuate nei singoli comuni del cratere dall'avvio del contratto – maggio 2021 -, sono le seguenti:

Comune	Autorizzazioni emesse per la rimozione delle macerie	Quantità macerie raccolte (t) (arrotondato alla decina)
Norcia	47	48.575
Cascia	7	11.685
Preci	2	1.567
Monteleone di Spoleto	1	486
Rimozione amianto		89

6. Le risorse economiche

6.1.La contabilità speciale n. 6040

Il decreto legislativo n. 189/2016 ha stanziato importanti risorse per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, così come per gli interventi a sostegno del tessuto imprenditoriale, degli enti locali e al reddito dei lavoratori.
In attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189/2016 è stata aperta presso la Tesoreria dello Stato di Perugia, in data 12 gennaio 2017, la contabilità speciale n. 6040 intestata a "VC PRES REG UMBRIA DL 189-2016".
Nella sottostante tabella è riepilogata la situazione contabile degli incassi e dei pagamenti effettuati nel corso del 2022, suddivisi per finalità d'intervento in relazione alla norma giuridica di riferimento:

Saldo cassa iniziale	€ 33.275.285,32

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA

RIFERIMENTI NORMATIVI	FINALITÀ	INCASSATO NEL 2022 €	PAGATO NEL 2022 €	SALDO CASSA AL 31/12/2022 €
Interventi pubblici		**50.277.755,38**	**26.691.364,26**	**23.586.391,12**
OC.23/2017	Messa in sicurezza edifici di culto	-	46.466,79	**- 46.466,79**
OC.32/2017	Messa in sicurezza edifici di culto - 2° programma	2.611,50	96.847,85	**- 94.236,35**
OC.38/2017	Riparazione edifici di culto	1.470.000,00	177.688,45	**1.292.311,55**
OC.39/2017	Pianificazione attuativa	-	-	**-**
OC.51/2018	Interventi precedenti sismi	-	54.579,86	**- 54.579,86**
OC.61/2018	Edifici di proprietà mista pubblica-privata	21.914,22	85.938,25	**- 64.024,03**
OC.77/2019	Aree attrezzate per finalità turistiche	-	221.645,40	**- 221.645,40**
OC.105/2020	Ricostruzione edifici di culto	72.000,00	72.000,00	**-**
OC.107/2020	Programmi Speciali Ricostruzione PSR	-	20.361,68	**- 20.361,68**
OC.109/2020 (comprende ex OC.27/2017, 33/2017,	Elenco unico delle opere pubbliche	18.938.365,15	3.001.902,71	**15.936.462,44**

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA				
RIFERIMENTI NORMATIVI	FINALITÀ	INCASSATO NEL 2022 €	PAGATO NEL 2022 €	SALDO CASSA AL 31/12/2022 €
37/2017 e 56/2018)				
OSC.10/2021	Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi	3.153.885,16	3.153.885,16	-
OSC.11/2021	Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia	5.485.794,37	5.485.794,37	-
OSC.12/2021	Interventi di ricostruzione nel comune di Cascia	3.824.000,00	3.824.000,00	-
OSC.18/2021	Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia	2.268.241,64	80.689,04	**2.187.552,60**
OSC.27/2021	Ricostruzione immobili pubblici del patrimonio dell'Agenzia del Demanio	1.796.400,00	-	**1.796.400,00**
OSC.31/2021 (in parte ex OC.109/2020, 56/2018, 33/2017)	Recupero delle strutture scolastiche	-	53.164,70	**- 53.164,70**
Ord.PNC 17/2022	Ordinanza del Piano Nazionale Complementare al PNRR	13.241.400,00	10.316.400,00	**2.925.000,00**
	Rimborso spese pubblicazione gare	3.143,34	-	**3.143,34**
Interventi pubblici finanziati con liberalità		**-**	**517.526,45**	**-**
OC.48/2017	Interventi finanziati con sms solidali	-	517.526,45	**- 517.526,45**
Interventi e contributi a soggetti privati		**-**	**79.030,40**	**- 79.030,40**
OC.21/2017	Depositi / traslochi	-	79.030,40	**- 79.030,40**
Interventi per le attività produttive		**880.978,90**	**3.813.228,42**	**- 2.932.249,52**
OC.9/2016	Delocalizzazioni temporanee attività economiche	876.475,24	390.871,29	**485.603,95**
DL.189/2016 Art. 20bis	Contributi per la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva	4.503,66	2.705.797,77	**- 2.701.294,11**
DL.189/2016 Art. 20	Contributi alle imprese per investimenti produttivi	-	716.559,36	**- 716.559,36**

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA				
RIFERIMENTI NORMATIVI	FINALITÀ	INCASSATO NEL 2022 €	PAGATO NEL 2022 €	SALDO CASSA AL 31/12/2022 €
Spese di funzionamento allestimento		**-**	**148.309,49**	**- 148.309,49**
OC.26/2017 e ss	Spese di funzionamento - allestimento	-	143.042,17	**- 143.042,17**
Cofinanziamento Regione Umbria	Spese di funzionamento - allestimento	-	5.267,32	**- 5.267,32**
Spese per il personale		**2.611.400,00**	**4.271.948,34**	**- 1.660.548,34**
OC.22/2017 DL.189/2016 art. 3	Personale comandato presso **USR** da Regione e altri Enti pubblici oppure assunto con forme flessibili	-	1.494.730,28	**- 1.494.730,28**
DL.189/2016 art. 50	Personale in comando presso la Struttura Commissariale e assegnato presso **USR** Umbria	-	6.224,51	**- 6.224,51**
OC.22/2017 DL.189/2016 art. 50bis	Personale assunto a tempo determinato presso **Comuni** del cratere sismico e **Province** dell'Umbria	2.611.400,00	2.270.989,26	**340.410,74**
OC.96/2020 DL.189/2016 Art.50bis c.1ter	Personale assunto a tempo determinato presso **URS** e **Comuni** del cratere sismico	-	500.004,29	**- 500.004,29**
Altri interventi		**2.418.363,29**	**4.962.927,03**	**- 2.544.563,74**
D.L. 189/2016art. 28, c.13	Rimozione macerie	-	2.878.984,71	**- 2.878.984,71**
OC.29/2017	Contributi redazione schede AEDES	-	-	**-**
O.C. 94/2020	Anticipazioni professionisti della ricostruzione privata	2.386.907,17	1.884.078,88	**502.828,29**
	Operazioni non andate a buon fine	31.456,12	31.456,12	
	Versamento IVA da dicembre 2021 a gennaio 2022	-	168.407,32	**- 168.407,32**
	TOTALE	**56.188.497,57**	**40.484.334,39**	**15.704.163,18**

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA				
RIFERIMENTI NORMATIVI	FINALITÀ	INCASSATO NEL 2022 €	PAGATO NEL 2022 €	SALDO CASSA AL 31/12/2022 €
Saldo cassa finale €	48.979.448,50			

Fonte: USR-Umbria

I maggiori pagamenti effettuati rispetto alle relative fonti di finanziamento, come riportati nella tabella, sono dati dall'osservanza della pec n.0003415 del 4 marzo 2019 con cui il Commissario Straordinario ha inviato una **nota esplicativa del corretto utilizzo delle somme della contabilità speciale sisma Centro Italia** nella quale si dispone che "allo scopo di **evitare che importanti somme restino vincolate e inutilizzate per lunghi periodi e per più esercizi nelle casse della contabilità speciale**, ove se ne ravvisasse la necessità, si invitano gli Uffici speciali ad utilizzare le risorse già trasmesse e giacenti, anche se versate per altra tipologia di spesa".
Nella sottostante tabella è riepilogata la situazione contabile complessiva al 31 dicembre 2022:

Saldo cassa iniziale	€ 33.275.285,32

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA				
RIFERIMENTI NORMATIVI	FINALITÀ	TOT. ENTRATE AL 31/12/2022	TOT. USCITE AL 31/12/2022	SALDO CASSA AL 31/12/2022
Interventi pubblici		101.096.742,48	65.377.890,43	35.718.852,05
OC.23/2017	Messa in sicurezza edifici di culto	3.408.058,51	2.905.532,24	**502.526,27**
OC.32/2017	Messa in sicurezza edifici di culto - 2° programma	3.092.116,94	2.877.238,33	**214.878,61**
OC.38/2017	Riparazione edifici di culto	5.420.000,00	3.950.000,00	**1.470.000,00**
OC.39/2017	Pianificazione attuativa	377.937,16	304.714,02	**73.223,14**
OC.51/2018	Interventi precedenti sismi	2.400.000,00	54.579,86	**2.345.420,14**
OC.61/2018	Edifici di proprietà mista pubblica-privata	799.865,80	311.734,56	**488.131,24**
OC.77/2019	Aree attrezzate per finalità turistiche	560.000,00	224.603,63	**335.396,37**
OC.105/2020	Ricostruzione edifici di culto	7.740.000,00	7.740.000,00	-
OC.107/2020	Programmi Speciali Ricostruzione PSR	209.910,00	52.266,43	**157.643,57**
OC.109/2020 (comprende ex OC.27/2017, 33/2017, 37/2017 e 56/2018)	Elenco unico delle opere pubbliche	32.679.641,84	9.442.831,10	**23.236.810,74**
OSC.10/2021	Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel	3.153.885,16	3.153.885,16	-

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA				
RIFERIMENTI NORMATIVI	FINALITÀ	TOT. ENTRATE AL 31/12/2022	TOT. USCITE AL 31/12/2022	SALDO CASSA AL 31/12/2022
	Comune di Preci ed altri interventi			
OSC.11/2021	Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia	20.081.938,23	20.081.938,23	-
OSC.12/2021	Interventi di ricostruzione nel comune di Cascia	3.824.000,00	3.824.000,00	-
OSC.18/2021	Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia	2.268.241,64	80.689,04	**2.187.552,60**
OSC.27/2021	Ricostruzione immobili pubblici del patrimonio dell'Agenzia del Demanio	1.796.400,00	-	**1.796.400,00**
OSC.31/2021 (in parte ex OC.109/2020, 56/2018, 33/2017)	Recupero delle strutture scolastiche	35.890,73	53.164,70	**- 17.273,97**
Ord.PNC 17/2022	Ordinanza del Piano Nazionale Complementare al PNRR	13.241.400,00	10.316.400,00	**2.925.000,00**
	Rimborso spese pubblicazione e cauzioni gare	7.456,47	4.313,13	**3.143,34**
Interventi pubblici finanziati con liberalità		**1.870.848,58**	**1.302.057,29**	**568.791,29**
OC.48/2017	Interventi finanziati con sms solidali	1.870.848,58	1.302.057,29	**568.791,29**
Interventi e contributi a soggetti privati		**2.837.040,00**	**630.880,91**	**2.206.159,09**
OC.21/2017	Depositi / traslochi	2.837.040,00	630.880,91	**2.206.159,09**
Interventi per le attività produttive		**17.539.785,03**	**11.768.972,86**	**5.770.812,17**
OC.9/2016	Delocalizzazioni temporanee attività economiche	2.880.543,24	2.545.833,54	**334.709,70**
DL.189/2016 Art. 20bis	Contributi per la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva	9.759.241,79	7.780.452,25	**1.978.789,54**
DL.189/2016 Art. 20	Contributi alle imprese per investimenti produttivi	4.900.000,00	1.442.687,07	**3.457.312,93**

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 USR UMBRIA				
RIFERIMENTI NORMATIVI	FINALITÀ	TOT. ENTRATE AL 31/12/2022	TOT. USCITE AL 31/12/2022	SALDO CASSA AL 31/12/2022
Spese di funzionamento - allestimento		**837.333,30**	**919.988,40**	**- 82.655,10**
OC.26/2017 e ss	Spese di funzionamento - allestimento	732.333,30	854.277,63	**- 121.944,33**
Cofinanziamento Regione Umbria	Spese di funzionamento - allestimento	105.000,00	65.710,77	**39.289,23**
Spese per il personale		**21.628.753,17**	**24.306.784,66**	**- 2.678.031,49**
OC.22/2017 DL.189/2016 art. 3	Personale comandato presso **USR** da Regione e altri Enti pubblici oppure assunto con forme flessibili	7.251.254,46	8.673.193,49	**- 1.421.939,03**
DL.189/2016 art. 50	Personale in comando presso la Struttura Commissariale e assegnato presso **USR** Umbria	206.309,89	220.868,45	**- 14.558,56**
OC.22/2017 DL.189/2016 art. 50bis	Personale assunto a tempo determinato presso **Comuni** del cratere sismico e **Province** dell'Umbria	14.171.188,82	14.883.748,66	**- 712.559,84**
OC.96/2020 DL.189/2016 Art.50bis c.1ter	Personale assunto a tempo determinato presso **URS** e **Comuni** del cratere sismico	-	528.974,06	**- 528.974,06**
Altri interventi		**29.323.424,08**	**21.847.903,59**	**7.475.520,49**
D.L. 189/2016art. 28, c.13	Rimozione macerie	12.018.120,37	11.465.259,21	**552.861,16**
OC.29/2017	Contributi redazione schede AEDES	66.000,00	9.481,61	**56.518,39**
O.C. 94/2020	Anticipazioni professionisti della ricostruzione privata	17.239.303,71	10.373.162,77	**6.866.140,94**
	Operazioni non andate a buon fine	31.456,12	31.456,12	-
	TOTALE	**175.133.926,64**	**126.154.478,14**	**48.979.448,50**
SALDO CASSA FINALE €	**€48.979.448,50**			

Fonte: USR-Umbria

Nella tabella che segue viene rappresentato l'andamento delle **entrate**:

CONTABILITÀ SPECIALE 6040 – VICE COMMISSARIO UMBRIA	
Entrate importi in €	
2017	19.842.511,00
2018	14.362.348,11
2019	14.803.167,20
2020	20.491.043,86
2021	49.477.815,02
2022	56.188.497,57
TOTALE	**175.165.382,76**

Fonte: USR-Umbria

Nel 2022 si è registrato l'importo di entrata più elevato di sempre, dovuto principalmente al **trasferimento di risorse per la ricostruzione delle scuole e degli ospedali**, oltre che di parte dei **fondi relativi al Piano Nazionale Complementare al PNRR.**
Qui di seguito un dettaglio dei **trasferimenti più rilevanti** e non complessivi, **incassati nel corso del 2022**:

DESCRIZIONE	INCASSATO NEL 2022 IN €
Preci - Cimitero di Sant'Eutizio (OCS.10 EX OC.109/2020 ex OC.37/2017)	590.424,80
Preci - Piediv alle - Abbazia Sant'Eutizio (OC.105/2020 ora OCS.10/2021)	2.563.460,36
Norcia - Ospedale (OCS.11 /2021 ex OC.109/2020 ex OC.56/2017)	3.760.000,00
Mura urbiche - Porta Ascolana - Norcia - (OCS.11 /2021 ex OC.109/2020 ex OC.37/2017)	360.000,00
Mura urbiche - Porta Romana – Norcia - (OCS.11 /2021 ex OC.109/2020 ex OC.37/2017)	600.000,00
Mura Urbiche - tratto di mura tra Porta Romana e Porta Orientale - NORCIA - (OCS.11/2021)	765.794,37
Cascia - Ospedale (OCS.12/2021 ex OC.109/2020 ex OC. 56/2018)	3.824.000,00
Regione Umbria - Centro Beni Culturali di Spoleto - Loc. Santo Chiodo - Lotto 1 Ampliamento edificio (Ord. PNC 17/2022)	1.500.000,00
Regione Umbria - Centro Beni Culturali di Spoleto - Lotto 2 Recupero edificio Ex Mattatoio (Ord. PNC 17/2022)	1.425.000,00
Comune di Arrone - Via Marconi - Riqualificazione di spazi aperti (Ord. PNC 17/2022)	360.000,00
Comune di Arrone - Via Piè d'Arrone - Riqualificazione impianto natatorio e campo di calcio comunale - II Stralcio (Ord. PNC 17/2022)	450.000,00
Comune di Arrone - Strada comunale di Buonacquisto - Manutenzione straordinaria e messa in sicur. (Ord. PNC 17/2022)	61.500,00
Comune di Arrone - Via/Strada di San Francesco - Realizzazione marciapiedi e pista ciclabile (Ord. PNC 17/2022)	60.000,00
Comune di Cascia - Connessione pedonale Via Roma con Viale S. Rita (Ord. PNC 17/2022)	360.000,00

DESCRIZIONE	INCASSATO NEL 2022 IN €
Comune di Cascia, Ciclovia Cascia Serravalle, 2 Stralcio SS. 320 di Cascia (Ord. PNC 17/2022)	774.687,30
Comune di Cascia, Strada comunale Via della Tintarella - Sistemazione (Ord. PNC 17/2022)	121.500,00
Comune di Cerreto di Spoleto, Capoluogo e Borgo, Pavimentazioni stradali, zone verdi e sportive, arredo urbano (Ord. PNC 17/2022)	330.000,00
Comune di Cerreto di Spoleto, Bugiano, Rocchetta e Ponte, Pavimentazioni stradali, infrastrutture, verde pubblico (Ord. PNC 17/2022)	90.000,00
Comune di Cerreto di Spoleto - Via Vittime del terrorismo - Realizzazione piscina d'uso pubblico, sistemazione spazi esterni (Ord. PNC 17/2022)	120.000,00
Comune di Cerreto di Spoleto - Strade comunali di Nortosce, Casa Bruciata e Narvia - Pavimentazioni stradali (Ord. PNC 17/2022)	108.000,00
Comune di Ferentillo - `C'Entro Ferentillo` Localita' Il Piano - Rigenerazione dello spazio pubblico urbano (Ord. PNC 17/2022)	315.000,00
Comune di Ferentillo - Realizzazione campi sportivi (Ord. PNC 17/2022)	315.000,00
Comune di Ferentillo - Via Umbria - Realizzazione di nuova viabilità carrabile (Ord. PNC 17/2022)	108.000,00
Comune di Montefranco - Piazza E. Sbarretti e Pista Ciclabile/Pedonale su Via S.P. Arronese/Strada comunale della Villetta (Ord. PNC 17/2022)	540.000,00
Comune di Montefranco - Via dello Stadio - Ammodernamento impianto sportivo (Ord. PNC 17/2022)	145.500,00
Comune di Montefranco - Via dello Stadio - Rifacimento manto stradale (Ord. PNC 17/2022)	108.000,00
Comune di Monteleone di Spoleto - Località Butino di Montelone di Spoleto - Rigenerazione dello spazio urbano (Ord. PNC 17/2022)	285.000,00
Comune di Monteleone di Spoleto - Miglioramento dell'accessibilità delle Frazioni più isolate (Ord. PNC 17/2022)	99.000,00
Comune di Norcia - Dalle Sorgenti di San Martino - Aree verdi - Nuovo Camminamento Nursino, da Porta Valledonna a Porta Orientale - Sistemazione verde pubblico (Ord. PNC 17/2022)	360.000,00
Comune di Norcia - Campo sportivo Cetronella- Realizzazione pista di atletica, gradinate e manto sintetico (Ord. PNC 17/2022)	390.000,00
Comune di Norcia - Nuovo polo sportivo Viale Lombrici - Realizzazione campi sportivi polivalenti (Ord. PNC 17/2022)	195.000,00
Comune di Norcia - Strade comunali di Forsivo-Cortigno, Nottoria, Norcia-Popoli - Manutenzione straordinaria strada comunale (Ord. PNC 17/2022)	123.000,00
Comune di Poggiodomo - Via del Colle - Manutenzione straordinaria del campo sportivo e giardini pubblici (Ord. PNC 17/2022)	240.000,00
Comune di Poggiodomo - Strade comunali delle Frazioni - Rifacimento del sottofondo stradale e della pavimentazione (Ord. PNC 17/2022).	84.000,00
Comune di Polino - Piazza Marconi zona sotto le mura/Antico Mulino, Via Casale, Piazza Marconi - Recupero percorso con passerella e rigenerazione aree comunali (Ord. PNC 17/2022)	240.000,00
Comune di Polino - Via Casale, IV Novembre, Via S. Rita, Sargiola, Le Lame, Prato Manente, Fonte Fuga, Doganale - Messa in sicur. e fruibilita' della rete stradale (Ord. PNC 17/2022)	84.000,00
Comune di Preci - Rifacimento di pavimentazione di strade e piazze e riqualificazione dell'ingresso dell'abitato e dell'arredo urbano (Ord. PNC 17/2022)	330.000,00
Comune di Preci - Territorio comunale - Strade, piste cilabili, impianti sportivi colonnine di ricarica, segnaletica, E-bike Etc. (Ord. PNC 17/2022)	374.749,50
Comune di Preci - Strada comunale Preci Faito - Lotto Funzionale 1 - Rifacimento dell'asfaltatura, sistemazione delle cunette (Ord. PNC 17/2022)	112.500,00
Comune di S. Anatolia di Narco - Loc. Renare - Realizzazione Centro attrazione turistica (Ord. PNC 17/2022)	270.000,00
Comune di S. Anatolia di Narco - Strade comunali di Tassinare, la Pia, Agianetta, Sant'Anatolia-Scheggino, Grotti, Casale delle Macch - Manutenzione straordinar (Ord. PNC	94.500,00

DESCRIZIONE	INCASSATO NEL 2022 IN €
17/2022)	
Comune di Scheggino - Riqualificazione piazze, pubbliche vie e infrastrutture sociali (Ord. PNC 17/2022)	270.000,00
Comune di Scheggino - Loc- Valcasana-Scheggino Capoluogo - Ammodernamento e messa in sicur. impianti sportivi (Ord. PNC 17/2022)	180.000,00
Comune di Scheggino - Strada comunale Contaglia-Collefabbri-Schioppo e Strada comunale Osteria-Cimitero Civitella-Civitella - Riqualificazione della sede stradale (Ord. PNC 17/2022)	94.500,00
Comune di Sellano - Loc. Montesanto a Sellano - Realizzazione di ponte pedonale (Ord. PNC 17/2022)	420.000,00
Comune di Sellano - Loc. Montesanto - Restauro e risanamento conservativo delle mura e della Rocca (Ord. PNC 17/2022)	90.000,00
Comune di Sellano - Rifacimento della pavimentazione di accesso (Ord. PNC 17/2022)	90.000,00
Comune di Sellano - Rifacimento Campi Sportivi comunali e Impianti di Illuminazione (Ord. PNC 17/2022)	175.063,20
Comune di Sellano - Località di Setri, Peneggi, Montesanto, Orsano, Cammoro, Petrognano, Morro - Rifacimento del Sottofondo Stradale (Ord. PNC 17/2022)	123.000,00
Comune di Spoleto - Frazioni di Bazzano, Azzano, Poreta - Riqualificazione spazi aperti pubblici (Ord. PNC 17/2022)	249.075,00
Comune di Spoleto - Eggi e San Giacomo - Riqualificazione spazia aperti pubblici (Ord. PNC 17/2022)	216.675,00
Comune di Spoleto - Loc. Monteluco - Riqualificazione spazia aperti pubblici (Ord. PNC 17/2022)	182.250,00
Comune di Spoleto - Strade comunali di Aree periferiche / Frazioni - Interventi di messa in sicur. (Ord. PNC 17/2022)	212.400,00
Comune di Vallo di Nera - Rigenerazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture verdi e sportive delle frazioni (Ord. PNC 17/2022)	270.000,00
Comune di Vallo di Nera - Strada comule San Pietro - Messa in sicur. e ripristino delle scarpate e del corpo stradale (Ord. PNC 17/2022)	94.500,00
Consolidamento versante nord del centro storico di Castelluccio di Norcia (OCS.18/2021)	400.000,00
Ripristino viabilità di accesso al nucleo abitato versante nord di Castelluccio di Norcia (OCS.18/2021)	1.033.650,00
Spese di Progettazione - Centro storico di Castelluccio di Norcia (OCS.18/2021)	834.591,64
Ag. Demanio per Cerreto di spoleto - Triponzo stazione ferroviaria (OCS.27/2021)	156.000,00
Ag. Demanio per Norcia - Serravalle magazzino merci stazione ferroviaria (OCS.27/2021)	55.200,00
Ag. Demanio per Norcia - stazione ferroviaria (OCS.27/2021)	268.000,00
Ag. Demanio per Sant'Anatolia di Narco - Castel San Felice casello ferroviario (OCS.27/2021)	52.000,00
Ag. Demanio per Spoleto - deposito officina ferroviaria (OCS.27/2021)	552.000,00
Ag. Demanio per Spoleto - fabbricato ferroviario per viaggiatori (OCS.27/2021)	440.000,00
Ag. Demanio per Spoleto - Caprareccia stazione ferroviaria (OCS.27/2021)	186.000,00
Ag. Demanio per Spoleto - magazzino ferroviario merci (OCS.27/2021)	87.200,00
Norcia - Frascaro - Chiesa S. Antonio Abate (OC.38/2017)	1.200.000,00

DESCRIZIONE	INCASSATO NEL 2022 IN €
Scheggino - Ceselli - Chiesa San Michele Arcangelo (OC.38/2017)	90.000,00
Vallo Di Nera - Chiesa S. Giovanni Battista (OC.38/2017)	180.000,00
Ediliz. mista pubb./priv. - Via del Lavoro, 1 (Coccia Gianni) MUDE 100540350000020668202O - NORCIA (OC.61/2018)	21.914,22
Spoleto - Chiesa Sant'Omobono (OC.105/2020 e Dec. 47/2022)	72.000,00
Foligno - Scuola Infanzia\Primaria Piermarini - Ed. muratura (OC.109/2020 ex 33/2017)	2.552.223,63
Norcia - Ancarano Capo del Colle: coni detritici (OC.109/2020 ex OC.64/2018)	800.000,00
Norcia - Ancarano Pie La Rocca: coni detritici/ribaltamento (OC.109/2020 ex OC.64/2018)	900.000,00
Norcia - Campi: frana da crollo/scivolamenti (OC.109/2020 ex OC.64/2018)	1.000.000,00
Città di Castello - IIS Polo Tecnico `Franchetti-Salviani` ITIS Edificio originario (OC.109/2020 ex OC. 56/2018)	4.400.000,00
Perugia - Istituto Magistrale `A. Pieralli` (OC.109/2020 ex 33/2017)	6.342.530,22
Centro salute ASL e attività commerciali – Cerreto di Spoleto - (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	267.361,91
Mura urbiche di via Aldo Bologni - Montone - (OC.109/2020 ex OC. 37/2017)	219.690,00
Rocca Museo dell'Appennino Umbro - Polino - (OC.109/2020 ex OC. 37/2017)	31.680,00
Frana su strada comunale San Martino - Sant'Anatolia di Narco - (OC.109/2020 ex OC. 56/2018)	360.000,00
Basilica di San Salvatore - SPOLETO - (OC.109/2020 ex OC. 56/2018)	1.200.000,00
Scuola Primaria `Don Milani` - Palestra - TERNI - (OC.109/2020 ex OC. 33/2017)	208.138,14
Palazzo Comunale in Piedipaterno - VALLO DI NERA - (OC.109/2020 ex OC. 56/2018)	656.741,25
Trasf. corr. da PCM per Personale - Tempo Determinato presso EE.LL. terremotati (Art.50 bis DL 189/2016 comma 1 - OC 22/2017)	2.386.907,17
Trasf. corr. da PCM per Attività Produttive - Contributi per la delocalizzazione delle imprese (OC.9/2016)	2.611.400,00
Restituzione dell'anticipo per spese di progettazione della Ricostruzione privata - Somme anticipate per conto del Commissario (OC.94/2020)	876.475,24

Fonte: USR-Umbria

Nella tabella che segue viene rappresentato l'andamento delle **uscite**:

CONTABILITÀ SPECIALE 6040 – VICE COMMISSARIO UMBRIA	
Entrate importi in €	
2017	1.101.407,67
2018	5.260.070,47
2019	5.776.052,04
2020	19.360.082,18
2021	44.203.987,51
2022	40.484.334,39
TOTALE	**126.185.934,26**
	Fonte: USR-Umbria

Anche le **uscite del 2022** sono in parte legate ai trasferimenti registrati in entrata per la ricostruzione degli ospedali, chiese e fondi del PNC, ci sono poi pagamenti rilevanti per il servizio di rimozione delle macerie, i contributi alle imprese e le anticipazioni ai progettisti della ricostruzione privata.
Di seguito un dettaglio dei **pagamenti più rilevanti** e non complessivi, effettuati nel corso del 2022:

DESCRIZIONE	PAGATO NEL 2022 IN €
Regione Umbria - Preci - Cimitero di Sant'Eutizio (OSC.10 EX OC.109/2020 ex OC.37/2017)	590.424,80
Diocesi Spoleto-Norcia - Preci - Piedivalle - Abbazia Sant'Eutizio (OSC.10/2021 ex OC.105/2020)	2.563.460,36
Regione Umbria - Norcia - Ospedale di Norcia (OSC.11/2021 ex OC.109/2020 ex OC.56/2018)	3.760.000,00
Comune di NORCIA Mura urbiche - Porta Ascolana (OSC.11 /2021 ex OC.109/2020 ex OC.37/2017)	360.000,00
Comune di NORCIA Mura urbiche - Porta Romana (OSC.11 /2021 ex OC.109/2020 ex OC.37/2017)	600.000,00
Comune di NORCIA Mura Urbiche - tratto di mura tra Porta Romana e Porta Orientale (OSC.11/2021)	765.794,37
Regione Umbria - Cascia - Ospedale di Cascia (OCS.12/2021 ex OC.109/2020 ex OC. 56/2018)	3.824.000,00
Comune di Arrone - Via Marconi - Riqualificazione di spazi aperti (Ord. PNC 17/2022)	360.000,00
Comune di Arrone - Via Piè d'Arrone - Riqualificazione impianto natatorio e campo di calcio comunale - II Stralcio (Ord. PNC 17/2022)	450.000,00
Comune di Arrone - Strada comunale di Buonacquisto - Manutenzione straordinaria e messa in sicur. (Ord. PNC 17/2022)	61.500,00
Comune di Arrone - Via/Strada di San Francesco - Realizzazione marciapiedi e pista ciclabile (Ord. PNC 17/2022)	60.000,00
Comune di Cascia - Connessione pedonale Via Roma con Viale S. Rita (Ord. PNC 17/2022)	360.000,00
Comune di Cascia - Ciclovia Cascia Serravalle - 2° Stralcio SS. 320 di Cascia (Ord. PNC 17/2022)	774.687,30
Comune di Cascia - Ciclovia Cascia Serravalle - 2° Stralcio SS. 320 di Cascia (Ord. PNC 17/2022)	121.500,00
Comune di Cerreto di Spoleto - Cerreto Capoluogo e Borgo Cerreto - Pavimentazioni stradali, zone verdi e sportive, arredo urbano (Ord. PNC 17/2022)	330.000,00
Comune di Cerreto di Spoleto - Bugiano, Rocchetta e Ponte - Pavimentazioni stradali, infrastrutture, verde pubblico (Ord. PNC 17/2022)	90.000,00
Comune di Cerreto di Spoleto - Via Vittime del terrorismo - Realizzazione piscina d'uso pubblico, sistemazione spazi esterni (Ord. PNC 17/2022)	120.000,00
Comune di Cerreto di Spoleto - Strade comunali di Nortosce, Casa Bruciata e Narvia - Pavimentazioni stradali (Ord. PNC 17/2022)	108.000,00
Comune di Ferentillo - `C'Entro Ferentillo` Localita' Il Piano - Rigenerazione dello spazio pubblico urbano (Ord. PNC 17/2022)	315.000,00
Comune di Ferentillo - Realizzazione campi sportivi (Ord. PNC 17/2022)	315.000,00
Comune di Ferentillo - Via Umbria - Realizzazione di nuova viabilità carrabile (Ord. PNC 17/2022)	108.000,00
Comune di Montefranco - Piazza E. Sbarretti e Pista Ciclabile/Pedonale su Via S.P. Arronese/Strada comunale della Villetta (Ord. PNC 17/2022)	540.000,00

DESCRIZIONE	PAGATO NEL 2022 IN €
Comune di Montefranco - Via dello Stadio - Ammodernamento impianto sportivo (Ord. PNC 17/2022)	145.500,00
Comune di Montefranco - Via dello Stadio - Rifacimento manto stradale (Ord. PNC 17/2022)	108.000,00
Comune di Monteleone di Spoleto - Località Butino di Montelone di Spoleto - Rigenerazione dello spazio urbano (Ord. PNC 17/2022)	285.000,00
Comune di Monteleone di Spoleto - Miglioramento dell'accessibilità delle Frazioni più isolate (Ord. PNC 17/2022)	99.000,00
Comune di Norcia - Dalle Sorgenti di San Martino - Aree verdi - Nuovo Camminamento Nursino, da Porta Valledonna a Porta Orientale - Sistemazione verde pubblico (Ord. PNC 17/2022)	360.000,00
Comune di Norcia - Campo sportivo Cetronella- Realizzazione pista di atletica, gradinate e manto sintetico (Ord. PNC 17/2022)	390.000,00
Comune di Norcia - Nuovo polo sportivo Viale Lombrici - Realizzazione campi sportivi polivalenti (Ord. PNC 17/2022)	195.000,00
Comune di Norcia - Strade comunali di Forsivo-Cortigno, Nottoria, Norcia-Popoli - Manutenzione straordinaria strada comunale (Ord. PNC 17/2022)	123.000,00
Comune di Poggiodomo - Via del Colle - Manutenzione straordinaria del campo sportivo e giardini pubblici (Ord. PNC 17/2022)	240.000,00
Comune di Poggiodomo - Strade comunali delle Frazioni - Rifacimento del sottofondo stradale e della pavimentazione (Ord. PNC 17/2022)	84.000,00
Comune di Polino - Piazza Marconi zona sotto le mura/Antico Mulino, Via Casale, Piazza Marconi - Recupero percorso con passerella e rigenerazione aree comunali (Ord. PNC 17/2022)	240.000,00
Comune di Polino - Via Casale, IV Novembre, Via S. Rita, Sargiola, Le Lame, Prato Manente, Fonte Fuga, Doganale - Messa in sicur. e fruibilita' della rete stradale (Ord. PNC 17/2022)	84.000,00
Comune di Preci - Rifacimento di pavimentazione di strade e piazze e riqualificazione dell'ingresso dell'abitato e dell'arredo urbano (Ord. PNC 17/2022)	330.000,00
Comune di Preci - Territorio comunale - Strade, piste cilabili, impianti sportivi colonnine di ricarica, segnaletica, E-bike Etc. (Ord. PNC 17/2022)	374.749,50
Comune di Preci - Strada comunale Preci Faito - Lotto Funzionale 1 - Rifacimento dell'asfaltatura, sistemazione delle cunette (Ord. PNC 17/2022)	112.500,00
Comune di S. Anatolia di Narco - Loc. Renare - Realizzazione Centro attrazione turistica (Ord. PNC 17/2022)	270.000,00
Comune di S. Anatolia di Narco - Strade comunali di Tassinare, la Pia, Agianetta, Sant'Anatolia-Scheggino, Grotti, Casale delle Macch - Manutenzione straordinar (Ord. PNC 17/2022)	94.500,00
Comune di Scheggino - Riqualificazione piazze, pubbliche vie e infrastrutture sociali (Ord. PNC 17/2022)	270.000,00
Comune di Scheggino - Loc- Valcasana-Scheggino Capoluogo - Ammodernamento e messa in sicur. impianti sportivi (Ord. PNC 17/2022)	180.000,00
Comune di Scheggino - Strada comunale Contaglia-Collefabbri-Schioppo e Strada comunale Osteria-Cimitero Civitella-Civitella - Riqualificazione della sede stradale (Ord. PNC 17/2022)	94.500,00
Comune di Sellano - Loc. Montesanto a Sellano - Realizzazione di ponte pedonale (Ord. PNC 17/2022)	420.000,00
Comune di Sellano - Loc. Montesanto - Restauro e risanamento conservativo delle mura e della Rocca (Ord. PNC 17/2022)	90.000,00
Comune di Sellano - Rifacimento della pavimentazione di accesso (Ord. PNC 17/2022)	90.000,00
Comune di Sellano - Rifacimento Campi Sportivi comunali e Impianti di Illuminazione (Ord. PNC 17/2022)	175.063,20
Comune di Sellano - Località di Setri, Peneggi, Montesanto, Orsano, Cammoro, Petrognano, Morro - Rifacimento del Sottofondo Stradale (Ord. PNC 17/2022)	123.000,00
Comune di Spoleto - Frazioni di Bazzano, Azzano, Poreta - Riqualificazione spazi aperti pubblici (Ord. PNC 17/2022)	249.075,00
Comune di Spoleto - Eggi e San Giacomo - Riqualificazione spazia aperti pubblici (Ord. PNC 17/2022)	216.675,00
Comune di Spoleto - Loc. Monteluco - Riqualificazione spazia aperti pubblici (Ord. PNC 17/2022)	182.250,00

DESCRIZIONE	PAGATO NEL 2022 IN €
Comune di Spoleto - Strade comunali di Aree periferiche / Frazioni - Interventi di messa in sicur. (Ord. PNC 17/2022)	212.400,00
Comune di Vallo di Nera - Rigenerazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture verdi e sportive delle frazioni (Ord. PNC 17/2022)	270.000,00
Comune di Vallo di Nera - Strada comunale San Pietro - Messa in sicur. e ripristino delle scarpate e del corpo stradale (Ord. PNC 17/2022)	94.500,00
Ripristino viabilità di accesso al nucleo abitato versante nord di Castelluccio di Norcia (OSC.18/2021)	53.529,26
Centro storico di Castelluccio di Norcia - Spese di progettazione (OSC.18/2021)	27.159,78
Diocesi Foligno - Foligno - Chiesa di S. Francesco (OC. 23/2017)	25.161,17
Diocesi Terni-Amelia - Guardea - Chiesa di SS. Pietro e Cesareo (OC. 23/2017)	21.305,62
Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Bastia Umbra - Scuola media `Colomba Antonietti`, Palestra (OSC.31/2021 ex OC. 33/2017 e OC.109/2020)	35.890,73
Comune di CANNARA Scuola secondaria di primo grado `Anna Frank` (OSC.31/2021 ex OC.109/2020 ex OC.56/2018)	17.273,97
DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Norcia - Agriano - Chiesa di San Giovanni Battista (OC. 32/2017)	96.847,85
DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Cerreto di Spoleto - Borgo Cerreto - Chiesa S. Lorenzo (O.C. 38/2017)	23.023,72
DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Norcia - Ancarano - Chiesa S. Maria Bianca (O.C. 38/2017)	73.977,48
DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Norcia - Frascaro - Chiesa S. Antonio Abate (O.C. 38/2017)	55.514,64
DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Scheggino - Ceselli - Chiesa San Michele Arcangelo (O.C. 38/2017)	12.593,77
DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Vallo Di Nera - Chiesa S. Giovanni Battista (O.C. 38/2017)	12.578,84
SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 1: NORCIA -LOC. SALVELLI, LOC. VALCADARA, LOC. PIEDIRIPA (OC.48/2018)	202.516,31
SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 2: VALLO DI NERA -LOC. PIEDIPATERNO , PRECI-LOC. TODIANO, VALLO DI NERA, C ASCIA -LOC. COLLEGIACONE. (OC.48/2018)	157.794,12
SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 3: MONTELEONE DI SPOLETO, CASCIA-LOC. MALTIGNANO. (OC.48/2018)	127.475,16
SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 4: PRECI- CAPOLUOGO , LOC. MONTEBUFO (OC.48/2018)	26.260,12
SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Dotazioni informatiche, apparecchiature per laboratori per le scuole del cratere sismico (OC.48/2018)	3.480,74
Contributi per Edilizia privata - Contributi per precedenti Sismi (OC. 51/2018)	54.579,86
Contributi per Edilizia mista pubb/priv Via del Lavoro, 1 (Coccia Gianni) MUDE 100540350000020668202O - NORCIA (OC.61/2018)	10.957,12
Contributi per Edilizia mista pubb/priv Via Porta Fuga n. 23-35 (Condominio Sassi Giovinale) MUDE 10054051000000960520l9 - SPOLETO (OC.61/2018)	74.981,13
Comune di CASCIA Aree attrezzate per finalità turistiche - AVENDITA (OC. 77/2019)	27.181,65
Comune di CASCIA Aree attrezzate per finalità turistiche - CASTEL S. MARIA (OC. 77/2019)	27.195,54
Comune di CERRETO DI SPOLETO Aree attrezzate per finalità turistiche - FORCATURA (OC. 77/2019)	16.000,00
Comune di MONTELEONE DI SPOLETO Aree attrezzate per finalità turistiche - PARCO DELLA CROCE (OC. 77/2019)	26.058,01

DESCRIZIONE	PAGATO NEL 2022 IN €
Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO Aree attrezzate per finalità turistiche - LOC. CASTEL SAN FELICE (OC. 77/2019)	26.022,98
Comune di SCHEGGINO Aree attrezzate per finalità turistiche - VALCASANA (OC. 77/2019)	26.399,11
Comune di SPOLETO Aree attrezzate per finalità turistiche - AREA 1 -VIA FRATELLI CERVI -VIA S. TOMMASO (OC. 77/2019)	30.399,75
Comune di SPOLETO Aree attrezzate per finalità turistiche - AREA 2 -TIRO A SEGNO (OC. 77/2019)	15.188,36
Comune di VALLO DI NERA Aree attrezzate per finalità turistiche - BORBONEA (OC. 77/2019)	27.200,00
DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Spoleto - Chiesa Sant'Omobono (OC.105/2020 e Dec. 47/2022)	72.000,00
Comune di PRECI Programma Straordinario di Ricostruzione - Progettazione (OC. 107/2020)	20.361,68
Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Arrone - Strada provinciale SP4 (OC.109/2020 ex OC.37/2017)	275.403,39
Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Bevagna - Scuola primaria `S. Francesco` (OC.109/2020 ex 33/2017)	380.236,96
Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Bevagna - Chiesa di San Filippo - edificio Chiesa ed Edificio Oratorio e Sagrestia (OC.109/2020 ex OC.37/2017)	144.099,22
Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Foligno - Scuola Infanzia\Primaria Piermarini - Ed. muratura (OC.109/2020 ex 33/2017)	27.430,42
Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Gubbio - Scuola materna ed elementare di Carbonesca (OC.109/2020 ex 33/2017)	229.273,62
Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Montefranco - Scuola Materna/Elementare `G. Fanciulli` (OC. 109/2020 ex OC.56/2018)	24.297,87
Provincia di Perugia - Cascia - SR 320: frana su scarpate e pareti rocciose (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	85.717,42
Provincia di Perugia - Città di Castello - IIS Polo Tecnico `Franchetti-Salviani` ITIS Edificio originario (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	148.547,91
Provincia di Perugia - Perugia - Istituto Magistrale `A. Pieralli` (OC.109/2020 ex 33/2017)	261.175,82
Comune di BEVAGNA Cimitero Comunale (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	204.042,82
Comune di BEVAGNA Mura Castellane Loc. Castelbuono (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	52.436,81
Comune di CANNARA Chiesa di San Donato (OC. 109/2020 ex OC.56/2018)	96.611,02
Comune di CASCIA Chiesa di San Francesco - Torre Campanaria (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	30.662,15
Comune di CASCIA Chiesa Museo S. Antonio Abate (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	27.201,27
Comune di CASCIA Palazzo Comunale `Palazzo Frenfanelli` (OC.109/2020 ex OC.37/2017)	15.241,98
Comune di CASCIA Sede Biblioteca Palazzo Carli (OC.109/2020 ex OC.37/2017)	27.748,36
Comune di CERRETO DI SPOLETO Centro salute ASL e attività commerciali (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	93.966,15
Comune di CERRETO DI SPOLETO Cimitero di Borgo Cerreto (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	104.198,02
Comune di CERRETO DI SPOLETO Piazza Pontano, 27 (OC.109/2020 ex OC.86/2020)	8.676,63
Comune di CERRETO DI SPOLETO Via Padre Pietro Pirri (OC.109/2020 ex OC.86/2020)	9.221,85
Comune di CERRETO DI SPOLETO Via Padre Pietro Pirri presso il complesso San Giacomo (OC.109/2020 ex OC.86/2020)	7.196,49

DESCRIZIONE	PAGATO NEL 2022 IN €
Comune di CERRETO DI SPOLETO Via Santa Maria de Libera (OC.109/2020 ex OC.27/2017)	91.484,74
Comune di MONTELEONE DI SPOLETO Ex complesso conventuale di San Francesco (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	19.006,32
Comune di MONTELEONE DI SPOLETO Scuola Elementare e Media `De Amicis` (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	9.281,20
Comune di MONTONE Mura urbiche di via Aldo Bologni (OC.109/2020 ex OC.37/2017)	92.023,69
Comune di NORCIA Cimiteri loc. Nottoria, San Marco, Pescia (OC.109/2020 ex OC.37/2017)	43.531,94
Comune di NORCIA Cimiteri loc. Ospedaletto, Capo al Campo, Serravalle (OC.109/2020 ex OC.37/2017)	19.347,93
Comune di NORCIA Cimitero monumentale Norcia Capoluogo (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	86.710,47
Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO Frana su strada comunale San Martino (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	25.767,30
Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO Muro sostegno e arco medievale lato sud-est centro storico Fraz. Castel San Felice (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	22.848,56
Comune di SCHEGGINO Mura urbiche (OC. 109/2020 ex OC.37/2017)	87.791,04
Comune di SELLANO Palazzo Comunale (OC. 109/2020 ex OC.37/2017)	36.102,19
Comune di SPOLETO Frana del versante a monte di Piazza Duomo (OC.109/2020)	41.705,96
Comune di SPOLETO Scuola Primaria `Toscano` (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	77.004,84
Comune di TODI Cimiteri di Todi Nuovo e Vecchio Urbano (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	12.249,25
Comune di TODI Scuola Infanzia e Primaria di Collevalenza (OC.109/2020 ex OC. 33/2017)	10.990,83
Comune di VALLO DI NERA Palazzo Comunale in Piedipaterno (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	29.725,91
Comune di VALTOPINA Palestra scolastica (OC.109/2020 ex OC.56/2018)	24.001,11
ADISU - Perugia - Casa dello Studente (Padiglione 4) (OC. 109/2020 ex OC.56/2018)	18.943,25
Rimozione macerie - Anno 2021 (D.L. 189/2016 art.28 c.13 - OC. 109/2020)	2.845.040,00
Trasf. a Regione Umbria per Rimozione macerie - Anni 2019-2020 (D.L. 189/2016 art.28 c.13 - OC. 109/2020)	33.944,71
Trasferimenti per conto del Commissario Straordinario quale anticipazione ai progettisti degli interventi di ricostruzione privata (OC. 94/2020)	1.884.078,88
Contributi per traslochi e depositi (OC. 21/2017)	79.030,40
Contributi agli investimenti alle Imprese - Graduatoria A1 (D.L. 189/2016, art. 20 - Decr.intermin. 10/05/2018)	324.212,79
Contributi agli investimenti alle Imprese - Graduatoria B1 (D.L. 189/2016, art. 20 - Decr.intermin. 10/05/2018)	392.346,57
Contributi per la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva - BANDO 2021 - (D.L.189/2016, art. 20-bis - Decreto intermin. 11/08/2017)	2.701.913,82
Contributi per la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva - BANDO 2018 - CRATERE sismico (D.L.189/2016, art. 20-bis - Decreto intermin. 11/08/2017)	3.883,95
Contributi per la delocalizzazione delle imprese (OC. 9/2016)	390.871,29

Fonte: USR-Umbria

Nel corso del 2022 sono stati emessi 984 ordinativi di pagamento a favore di 541 beneficiari, (oltre agli Istituti di previdenza -INPS e INAL- e l'Agenzia delle Entrate Riscossioni a favore dei quali sono stati liquidati gli importi in caso di intervento sostitutivo).
Nel dettaglio, i pagamenti hanno riguardato per oltre il **40%** (n. 413 pagamenti) **i contributi alle attività produttive ed i contributi per traslochi e depositi**.
Come già illustrato in precedenza, oltre al consueto sostegno per la delocalizzazione delle imprese (n. 85 ordinativi di pagamento per rimborsi di canoni d'affitto) ed il contributo una tantum ai cittadini per il trasloco da immobili inagibili (n.54), le imprese beneficiarie dei **contributi a ristoro della perdita subita a causa del sisma sono state tutte liquidate** (n.260 pagamenti).
Altra voce importante dal punto di vista dei pagamenti riguarda le **anticipazioni ai progettisti degli interventi di ricostruzione privata** (n.222 pagamenti) a cui devono corrispondere relativi incassi nel momento della restituzione, così come previsto dall'Ord.94/2020.
Per **123 interventi di Ricostruzione Pubblica sono stati emessi 164 ordinativi di spesa**, compresi quelli relativi alla rimozione delle macerie.
La **complessità dei pagamenti**, per il continuo aggiornamento della normativa di riferimento sia in ambito di ricostruzione pubblica e privata, che in ambito amministrativo e fiscale, ha reso necessario nel 2022 **un attento lavoro di monitoraggio e controllo**.
Da una parte, è stata effettuata la ricognizione complessiva dei Piani di ricostruzione pubblica verificando le risorse assegnate, incassate e pagate per ciascun intervento che originariamente facevano parte di un Piano e, successivamente, le stesse vengono inglobate in un'altra ordinanza o addirittura una parte di esse in ordinanze speciali, al fine di avere una situazione contabile precisa ed ordinata.
L'attenta osservanza delle norme in materia di **controllo sulla regolarità fiscale e contributiva dei beneficiari e la necessità di attivare l'intervento sostitutivo in caso di inadempienze**, hanno permesso di rispettare nei tempi e modalità delle norme previste per eseguire ogni pagamento.
Per quanto riguarda, infine, **la gestione del personale e degli uffici**, sono stati pagati rispettivamente 115 rimborsi per personale in servizio presso USR Umbria e Comuni del cratere sismico e Province dell'Umbria, nonché 70 mandati per spese di allestimento e funzionamento.

7. Appendice

7.1. Le ordinanze del commissario

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
n. 1 10 novembre 2016	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.	
n. 2 10 novembre 2016	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.A. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per l'individuazione di personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.	Rinnovata con ord. n. 71 e n. 74
n. 3 15 novembre 2016	*Individuazione del cratere del sisma 2016*	Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 4 17 novembre 2016	*Ricostruzione privata - danni lievi*	Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 5 28 novembre 2016	*Ricostruzione privata - delocalizzazione*	Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 dichiarati inagibili.	
n. 6 28 novembre 2016	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.	
n. 7 14 dicembre 2016	*Ricostruzione privata e pubblica - Prezziario unico*	Approvazione del Preziario Unico Cratere Centro Italia 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 8 14 dicembre 2016	*Ricostruzione privata - danni lievi*	Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.	Modifiche successive con ord. n. 12, 20, 30, 36, 46 e 55
n. 9 14 dicembre 2016	*Ricostruzione privata - delocalizzazione*	Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.	
n. 10 19 dicembre 2016	*Ricostruzione privata e pubblica - AeDES, FAST*	Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
		agosto 2016.	
n. 11 **10 gennaio 2017**	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 12 **10 gennaio 2017**	*Ricostruzione privata e pubblica - Imprese e professionisti*	Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 13 **10 gennaio 2017**	*Ricostruzione privata - Attività produttive*	Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 14 **17 gennaio 2017**	*Ricostruzione pubblica - Scuole*	Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018.	Modifiche successive con ord. n.18, 28, 35, 43 (art. 4 ord. n. 63)
n. 15 **27** **gennaio 2017**	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	Modifiche successive con ord. n. 30, 30, 70
n. 16 **3** **marzo 2017**	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 17 **13** **marzo 2017**	*Ricostruzione pubblica -*	Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.	
n. 18 **3** **aprile 2017**	*Ricostruzione pubblica - Modifica Ord. 14*	Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante 'Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018'.	Modifiche successive con ord. n. 35
n. 19 **7** **aprile 2017**	*Ricostruzione privata - Edifici con danni gravi*	Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 20 **7** **aprile 2017**	*Ricostruzione privata - Modifiche Ord. n. 4, 8, 9 e 15*	Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 21 **28 aprile 2017**	*Ricostruzione privata - Traslochi*	Assegnazione di contributi per le spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente	Modifiche successive con ord. n. 41

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
		inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e modifiche all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.	
n. 22 **4 maggio 2017**	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.	
n. 23 **5 maggio 2017**	*Ricostruzione Pubblica - Chiese I*	Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati.	Modifiche successive con ord. n. 63 (art. 4)
n. 24 **12 maggio 2017**	*Ricostruzione pubblica - Microzonazione Modifiche*	Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 25 **23 maggio 2017**	*Ricostruzione pubblica - Perimetrazione*	Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 26 **29 maggio 2017**	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 recante "Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio comune denominato Ufficio Speciale per la ricostruzione post-sisma 2016' ci cui all'art. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189".	Modifiche successive con ord. n. 62
n. 27 **9 giugno 2017**	*Ricostruzione pubblica - Edilizia Residenziale Pubblica*	Misure per la riparazione degli edifici di proprietà pubblica aduso abitativo inagibili o inutilizzabili, attraverso interventi di miglioramento sismico.	Modifiche successive con ord. n. 36, 56
n. 28 **9 giugno 2017**	*Ricostruzione privata e pubblica - Modifiche*	Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante 'Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
		all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017.	
n. 29 **9 giugno 2017**	*Ricostruzione privata e pubblica - Modifiche*	Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante 'Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante 'Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post-sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 recante 'Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017".	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 30 **21 giugno 2017**	*Ricostruzione privata - Modifiche*	Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante' Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante 'Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante 'Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 31 **21 giugno 2017**	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.	
n. 32 **21** **giugno 2017**	*Ricostruzione Pubblica - Chiese II*	Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati.	Modifiche successive con ord. n. 41, 46, 63 (art. 4)
n. 33 **11**	*Ricostruzione Pubblica - Scuole II*	Approvazione del programma straordinario per la riapertura nelle	Modifiche successive con ord. n. 35, 41, 46, 56, 62

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
luglio 2017		scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche.	(art. 4 Ord. 63)
n. 34 11 luglio 2017	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Approvazione del protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES.	Modifiche successive con ord. n. 72
n. 35 31 luglio 2017	*Ricostruzione pubblica - Modifiche*	Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017	
n. 36 8 settembre 2017	*Ricostruzione Privata - Ricostruzione Pubblica - Modifiche*	Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18 - decies del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 37 8 settembre 2017	*Ricostruzione Pubblica - Opere Pubbliche*	Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	Modifiche successive con ord. n. 41, 46, 56, 67 (art. 4 ord. n. 63)
n. 38 8 settembre 2017	*Ricostruzione pubblica - Beni Culturali*	Approvazione del piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 39 8 settembre 2017	*Redazione dei Piani attuativi*	Principi d'indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 40 8 settembre 2017	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.	
n. 41 2 novembre 2017	*Ricostruzione privata e pubblica - Modifiche*	Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese che operano nella ricostruzione pubblica e privata.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
		Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 ed all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017.	maturati
n. 42 14 novembre 2017	*Ricostruzione pubblica - Micro, piccole, medie imprese*	Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.	Modifiche successive con ord. n. 53
n. 43 15 dicembre 2017	*Ricostruzione pubblica*	Disciplina dei contributi relativi alle attività di rilievo topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. Disciplina delle modalità di erogazione dei contributi per l'attività di ricostruzione pubblica in presenza di altri contributi o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.	
n. 44 15 dicembre 2017	*Ricostruzione privata - Danni lievi*	Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n.45 15 dicembre 2017	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ed Invitalia per l'individuazione di personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.	.
n.46 10 gennaio 2018	*Ricostruzione privata - Ricostruzione pubblica - Modifiche*	Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016; n. 8 del 14 dicembre 2016; n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017; n. 19 del 7 aprile 2017; n. 32 del 21 giugno 2017; n. 33 dell'11 luglio 2017; n. 37 dell'8 settembre 2017; n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n.47 10 gennaio 2018	*Ricostruzione pubblica*	Utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici.	
n. 48 10 gennaio 2018	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto	Modifiche successive con ord. n. 62

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
		corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie.	
n.49 26 febbraio 2018	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 7 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e FINTECNA per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.	
n.50 28 marzo 2018	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016).	Modifiche successive con ord. n. 73
n.51 28 marzo 2018	*Ricostruzione privata e pubblica*	Attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici.	Modifiche successive con ord. n. 55
n.52 28 marzo 2018	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n.53 24 aprile 2018	*Modifiche ed integrazioni Ord. n. 16, 42 e 46*	Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n.54 24 aprile 2018	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n.55 24 aprile 2018	*Ricostruzione privata - Delocalizzazioni Modifiche*	Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016. Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017; n. 39 dell'8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018. Proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
		189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, e s,.m.i. Termine per il deposito delle schede	
n.56 10 maggio 2018	*Ricostruzione pubblica - Modifiche*	Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017; n. 33 dell'11 luglio 2017; n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.	Modifiche successive con ord. n. 67 (art. 4 ord. 63)
n. 57 4 luglio 2018	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Disciplina per la costituzione e la quantificazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle relative risorse finanziarie.	
n. 58 4 luglio 2018	*Ricostruzione privata e Ricostruzione pubblica - Modifiche*	Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 59 31 luglio 2018	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 60 31 luglio 2018	*Ricostruzione privata - Sisma bonus*	Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus).	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 61 1 agosto 2018	*Ricostruzione Pubblica - Immobili di interesse culturale*	Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 62 3 agosto 2018	*Ricostruzione privata - Modifiche e integrazioni Ord. n. 4, 8, 13, 16, 19, 26, 33, 48*	Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 63 6 settembre 2018	*Ricostruzione Pubblica - Beni Culturali*	Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni - Vice Commissari.	
n. 64 6 settembre 2018	*Ricostruzione pubblica - Dissesti idrogeologici*	Approvazione del primo Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
n. 65 6 settembre 2018	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata.	
n. 66 12 settembre 2018	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del personale della struttura commissariale in attuazione dell'articolo 50, comma 7, lettera c) del decreto legge n. 189/2016.	
n. 67 12 settembre 2018	*Ricostruzione pubblica - Modifiche Ord. n. 37, 56*	Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018.	
n. 68 5 ottobre 2018	*Ricostruzione privata - Attività produttive*	Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 69 30 ottobre 2018	*Ricostruzione privata*	Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 ottobre 2018.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 70 31 dicembre 2018	*Modifiche Ord. n. 13/2017, n. 15/2017, n. 19/2017, n. 68/2018,*	Proroga di termini stabiliti nelle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 agosto 2018. Modifiche all' ordinanza n. 15 del 27 Gennaio 2017.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 71 30 gennaio 2019	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 2019-2020.	
n. 72 30 gennaio 2019	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Protocollo d'intesa fra il Commissario straordinario del Governo, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES. Biennio 2019-2020.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 73 30 gennaio 2019	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Biennio 2019-2020.	
n. 74 22 febbraio 2019	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019-2020.	
n. 75 2 agosto 2019	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Ripartizione personale e spese di funzionamento. Modalità di anticipazione e rimborso 2019-2020 (ex ord. 22, 26 e 50).	*Registrata in data 5 settembre 2019 al numero 1796. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del*

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
			25 novembre 2019
n. 76 **2 agosto 2019**	*Ricostruzione privata*	Spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e spese di funzionamento dei consorzi.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 77 **2 agosto 2019**	*Ricostruzione pubblica*	Individuazione, realizzazione e fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi.	*Registrata in data 12 agosto 2019 al numero 1716. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2019*
n. 78 **2 agosto 2019**	*Durc di congruità*	Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 79 **2 agosto 2019**	*Dissesti*	Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza n. 23 del 12 maggio 2017.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 80 **2 agosto 2019**	*Modifiche alle ordinanze*	Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 51 del 28 marzo 2018, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 57, del 4 luglio 2018, n. 63 del 6 Settembre 2018, del 4 luglio 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali, di priorità istruttorie e di concorso di risorse.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 81 **2 agosto 2019**	*Ricostruzione privata*	Proroga presentazione domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, e n. 8 del 14 dicembre 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 82 **2 agosto 2019**	*Attività Produttive*	"Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse- fondi INAIL". Presentazione della manifestazione d'interesse alla istanza di contributo.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 83 **2 agosto 2019**	*Dissesti*	Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 84 **2 agosto 2019**	*Secondo piano Beni Culturali - Modifica ord. n. 38/2017*	Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17.	*Approvata nella cabina di regia del 10 luglio 2019; registrata in data 5 settembre 2019 al numero 1797.*

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
n. 85 24 gennaio 2020	*Ricostruzione privata e proroga ordinanza "Delocalizzazione immobili a uso agricolo e zootecnino"*	Modifica delle ordinanze n.4 del 17 novembre 2016, n.13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 80 del 2 agosto 2019. Modifica dell'allegato A dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Proroga dei termini stabiliti dall'ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 86 24 gennaio 2020	*Approvazione secondo programma di interventi sul patrimonio pubblico con destinazione abitativa*	Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa.	
n. 87 24 gennaio 2020	*Ricostruzione privata, attività produttive e censimento di agibilità*	Modifica ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 2 agosto 2019, nonché disposizioni per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES.	. Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 88		Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.	*Ritirata con provvedimento prt. CGRTS-0004825-P del 05/03/2020*
n. 89		Autorizzazione all'assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.	*Ritirata con provvedimento prt. CGRTS-0004826-P del 05/03/2020*
n. 90 24 gennaio 2020	*Edifici collabenti*	Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione – modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell'Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 Ordinanza n. 19/2017 – Approvazione delle Linee Guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 91		Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.	*Ritirata con provvedimento prot. CGRTS-0004827-P del 05/03/2020*
n. 92		Definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, definizione delle modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, e modifiche all'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 59 del 31 luglio 2018.	*Ritirata con provvedimento prot. CGRTS-0004827-P del 05/03/2020*

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
n. 93	*Modifiche alle ordinanze*	Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 12 del 9 gennaio 2017, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 del 8 settembre 2017, n. 61 del 1 agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonché disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-ter e dell'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge n. 189 del 2016 , definizione delle modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 189 del 2016, e di continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici.	*Ritirata con provvedimento prot. CGRTS-0004827-P del 05/03/2020*
n. 94 **20 marzo 2020**	*Anticipazioni ai professionisti*	Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.	*Registrata in data 25 marzo 2020 al numero 541.* Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 95 **20 marzo 2020**	*Modifiche alle ordinanze*	Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 del 8 settembre 2017, n. 61 del 1 agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonché disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-ter e dell'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge n. 189 del 2016 , definizione delle modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 189 del 2016, e di continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 96 **1 aprile 2020**	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Autorizzazione all'assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.	*Registrata in data 6 aprile 2020 al numero 596.*
n. 97 **1 aprile 2020**	*Disposizioni straordinarie. Covid-19*	Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonché acquisto o ripristino di beni mobili strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da COVID-19.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 98 **9 maggio 2020**	*Sicurezza*	Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 17 dicembre 2016	*Registrata in data 12 maggio 2020 al numero 1017.*

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
n. 99 30 aprile 2020	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo. Istruttoria dei Comuni*	Art. 3, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 189 del 2016. Definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento da parte dei Comuni della istruttoria per le concessioni di contributo e di tutti i conseguenti adempimenti.	*Registrata in data 12 maggio 2020 al numero 1017.*
n. 100 [30 aprile 2020] 9 maggio 2020	*Ricostruzione privata*	Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 101 30 aprile 2020	*Individuazione Comuni maggiormente colpiti*	Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 102 25 maggio 2020	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. . INVITALIA per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	*Registrata in data 28 maggio 2020 al numero 1166.*
n. 103 23 giugno 2020	*Ricostruzione privata*	Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti.	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 104 29 giugno 2020	*Ricostruzione privata*	Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti.	*Registrata in data 9 luglio 2020 al numero 1556*
n. 105 17 settembre 2020	*Ricostruzione edifici di culto*	Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto	*Registrata in data 21 settembre 2020 al numero 2161*
n. 106 17 settembre 2020	*Organizzazione struttura centrale Commissario Straordinario Ricostruzione*	Organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016	*Registrata in data 21 settembre 2020 al numero 2162*
n. 107 22 agosto 2020	*Ricostruzione privata Programmi Straordinari Ricostruzione*	Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 108 10 ottobre 2020	*Disciplina compensi professionisti*	Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni.	*Registrata in data 15 ottobre 2020 al numero 2276*
n. 109 23 dicembre 2020	*Elenco unico programmi*	Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica.	*Registrata in data 4 gennaio 2021 al numero 2*
n. 110 21 novembre 2020	*Innovazione digitale*	Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decretolegge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.	*Registrata in data 4 dicembre 2020 al numero 2770*

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
n. 111 23 dicembre 2020	*Ricostruzione privata*	Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 112 23 dicembre 2020	*Organizzazione della struttura*	Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.	*Registrata in data 8 gennaio 2021 al numero 36*
n. 113 31 dicembre 2020	*Accordo Commissario Straordinario e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale*	Approvazione schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241 del 1990 tra il Commissario Straordinario e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	*Registrata in data 19 gennaio 2021 al numero128*
n. 114 30 aprile 2021	*Ricostruzione privata, pubblica e interventi per micro, piccole e medie imprese*	Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189"	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 115 9 aprile 2021	*Organizzazione struttura centrale del Commissario Straordinario*	Organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	*Registrata in data 26 aprile 2021 al numero 978*
n. 116 6 maggio 2021	*Immobili di interesse culturale e paesaggistico di soggetti privati*	Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 117 29 luglio 2021	*Modifica ed integrazione ordinanze vigenti*	Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 118 7 settembre 2021	*Disposizioni per imprese operanti nella ricostruzione e per attività produttive*	Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma	*Registrata in data 24 settembre 2021 al numero 2339* Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 119 8 settembre 2021	*Dissesti diro-geomorfologici*	Disciplina degli interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 120 13 agosto 2021	*Disposizioni sisma 2009-2016 e immobili di interesse culturale*	Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione	*Registrata in data 22 agosto 2021 al numero 2156*

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
	e paesaggistico	tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021	
n. 121 22 ottobre 2021	*Armonizzazione scadenze, revisioni prezzi e costi parametrici*	Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex art.9 dell'ordinanza commissariale n.111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli artt.6, 7 e 8 dell'ordinanza commissariale n.118 del 7 settembre 2021	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 122 31 dicembre 2021	*Contratto istituzionale di sviluppo*	Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzionale di sviluppo – Area sisma del 14 settembre 2021 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure.	*Registrata in data 1 febbraio 2022 al numero 203*
n. 123 31 dicembre 2021	*Armonizzazione scadenze*	Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n.118 del 7 settembre 2021 e n.121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1^ agosto 2018, n.110 del 21 novembre 2020, n.119 del 8 settembre 2021, n.116 del 13 agosto 2021	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 124 1 febbraio 2022	*Armonizzazione scadenze*	Modifiche all'ordinanza n.123 del 31 dicembre 2021 recante: "Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n.118 del 7 settembre 2021 e n.121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1^ agosto 2018, n.110 del 21 novembre 2020, n.119 del 8 settembre 2021, n.116 del 13 agosto 2021".	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati
n. 125 10 febbraio 2022	*Organizzazione della struttura ed attività di controllo*	Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2022	*Registrata in data 16 febbraio 2022 al numero 372*
n. 126 24 maggio 2022	*Aumento costi materie prime*	Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti	*Registrata in data 24 maggio 2022 al numero 1324*
n. 127 1 giugno 2022	*Armonizzazione scadenze*	Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione	Abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico, fatti

Ordinanza	Tema	Titolo	Note
		privata	salvi gli effetti giuridici maturati
n. 128 **13 ottobre 2022**	*Edifici di culto* *Armonizzazione scadenze*	Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-duodetricies del decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata	*Registrata in data 13 ottobre 2022 al numero 2847*
n. 129 **29 dicembre 2022**	*Programma Rigenerazione urbana*	Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo.	*Registrata in data 27 dicembre 2022 al numero 3294*
n. 130 **15 dicembre 2022**	*Ricostruzione privata*	Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata	*Registrata in data 27 dicembre 2022 al numero 3294*
n. 131 **30 dicembre 2022**	*Armonizzazione scadenze*	Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica	*Registrata in data 18 gennaio 2023 al numero 234*
n. 132 **30 dicembre 2022**	*Edifici di culto*	Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi	*Dichiarata immediatamente efficace*

7.2. Le ordinanze speciali in Umbria

	Ordinanza	Tema	Titolo	Note
1	n. 8 6 maggio 2021	*Norcia Basilica San Benedetto*	Ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia	*Registrata in data 22 giugno 2021 al numero 1618*
2	n. 10 15 luglio 2021		Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi	*Registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2130*
3	n. 11 15 luglio 2021	*Norcia Scuole e Municipio*	Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia	*Registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2129*
4	n. 12 15 luglio 2021	*Cascia Scuole Viabilità Ospedale*	Interventi di ricostruzione nel comune di Cascia	*Registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2128*
5	n. 18 15 luglio 2021	*Norcia Castelluccio*	Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia	*Registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2132*
6	n. 21 9 agosto 2021	*Modifiche ed integrazioni*	Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali	*Registrata in data 13 agosto 2021 al numero 2130*
7	n. 27 14 ottobre 2021	*Patrimonio Agenzia del Demanio*	Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189	*Registrata in data 2 novembre 2021 al numero 2692. Modificata con ordinanza speciale n. 36/2022.*
8	n. 31 31 dicembre 2021	*Scuole*	Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 [ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.] "Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"	*Modificata con ordinanza n. 32/2022 e registrata in data 1 febbraio 2022 al numero 202*
9	n. 32 1 febbraio 2022	*Scuole*	Ordinanza speciale n. 32 del 1 febbraio 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 - "Recepimento osservazioni della Corte dei Conti in sede di controllo preventivo sulle ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 31 dicembre 2021".	*Registrata in data 1 febbraio 2022 al numero 193*
10	n. 36 20 maggio 022	*Patrimonio Agenzia del Demanio*	Ordinanza speciale n. 36 del 20 maggio 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. "Interventi di ricostruzione nei Comuni di Force, Rotella, Sant'Angelo in Pontano e disposizioni di modifica delle ordinanze speciali".	*Registrata in data 25 maggio 2022 al numero 1329*

	Ordinanza	Tema	Titolo	Note
11	**n. 39** **23 dicembre 2022**	*Preci*	Ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. "Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci".	*Registrata in data 16gennaio 2023 al numero 183*
12	**n. 43** **31 dicembre 2022**	*Castelluccio, Campi Alto e San Pellegrino di Norcia*	Ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. "Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino"	*Registrata in data 20 gennaio 2023 al numero 273*

USR Umbria
Report ricostruzione 2016-2022
